

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5

(گزارش هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۰)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

نصب پنل سقف

➤ نصب پنل سقف پیش ساخته سقف همکف
زون ۱





اجرای ستون

➤ آرماتور بندی ستون های همکف زون ۶

➤ قالب بندی ستون های همکف زون ۶

➤ بتن ریزی ستون های همکف زون ۶

➤ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده همکف


اجرای تیر سقف

➤ آرماتور بندی تیر سقف همکف زون ۱

➤ زیر سازی تیر سقف همکف زون ۳

➤ آرماتور بندی دال سقف ۱- زون ۴

➤ بتن ریزی دال سقف ۱- زون ۳

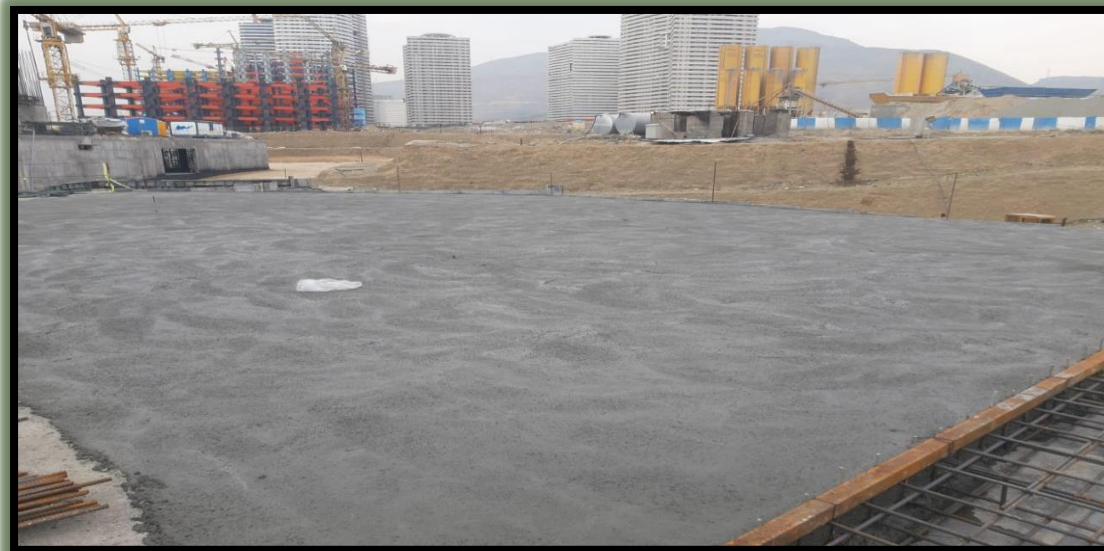



خاکریزی و تسطیح

- خاکریزی و تسطیح ضلع شرقی
- اجرای آبپاشی و کامپکت کردن لایه خاک






انباری ها

- ساخت و جوشکاری والپست انباری های ۴-
- ساخت و جوشکاری والپست انباری های ۳-
- دیوار چینی انباری های ۴-



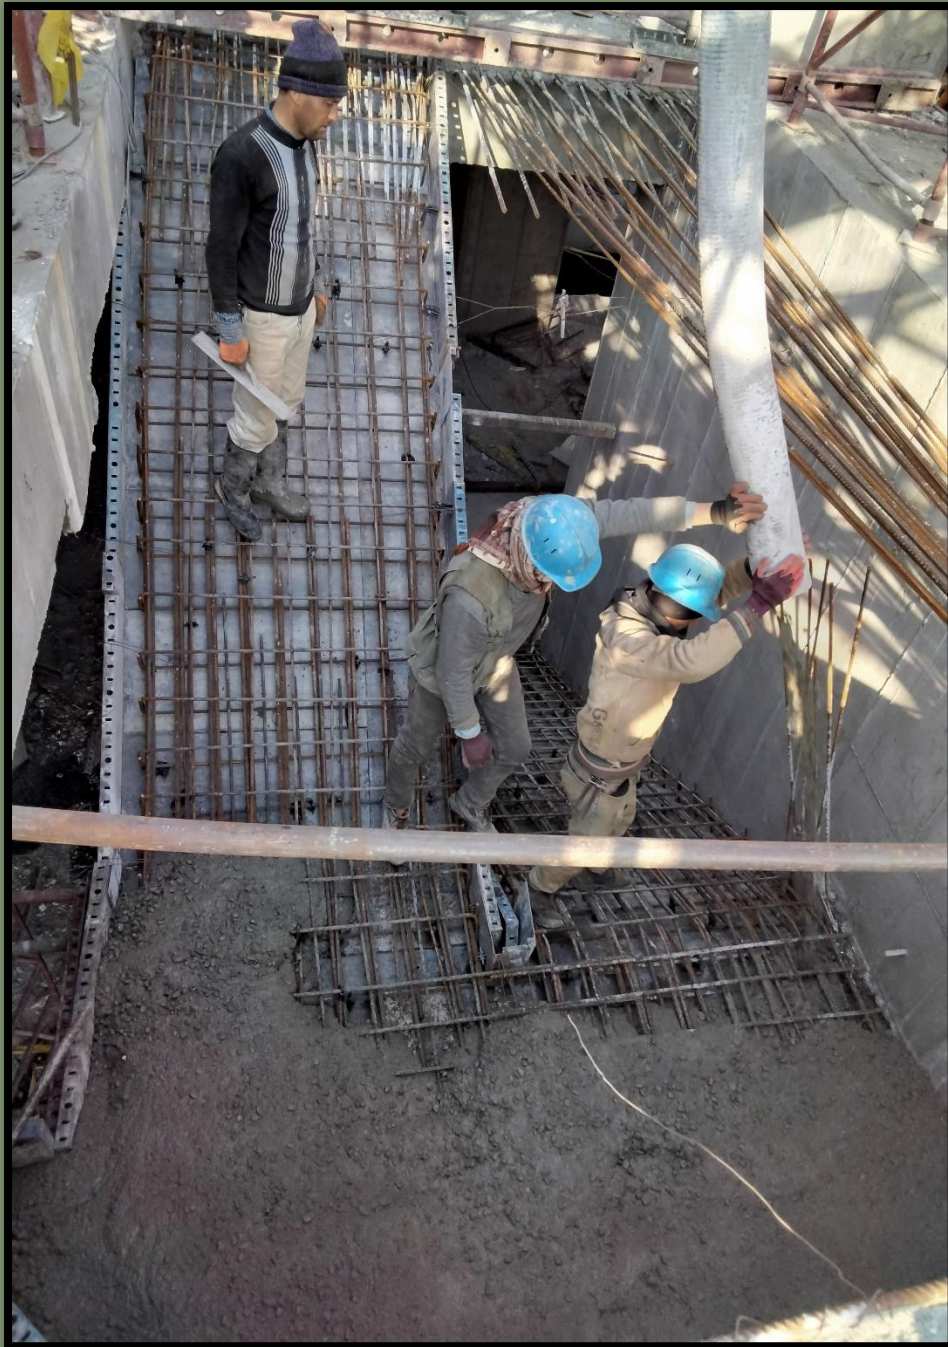

راه پله

➤ آرماتور بندی و قالب بندی راه پله ۱-
به همکف زون ۶

➤ بتن ریزی راه پله ۱- به همکف زون ۳






۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تساویر مقایسه ای ضلع شمالی

آرماتور بندی تیر سقف همکف زون ۱

آرماتور بندی دال سقف ۱- زون ۳

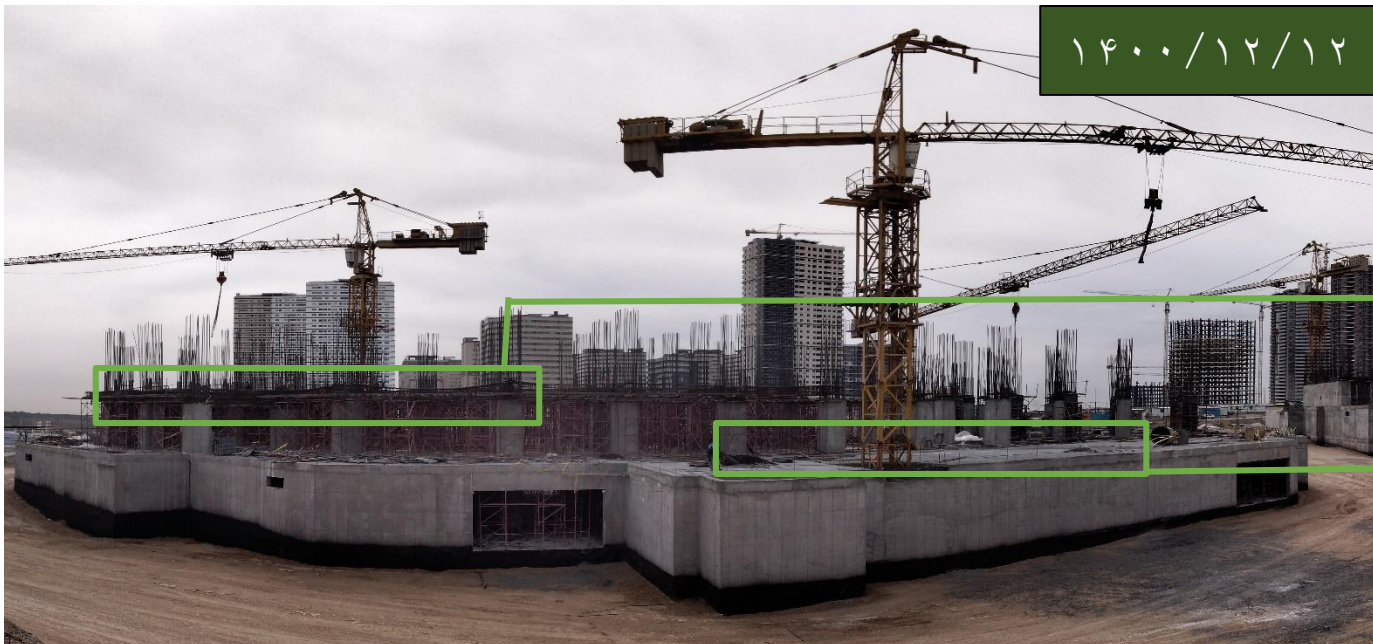

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

نصب پنل سقف همکف زون ۱

بتن ریزی دال سقف ۱- زون ۳

۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تصاویر مقایسه ای ضلع شمال شرقی

آرماتور بندی ستون های همکف زون ۶

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

بتن ریزی ستون های همکف زون ۶
دکفراژ ستون های بتن ریزی شده

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۰/۱۲/۱۲
