



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(هفته چهارم آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

ستون ها

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+
- ✓ زون ۲ (بال شرقی) برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۲+ زون ۳ (بال شرقی) برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی

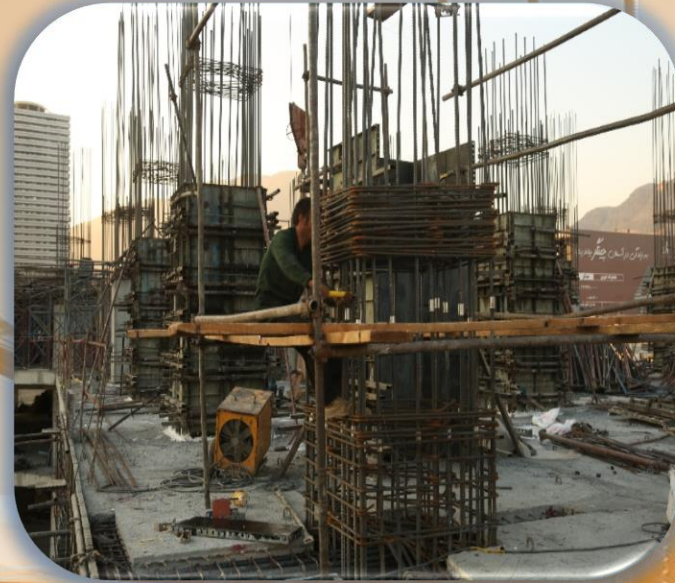

سقف و تیر سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۱۱ (بال غربی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۱ (بال غربی)
- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۱۱ (بال غربی)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۲ (بال شرقی)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)



پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)




راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۳ طبقه +۱ به +۲
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۳ طبقه +۱ به +۲



انباری

- ❖ اجرای وال پست انباری های طبقه ۲-
- ❖ اجرای یک رگه چینی انباری های طبقه ۲-
- ❖ اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۲-

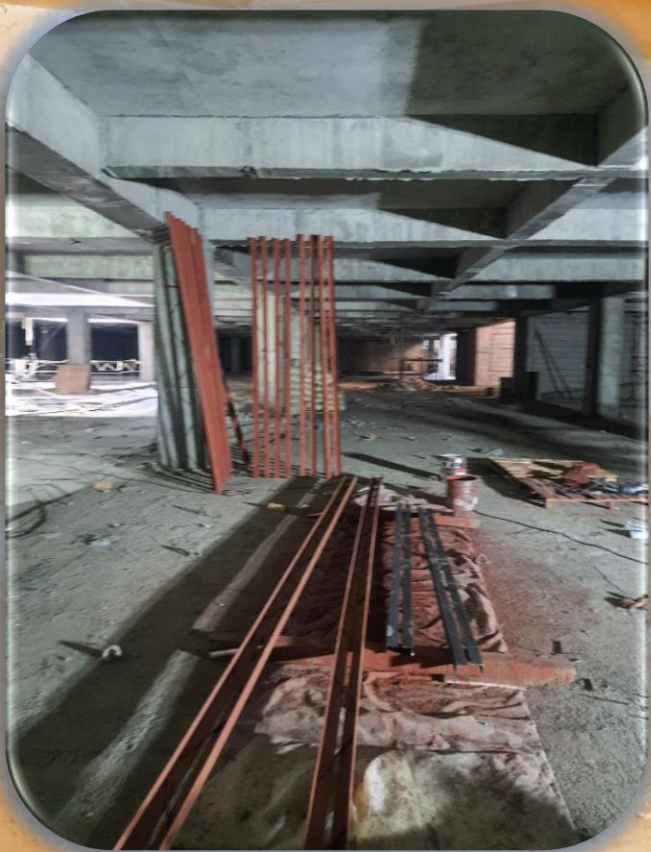

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶
