



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک D1

(۲۱ الی ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای سقف


□ قالب بندی سقف ۷+ بال غربی





## نصب تیر و ستون

- نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی

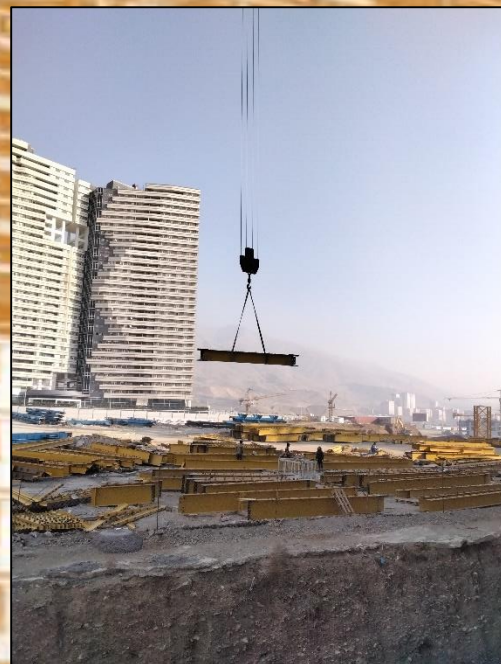



## اجرای واحدهای مسکونی

- ❑ نصب وال پست و اجرای پنل های پیش ساخته طبقه ۵+ بال شرقی
- ❑ اجرای پلاستردیوار سرویس بهداشتی، آشپزخانه و بالکن طبقه ۱+ بال غربی
- ❑ اجرای کروم بندی و شیب بندی کف سرویس بهداشتی، آشپزخانه و بالکن طبقه ۱+ بال غربی
- ❑ کفسازی واحدهای مسکونی طبقه ۱+ بال غربی
- ❑ کفسازی راهروهای طبقه ۱+ بال غربی









## تاسیسات

- ساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی
- اجرای لوله های تاسیسات (آب وفاضلاب) طبقه +۱  
بال غربی





## انباری ها

- اجرای قرنیز انباری های طبقات منفی
- نصب رابیتس دیوار انباری های طبقات منفی
- ساخت درب انباری های طبقات منفی
- اجرای پلاستر دیوار انباری های طبقات منفی
- اجرای دیوارچینی انباری های طبقه ۶-









## بار ارسالی

- تخلیه لوله و اتصالات پروپیلن در محل پروژه
- تخلیه مواد فایرپروف در محل پروژه





## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۲۱



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۲۶
