



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D۱

مهرماه ۱۴۰۱



مجتمع بزرگ
مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com


اجرای سقف

- قالب بندی ، آرماتور بندی، بتن ریزی سقف +۱۱ بال شرقی
- قالب بندی ، آرماتور بندی، بتن ریزی سقف +۱۲ بال شرقی

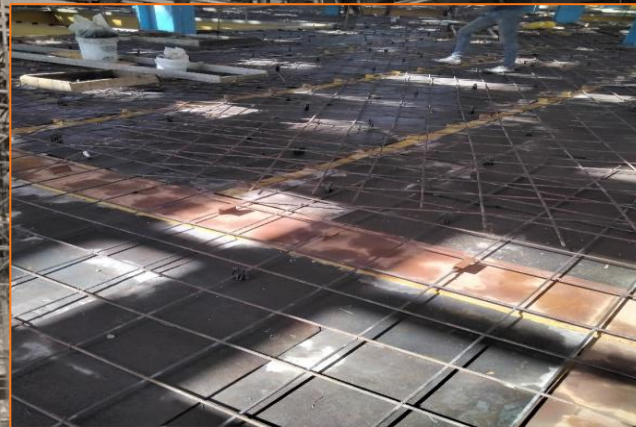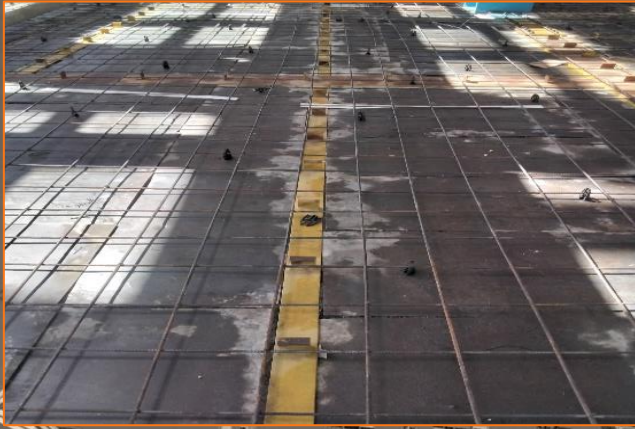


نصب تیر وستون

- نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی
- نصب تیرهای فرعی استیج چهارم بال شرقی
- مونتاژ و جوشکاری ورق تقویت ستون های C5

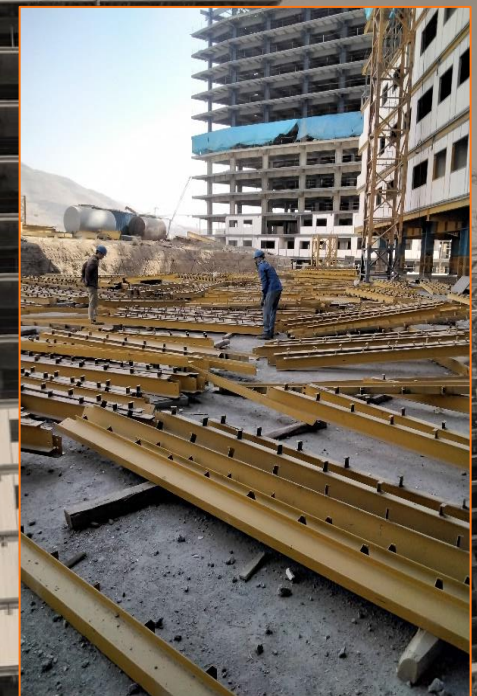

اجرای واحدهای مسکونی

- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقات +۲، +۳، +۴ بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقات +۲، +۳، +۴ بال شرقی
- نصب پلایت های طبقه +۵ بال شرقی جهت نصب دیوار واحدها
- نصب پنجره های UPVC واحدهای نمونه

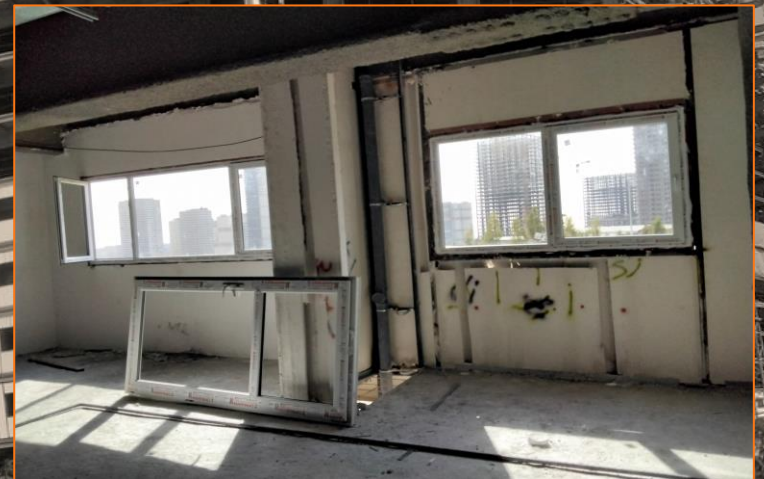

تاسیسات

- اجرای عملیات ساخت کانال های هواساز
- اجرای لوله کشی گاز واحدها در طبقه +۱ بال غربی
- اجرای رایزرهای فاضلاب و لوله های تاسیسات واحدهای طبقات مثبت بال غربی



راه پله

- ثبت نقاط نقشه برداری جهت نصب شمشیری
- پله های بال شرقی
- کاشت رول بولت جهت نصب شمشیری پله ها
- نصب شمشیری پله ها(راه پله) در بال شرقی



بارهای ارسالی

- ورود سیفون و لوله و اتصالات پوشفیت
- فاضلابی شرکت نیوفلکس به محل پروژه
- ورود مواد فایرپروف شرکت نفتاب به محل پروژه
- ورود پنل های پیش ساخته از شرکت ایزی وال به محل پروژه
- ورود پنجره های UPVC جهت نصب در واحدهای نمونه به محل پروژه



تصاویر مقایسه ای ضلع شرق بال شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب ستون های استیج چهارم بال
شرقی، نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال
شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال
شرقی، نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج
چهارم بال شرقی

تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب
تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

اتمام نصب ستون های استیج سوم بال
غربی، نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی

تصاویر مقایسه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی، اجرای سقف +۱۰ بال شرقی، تکمیل قالب بندی سقف +۱۱ بال شرقی، اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۴ (ضلع شمال) بال شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، اتمام نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی، اجرای سقف +۱۱ و +۱۲ بال شرقی، ادامه اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۴ (ضلع شمال) بال غربی

تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۷/۰۲


نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی، اجرای سقف +۱۰ بال شرقی، تکمیل قالب بندی سقف +۱۱ بال شرقی، اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۴ بال شرقی و غربی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، اتمام نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای اصلی استیج سوم بال غربی، اجرای سقف +۱۱ و +۱۲ بال شرقی، ادامه اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۴ بال شرقی و غربی

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)

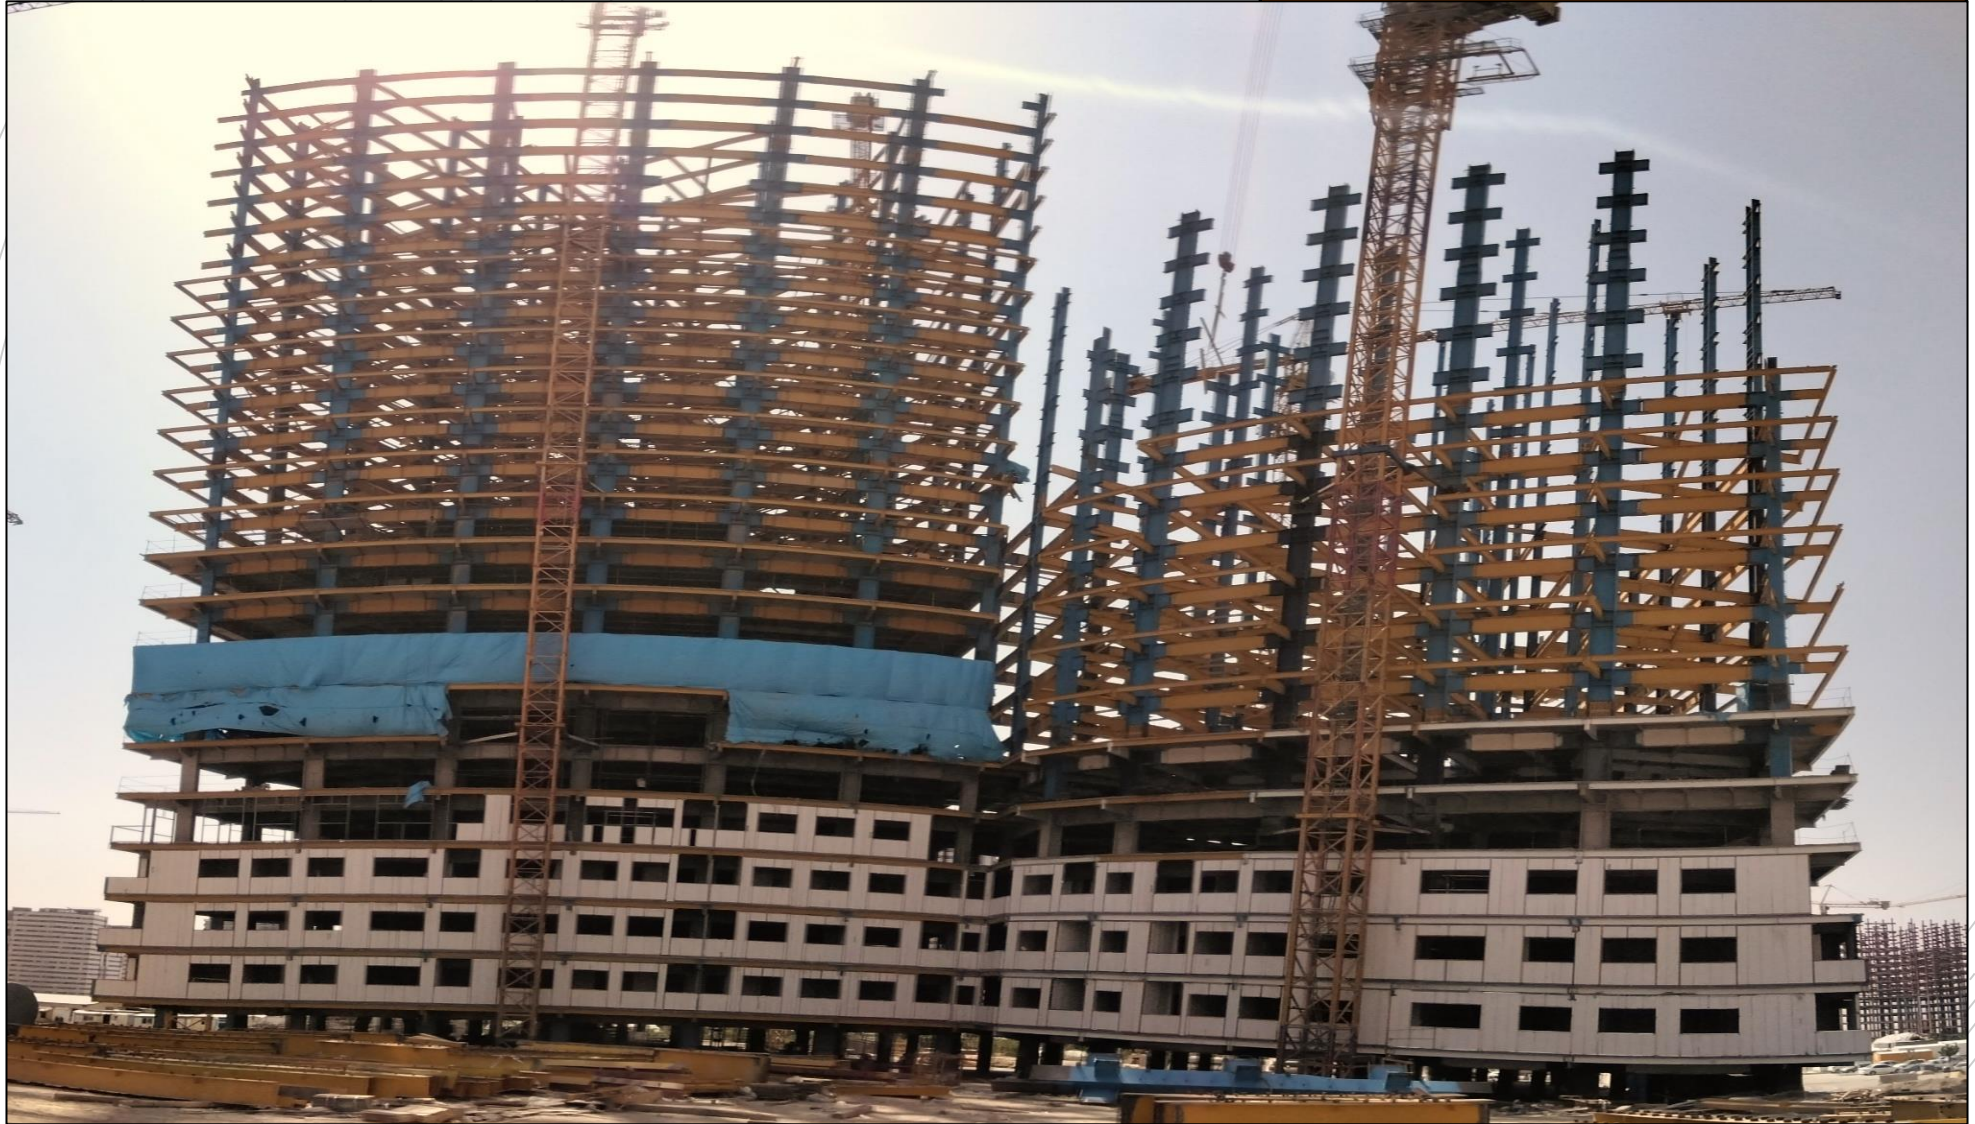


۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶

تصویر نقطه ای ضلع شمال (۳)

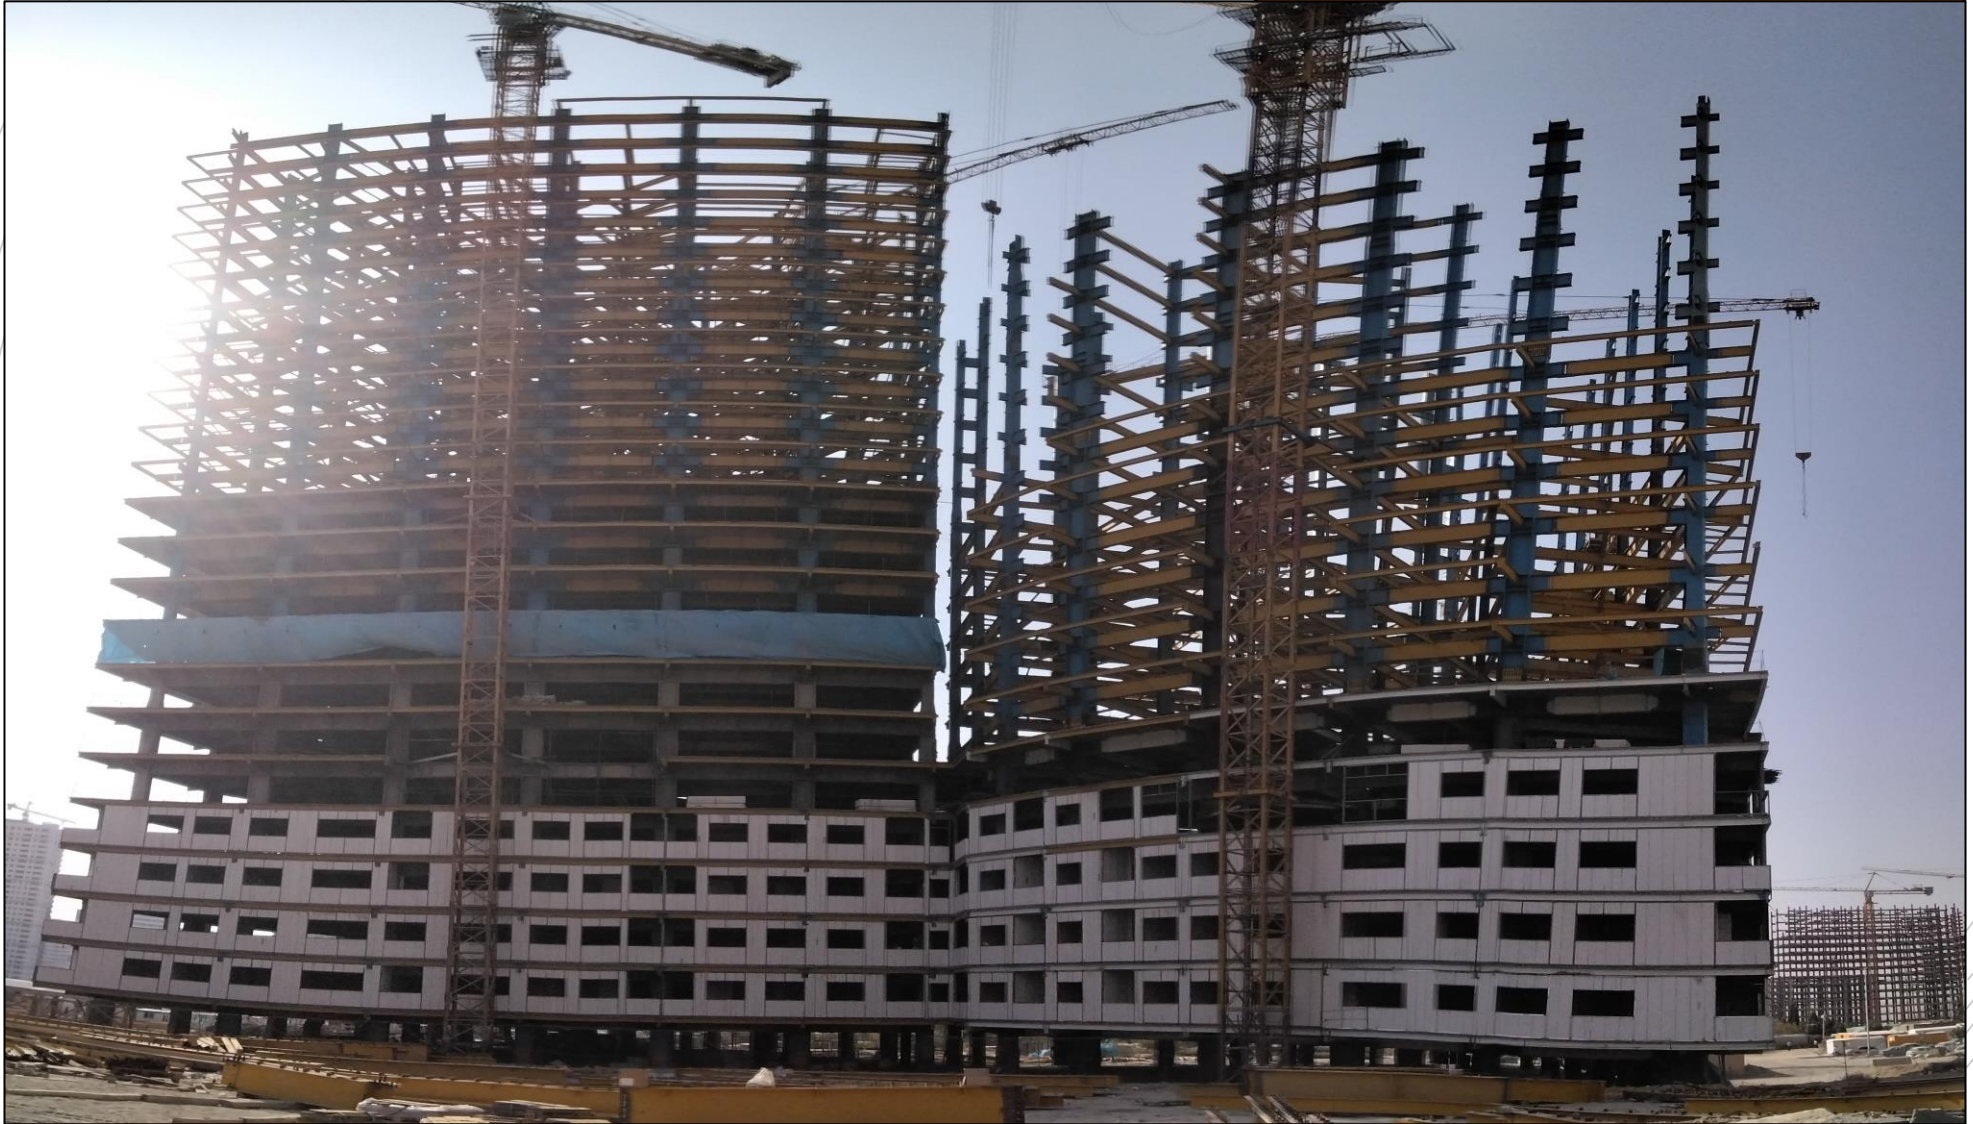

۱۴۰۱/۰۷/۲۸

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۳)



۱۴۰۱/۰۷/۲۸
