



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D۲

مهرماه ۱۴۰۱

# مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)



## اجرای سقف

- تکمیل آرماتوربندی، بتن ریزی سقف +۹ بال شرقی
- تکمیل آرماتوربندی، بتن ریزی سقف +۱۲ بال غربی
- قالب بندی و آرماتوربندی، بتن ریزی بین دو بال طبقه +۹ بال شرقی
- اجرای زیرسازی طبقه +۱۰ بال شرقی





## نصب تیر وستون

- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی
- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی





## اجرای واحدهای مسکونی


- نصب وال پست دیوار واحدها طبقه +۳ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقات +۱، +۲، +۳ بال شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقه +۱، +۲ بال غربی
- پیاده سازی نقاط داکت ها در طبقات مثبت معماری توسط نقشه بردار
- نصب رانرهای طبقه +۱ بال غربی





## حفاری چاه

- حفر چاه های جذبی و کول گذاری چاه جذبی طبقه ۶-

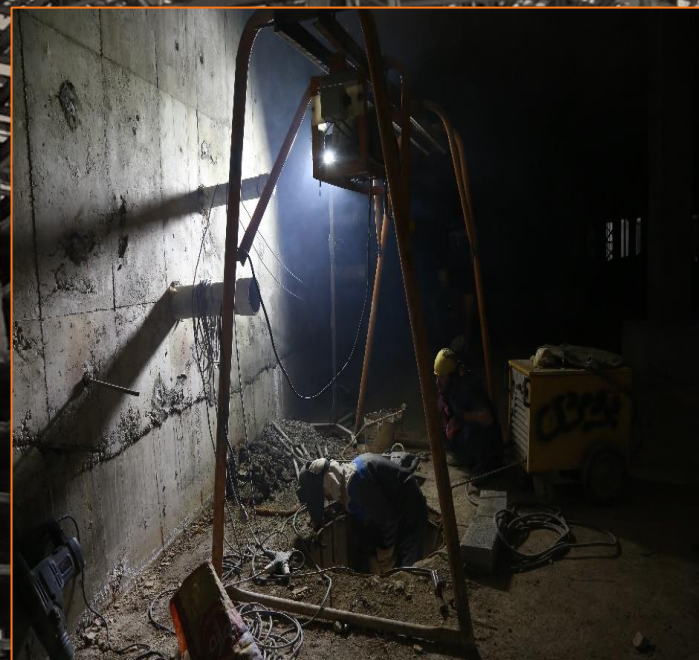



## بارهای ارسالی

- ورود پنل های پیش ساخته از شرکت ایزی وال به محل پروژه
- ورود مواد فایرپروف شرکت نفتاب به محل پروژه
- ورود لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی و سیفون شرکت نیوفلکس به محل پروژه





# آسانسور کارگاهی

□ نصب آسانسور کارگاهی (آلیماک) در بال غربی





## تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی بال شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲  
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی، نصب دو عدد ستون  
باقیمانده استیج سوم بال شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸  
ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی



## تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی



## تصاویر مقایسه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و غربی، نصب دو عدد ستون باقیمانده استیج سوم بال شرقی، اجرای سقف +۱۱ بال غربی، اجرای سقف +۸ بال شرقی، اجرای آرماتوربندی سقف +۱۲ بال غربی، تکمیل آرماتوربندی سقف +۹ بال شرقی، اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۱ بال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و غربی، اجرای سقف +۹ بال شرقی، اجرای سقف +۱۲ بال غربی، اجرای زیرسازی +۱۰ بال شرقی، اجرای پنل های پیش ساخته طبقه +۱، +۲ (ضلع شمال) بال غربی



## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و غربی، نصب  
دو عدد ستون باقیمانده استیج سوم بال شرقی، اجرای سقف  
+۱۱ بال غربی، اجرای سقف +۸ بال شرقی، اجرای  
آرماتوربندی سقف +۱۲ بال غربی، تکمیل آرماتوربندی  
سقف +۹ بال شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

ادامه نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی و  
غربی، اجرای سقف +۹ بال شرقی، اجرای سقف +۱۲ بال  
غربی، اجرای زیرسازی +۱۰ بال شرقی، اجرای پنل های  
پیش ساخته طبقه +۳ (ضلع جنوب) بال شرقی



# تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۷/۰۲



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶



تصویر نقطه ای ضلع شمال (۳)



۱۴۰۱/۰۷/۲۸



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۷/۰۲



## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۷/۱۶



# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۳)



۱۴۰۱/۰۷/۲۸
