


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4


(۱۹ الی ۲۴ آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

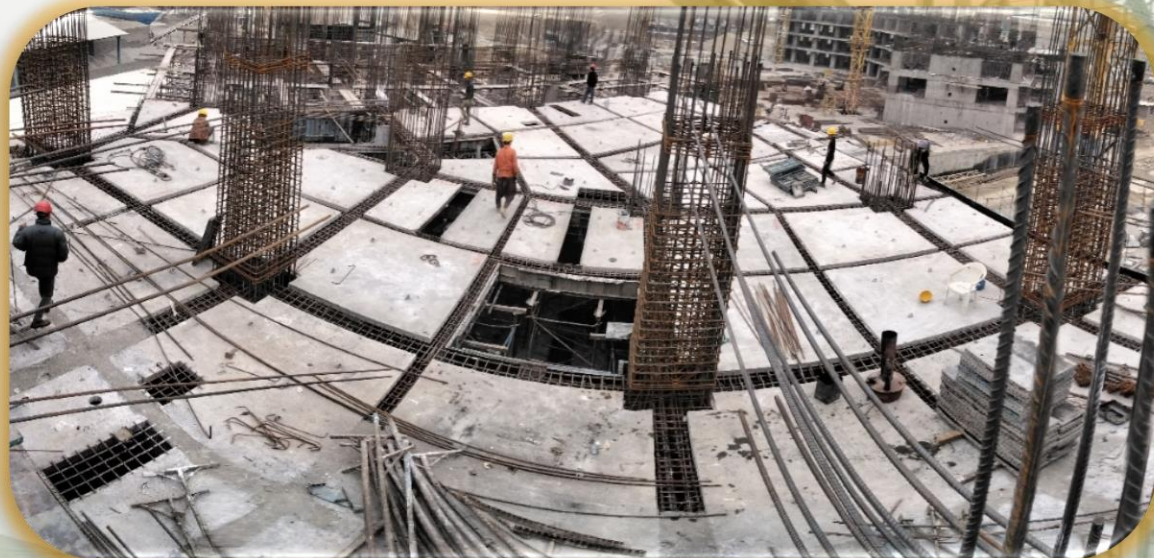

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+۵ (کف ۵+) هسته مرکزی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+۴ (کف ۴+) بال غربی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۳+۴ (کف ۴+) بال غربی



ستون

✓ آرماتوربندی ستون های طبقه ۵ + هسته

مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳ + بال

غربی

✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۳ + بال غربی

✓ دکفراژ ستون های طبقه ۳ + بال غربی


✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴ + بال

غربی

✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴ + بال غربی


✓ دکفراژ ستون های طبقه ۴ + بال غربی

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های

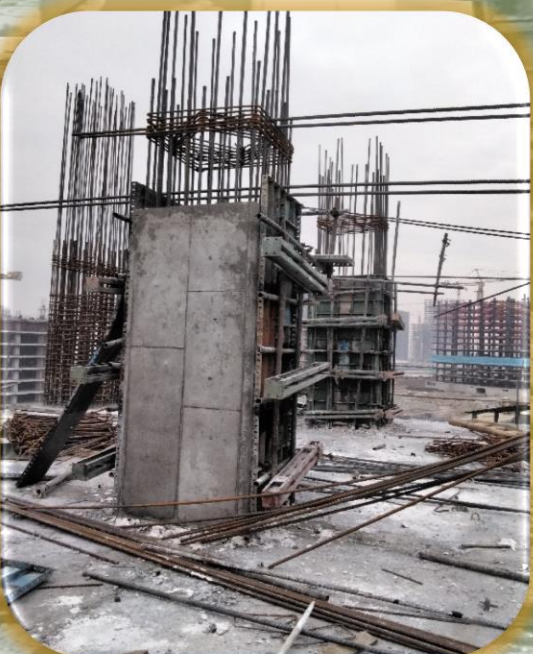

دیوار برشی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۳+
بال غربی

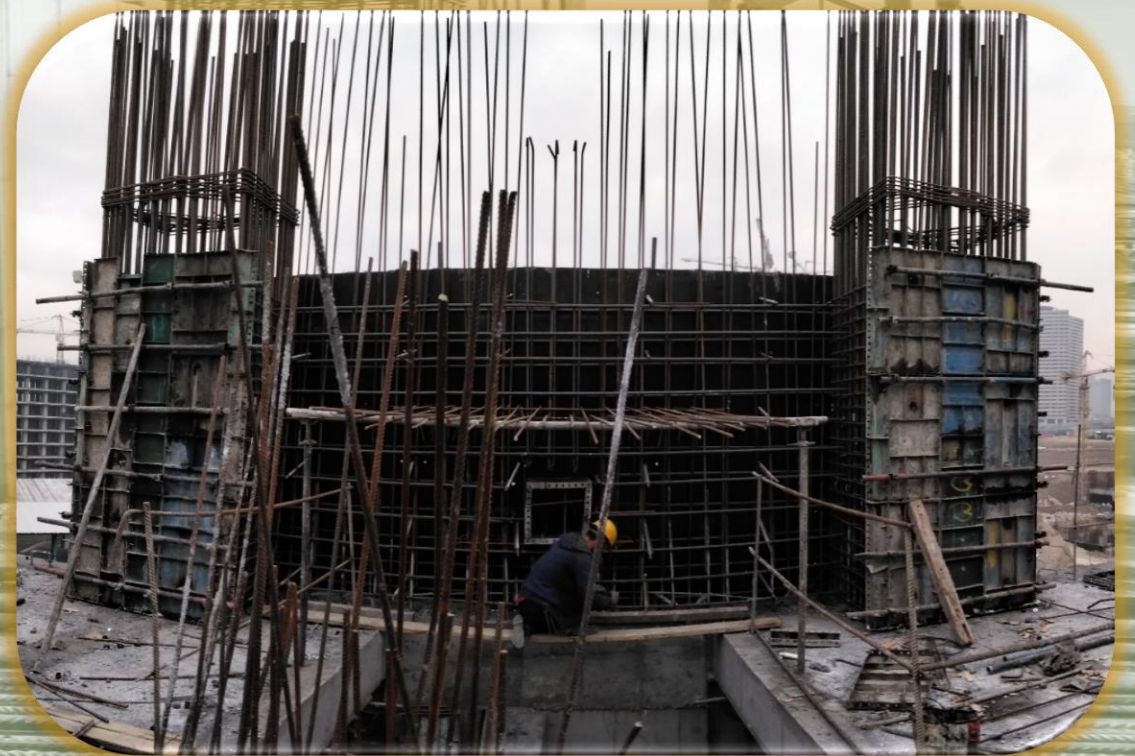

پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) بال غربی




انباری

- ❖ اجرای وال پست انباری های طبقه ۱-
- ❖ اجرای دیوارچینی انباری های طبقه ۱-



موتورخانه

- ✓ اجرای آرماتوربندی دیوار ضلع غربی موتورخانه
- ✓ دکفراژ قالب ضلع جنوبی دیوار موتورخانه

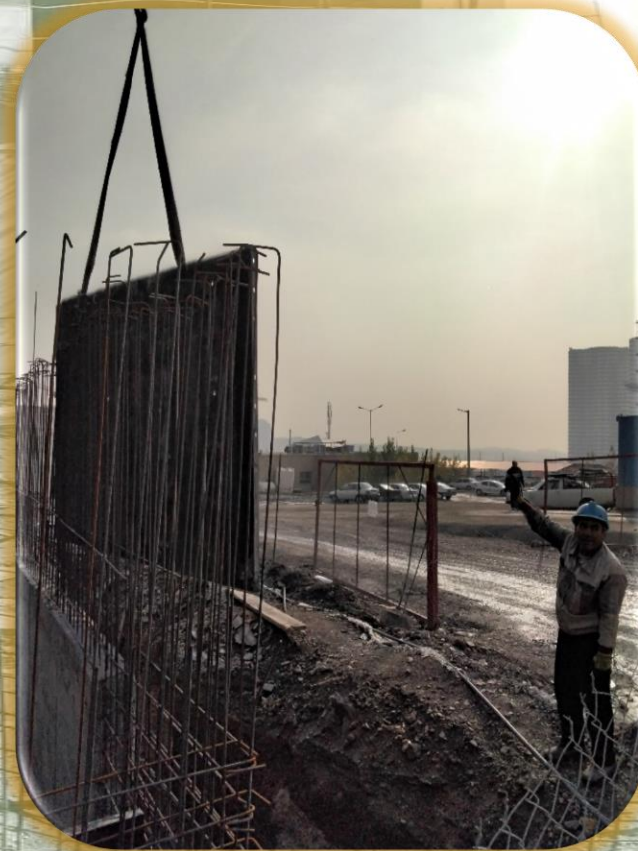

کارگاه رزوه

✓ اتمام رزوه آرماتور ستون های طبقه ۵+ الی ۱۰+



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۲۴
