



# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۰۳ الی ۰۸ دی ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای سقف

- ✓ شروع اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال غربی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی و بال شرقی



سقف طبقه ۳+ (کف ۴+)



سقف طبقه ۴+ (کف ۵+)



# اجرای ستون



- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های  
طبقه ۵+ هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ هسته  
مرکزی
- ✓ آرماتوربندی ستون های طبقه ۴+ بال  
شرقی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون  
های





# دیوار برشی

■ بتن ریزی دیوار برشی به همراه ستون های اطراف آن طبقه ۴ بال غربی زون ۱





# پنل سقف

■ نصب پنل سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) هسته مرکزی






# راه پله

✓ بتن ریزی راه پله شماره ۱ بال غربی طبقه  
+۳ به +۴

✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله  
شماره ۲ بال شرقی طبقه +۳ به +۴

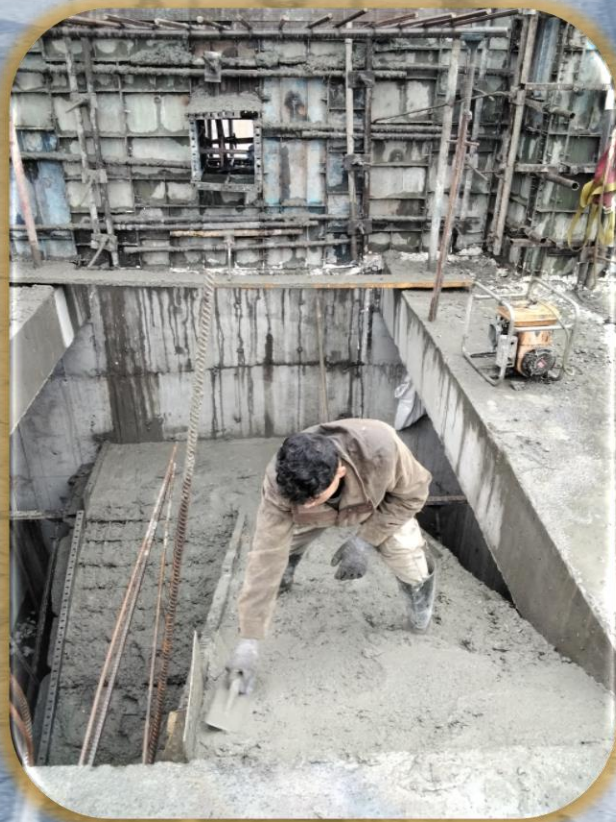



# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۱۰.۰۳



# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱.۱۰.۰۸



# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱.۱۰.۰۳



# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱.۱۰.۰۸
