



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی عملکرد بلوک N4

(۰۸ الی ۳۱ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- ✓ تکمیل آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال غربی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) و ۵+ (کف ۶+)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع

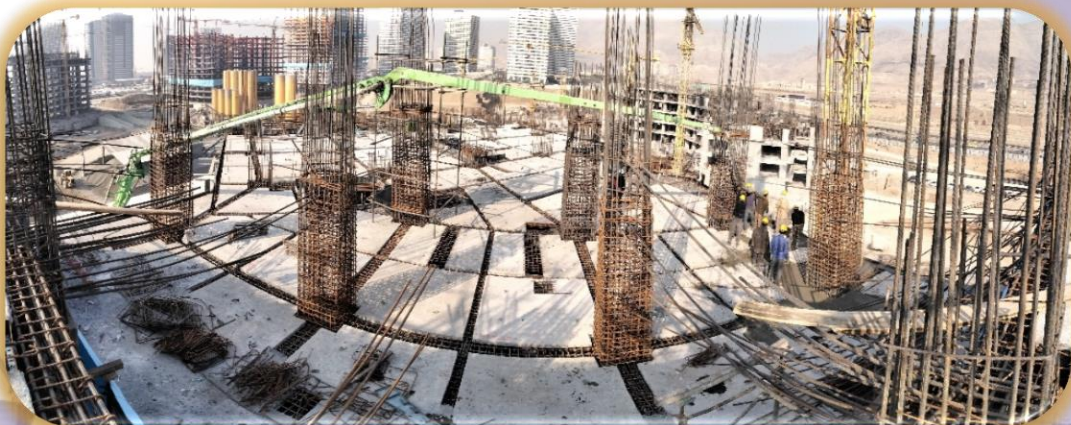

اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه +۶ هسته مرکزی
- ✓ آرماتوربندی ستون های طبقه +۶ بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۵ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه +۵ بال شرقی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



راه پله



✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه +۴
به +۵ بال غربی
✓ بتن ریزی راه پله طبقه +۴ به +۵ بال غربی



انباری

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۱-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۱-



موتورخانه

✓ اجرای بتن ریزی ستون های موتورخانه



کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه ستون های پنجم تا هشتم بال غربی



تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۸

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۱۳

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۸

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۳
