

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N4

(۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- ✓ شروع اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۶ (+ کف ۷)
- ✓ هسته مرکزی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه ۵ (+ کف ۶) بال شرقی
- ✓ تکمیل بتن ریزی سقف طبقه ۵ (+ کف ۶) بال شرقی
- ✓ اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۵ (+ کف ۶) بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۴ (+ کف ۵) و ۵ (+ کف ۶)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



اجرای ستون




- ✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



دیوار برشی

- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی

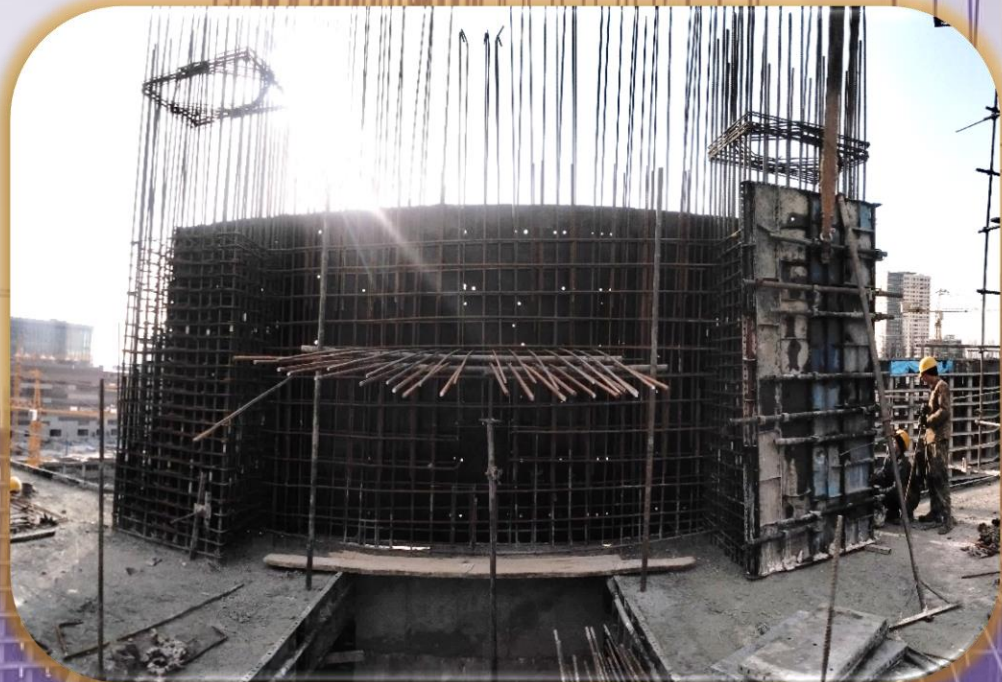


راه پله

- ✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه ۵+
- به ۶+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۵+ به ۶+ بال شرقی




انباری

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۱-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۱-

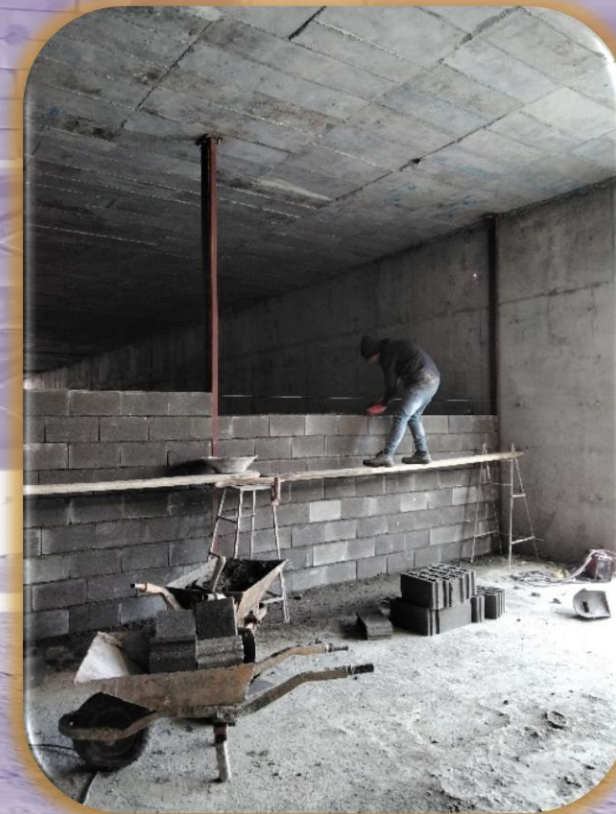

کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه ستون های پنجم تا هشتم بال غربی

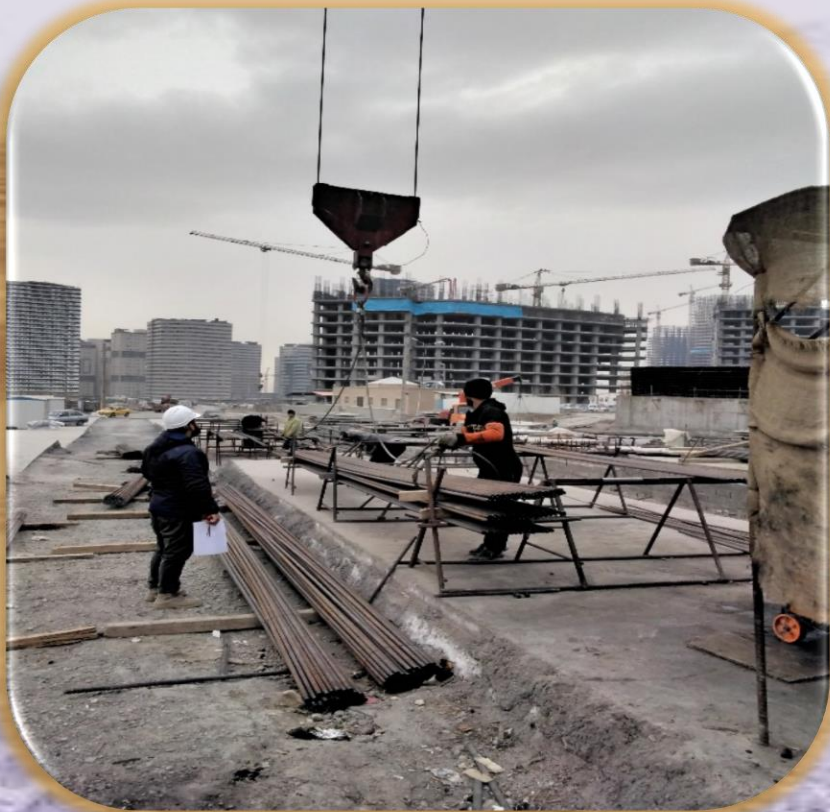

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۰
