



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(۱۹ الی ۲۴ فروردین ۱۴۰۲)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



اجرای تیر سقف



- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+)(زون ۱ و ۲ و ۳)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال شرقی (زون ۳) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+)(بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی (زون ۱)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) و ۵+ (کف ۶+)
- ✓ اجرای ضد زنگ پلیت نما و نصب آن در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه ۴+ (کف ۵+)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع


نصب پنل

- ✓ تکمیل نصب پنل سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی (زون ۲) و بال شرقی (زون ۳)
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی (زون ۱)

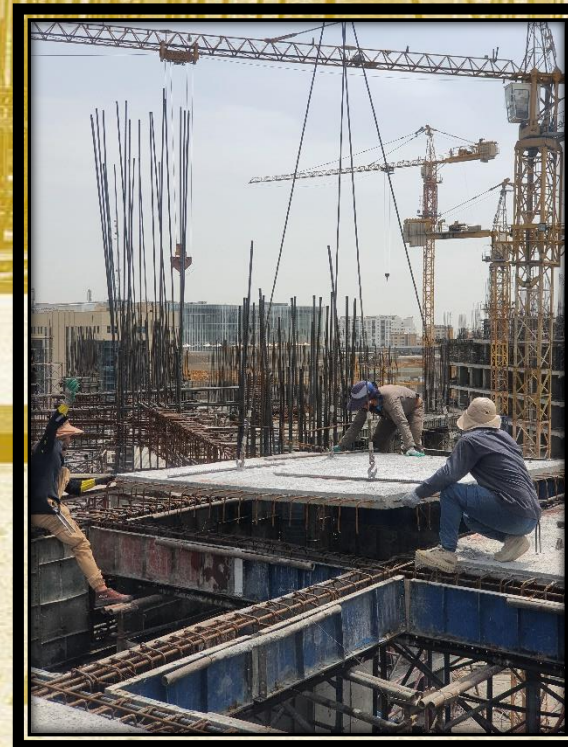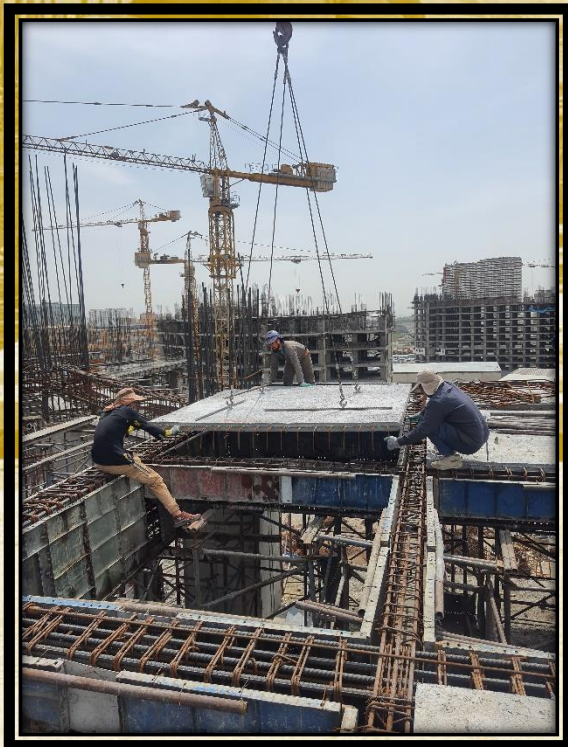



اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال شرقی (زون ۳) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۵+ هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون ها

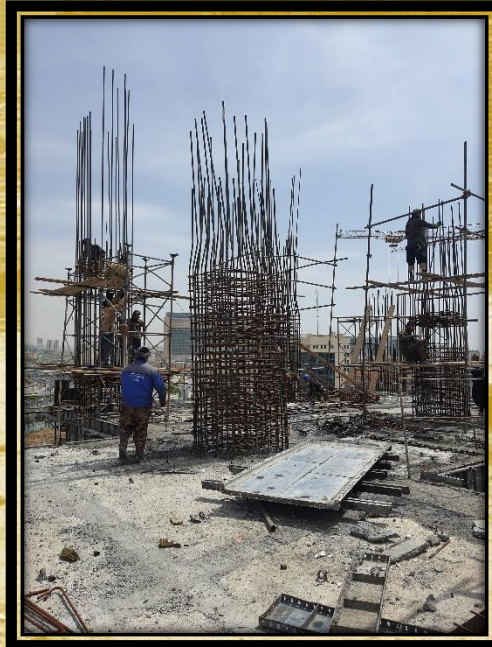

انباری ها

- ✓ ساخت و نصب وال پست های انباری طبقه ۴-
- ✓ ادامه اجرای یه رگه چینی و تیغه چینی انباری های طبقه ۴-

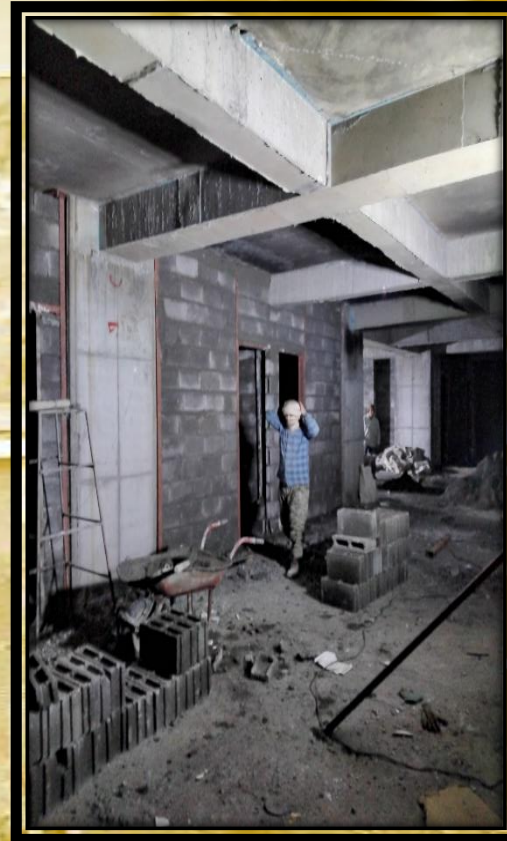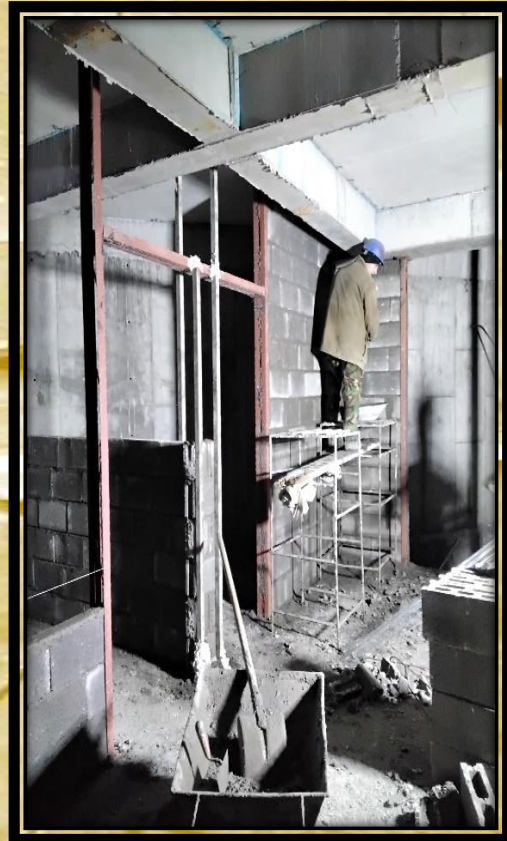

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۲/۰۱/۱۹

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۲/۰۱/۲۲

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۱/۱۹

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۱/۲۲
