




گزارش هفتگی از عملکرد بلوک

هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۰

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

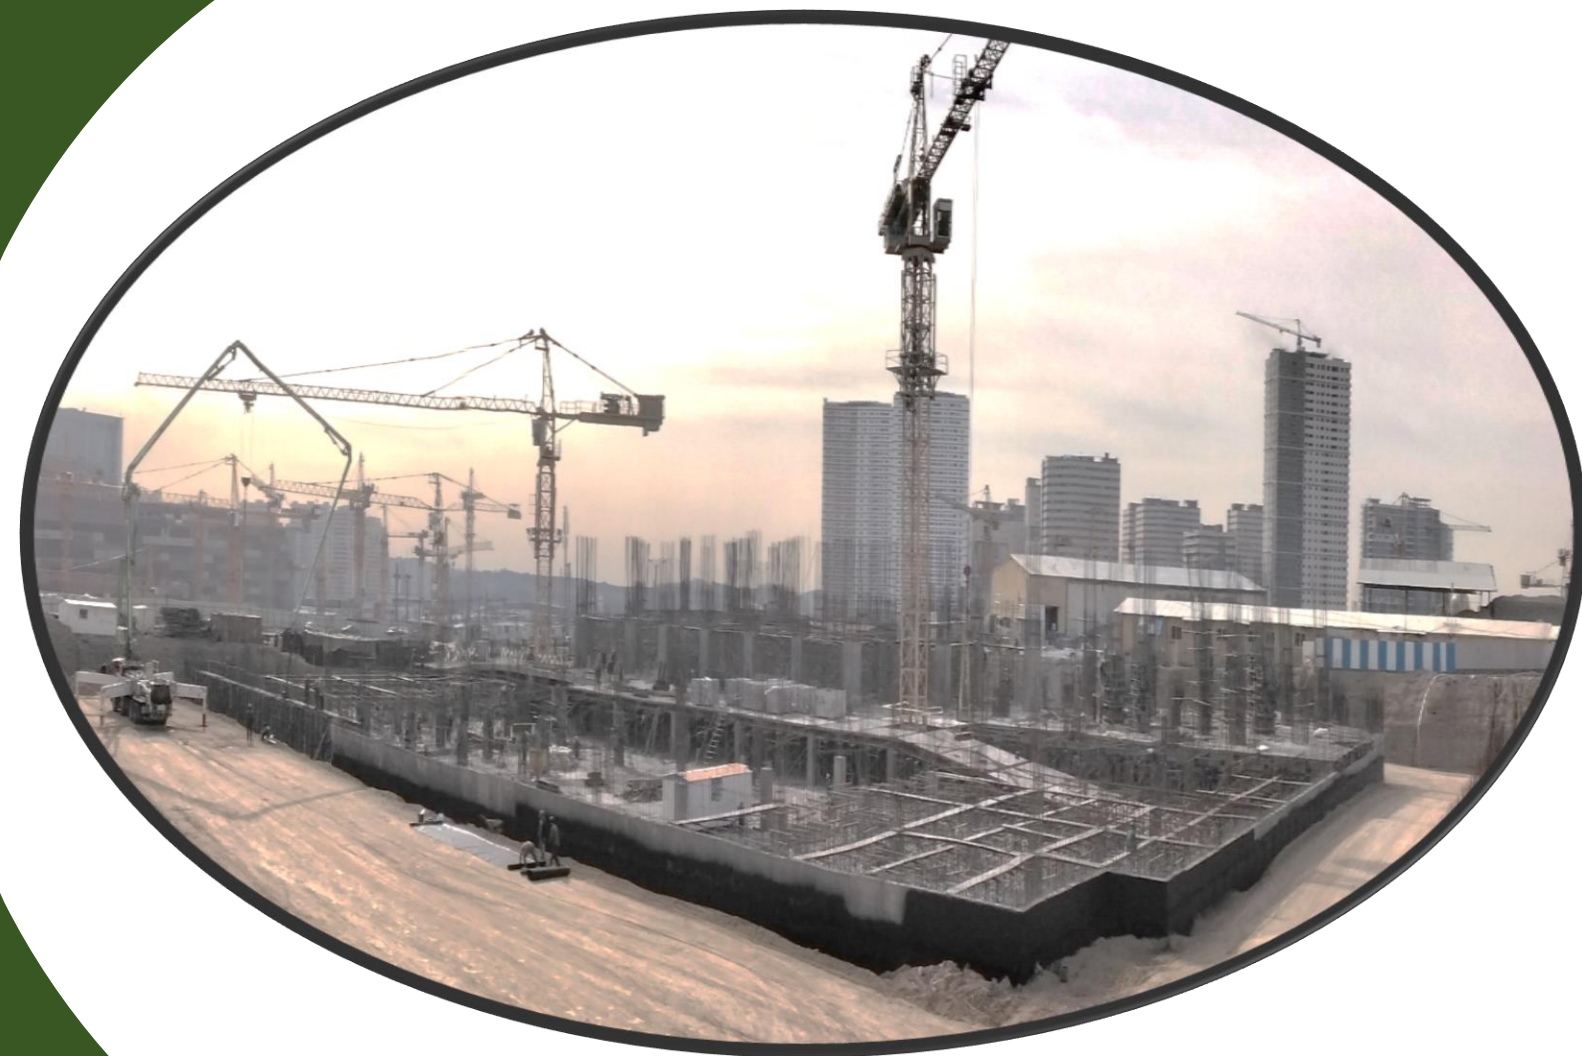

اجرای دیوار حائل و برشی

- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شمالی پارکینگ
- بتن ریزی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شمالی پارکینگ
- آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۲- ضلع شمال شرقی پارکینگ
- آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع شرقی برج اصلی
- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوب شرقی برج اصلی
- بتن ریزی و دکفراژ دیوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوب شرقی برج اصلی
- آرماتوربندی دیوار حائل طبقه ۱- ضلع جنوبی برج اصلی
- آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۱- بال شرقی برج




اجرای ستون

- آرماتور بندی و قالب بندی ستون های طبقه ۱- بال غربی برج
- بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۱- بال غربی برج
- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲- ضلع شمالی پارکینگ
- آرماتوربندی ستون های رمپ ضلع غربی
- آرماتوربندی ستون های ضلع جنوبی برج



اجرای پنل سقف

نصب پنل رمپ طبقه ۲- به ۱-

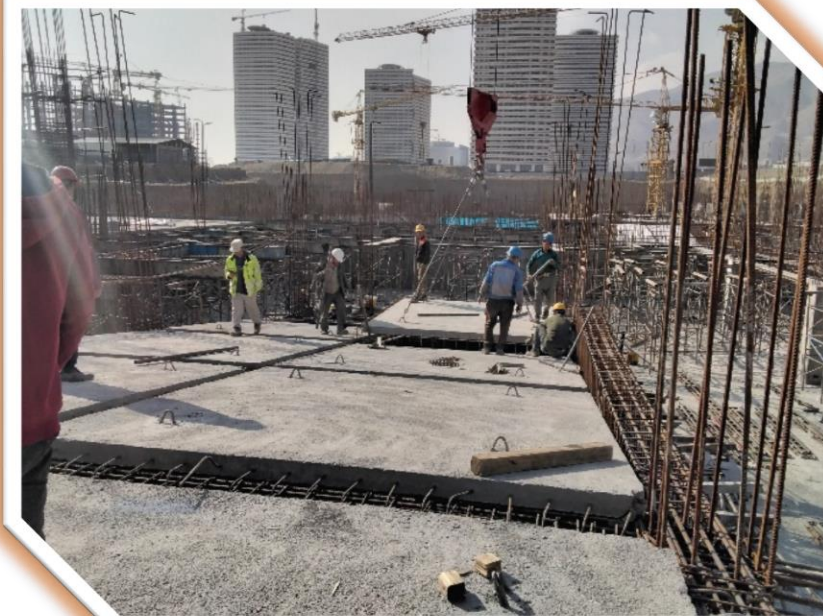

اجرای تیر سقف

بتن ریزی پارت آخر تیرهای اصلی و فرعی سقف طبقه ۳-
ضلع شمال و شمال شرقی پارکینگ
تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای بین رمپ غربی و
برج اصلی سقف طبقه ۲-

تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای رمپ غربی طبقه
۲- به ۱-

نصب کف تیر و آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی ضلع
شمال شرقی طبقه ۲- پارکینگ



نصب کف تیر و آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی ضلع
شمال غربی طبقه ۲- پارکینگ

نصب کف تیر و آرماتوربندی تیرهای اصلی و فرعی طبقه
۱- بال غربی



خاکریزی و تسطیح

- اجرای خاکریزی، تسطیح و رگلاژ لایه های خاک ضلع شمالی
- اجرای خاکریزی، تسطیح و رگلاژ لایه های خاک ضلع جنوبی

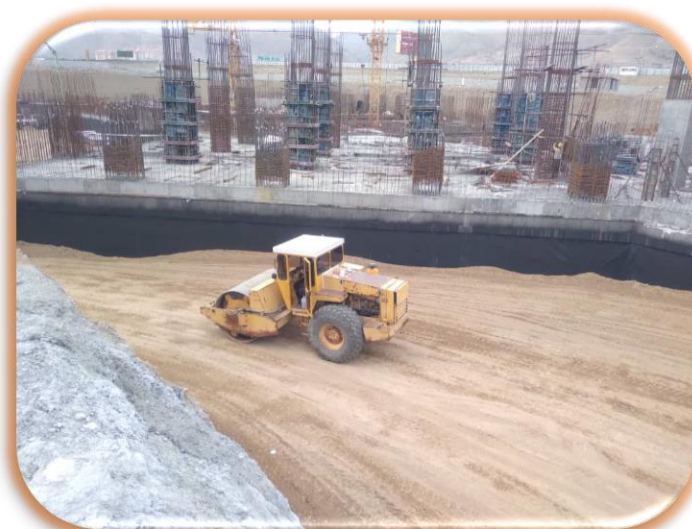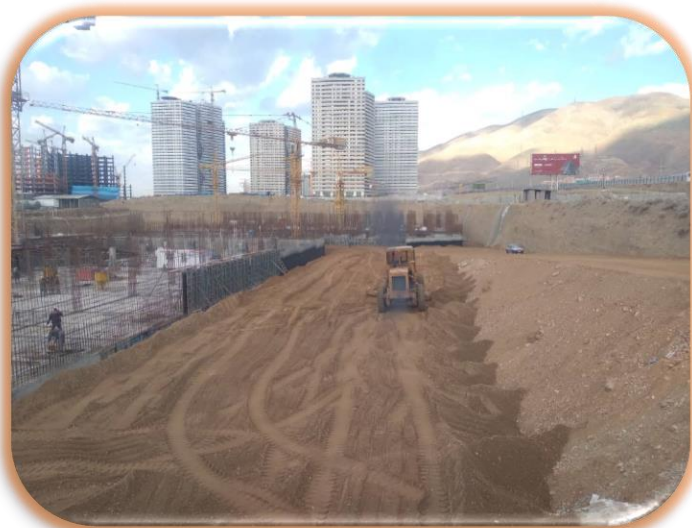

انباری ها

- اجرای وال پست انباری های طبقه ۳- بال شرقی برج
- اجرای دیوارچینی انباری های طبقه ۳- بال شرقی برج



راه پله و رمپ

- تکمیل آرماتوربندی تیرهای رمپ بال غربی طبقه ۲- به ۱-
- تکمیل قالب بندی تیرهای رمپ بال غربی طبقه ۲- به ۱-
- قالب بندی راه پله ضلع جنوبی برج



تصاویر نقطه ای ضلع شمال غربی



۱۴۰۰/۱۲/۰۷

تصاویر نقطه ای ضلع شمال غربی



۱۴۰۰/۱۲/۱۱

تصاویر نقطه ای ضلع غربی



۱۴۰۰/۱۲/۱۲
