

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک N۳

شهریور ماه ۱۴۰۱


مجمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

دیوار های حائل و برشی

- ✓ تکمیل دیوار حائل پارکینگ الحاقی منفی ۱، زون ۴ ضلع غربی پارکینگ الحاقی
- ✓ تکمیل دیوار حائل پارکینگ الحاقی منفی ۱، زون ۷ و ۶ و ۴ ضلع جنوبی پارکینگ الحاقی
- ✓ تکمیل دیوار برشی و ستون های طبقه ۱- بر ج اصلی

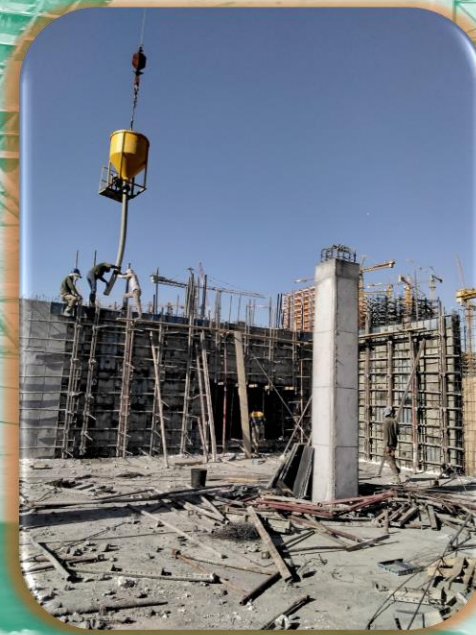

نصب پنل سقف

➤ نصب پنل سقف طبقه همکف برج اصلی



ستون ها



- تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف زون ۳ برج اصلی
- بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه همکف زون ۳ برج اصلی
- آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۱+ زون ۱ بال غربی برج اصلی
- بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۱+ زون ۱ بال غربی برج اصلی
- اجرای سیستم ارت و همبندی
- کیورینگ و عمل آوری مقاطع بتن ریزی شده



سقف



- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه همکف (سطح +۱) زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه همکف (سطح +۱) زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه همکف (سطح +۱) زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف سطح طبقه همکف برج اصلی و پارکینگ الحاقی
- ✓ اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه همکف (سطح +۱) زون ۳ بال شرقی برج اصلی




انباری

- ✓ مونتاژ و نصب وال پست های انباری های طبقه ۳-
- ✓ اجرای یه دیوارچینی انباری های طبقه ۳-




راه پله و رمپ

✓ تکمیل راه پله شماره ۲ و ۳ ضلع شمالی برج اصلی طبقه همکف

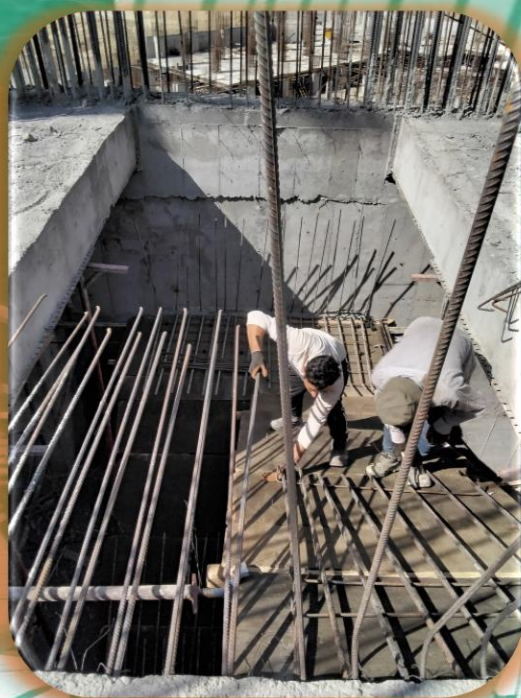

تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی

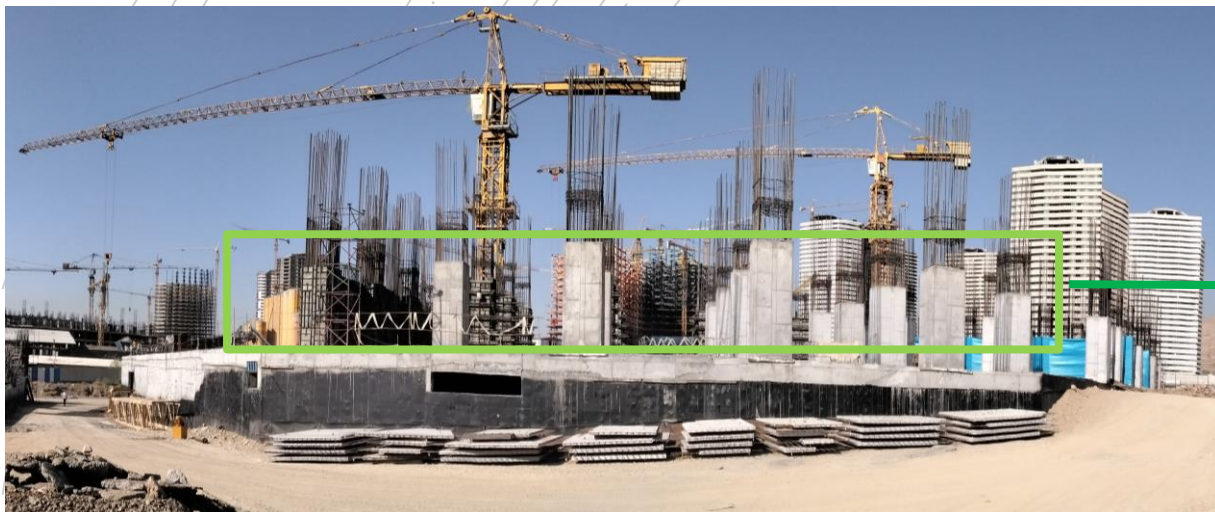

آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه همکف

۱۴۰۱/۰۶/۰۱



تکمیل ستون های طبقه همکف

اجرای اسکافلد و نصب کف تیرهای سقف طبقه همکف برج اصلی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱





۱۴۰۱/۰۹/۱۵



۱۴۰۱/۰۶/۳۱

تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی



آرماتوربندی و قالب بندی دیوار حایل
طبقه همکف ضلع جنوبی پارکینگ الحاقی

۱۴۰۱/۰۶/۰۱



تکمیل دیوار حایل طبقه همکف ضلع
جنوبی پارکینگ الحاقی

۱۴۰۱/۰۶/۳۱





۱۴۰۱/۰۹/۱۵



۱۴۰۱/۰۹/۳۰
