



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D۱

۱۴۰۱ شهریورماه

# مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر


مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی

چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)

## اجرای سقف

- قالب بندی، آرماتور بندی، بتن ریزی سقف +۱۰ بال شرقی
- قالب بندی سقف +۱۱ بال شرقی

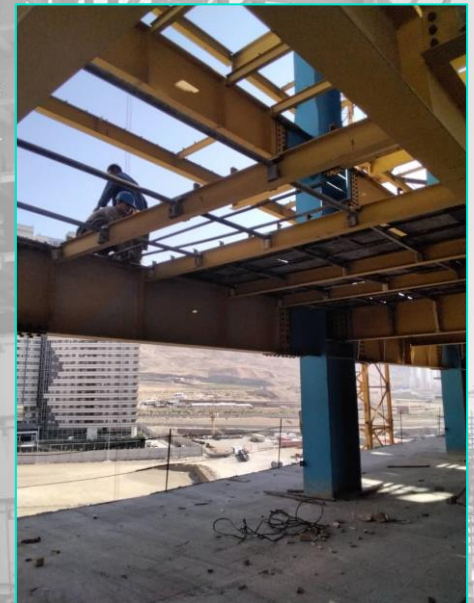

## نصب تیر وستون

- نصب ستون های استیج سوم بال غربی
- نصب تیر های فرعی استیج دوم بال غربی
- نصب تیر های اصلی استیج چهارم بال شرقی
- نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی



## اجرای واحدهای مسکونی



- نصب چهارچوب درب واحدهای طبقه +۱  
بال غربی و شرقی
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقات  
+۲، +۳، +۴ بال غربی
- اجرای تیغه چینی دیوار واحدها طبقات  
+۲، +۳، +۴ بال شرقی



## تاسیسات

- ساخت کانال های هواساز و نصب در طبقه +۱ بال غربی
- اجرای لوله کشی گاز واحدها در طبقه +۱ بال غربی
- اجرای رایزرهای فاضلاب واحدهای طبقات مثبت بال غربی



## بارهای ارسالی



- ورود ستونهای استیج سوم بال غربی از کارخانه آران سیج به محل پروژه
- ورود تیر و اسپلایس از کارخانه آران سیج به محل پروژه
- ورود سیفون و لوله و اتصالات پوشفیت فاضلابی شرکت نیوفلکس به محل پروژه
- ورود مواد فایرپروف شرکت نفتاب به محل پروژه






## تصاویر مقایسه ای ضلع شرق بال شرقی



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال  
شرقی، نصب ستون های استیج چهارم بال  
شرقی

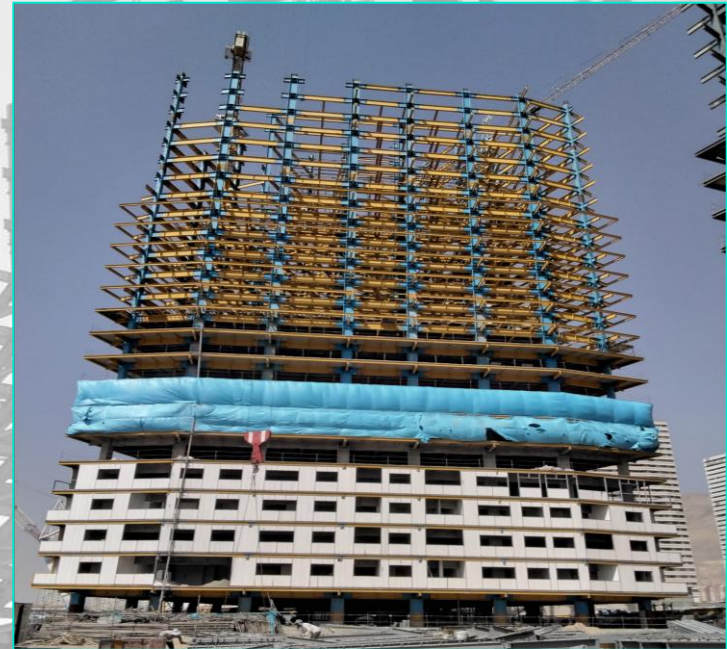

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال  
شرقی، ادامه نصب ستون های استیج چهارم  
بال شرقی



## تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب  
تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱


ادامه نصب ستون های استیج سوم بال  
غربی، ادامه نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال  
غربی

## تصاویر مقایسه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی

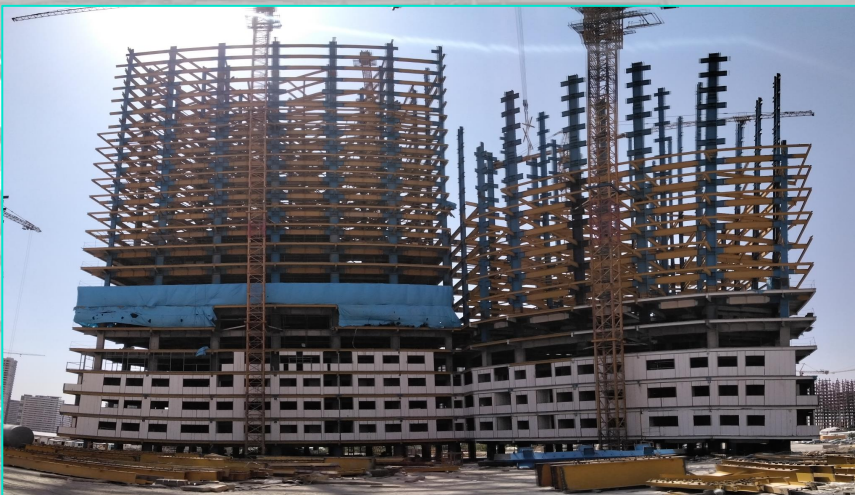

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، ادامه نصب ستون های استیج سوم بال غربی، ادامه نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، ادامه نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی، اجرای سقف ۱۰+ بال شرقی، تکمیل قالب بندی سقف ۱۱+ بال شرقی

## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۶/۰۱


نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، نصب ستون های استیج سوم بال غربی، نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی



۱۴۰۱/۰۶/۳۱


ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی، ادامه نصب ستون های استیج سوم بال غربی، ادامه نصب تیرهای اصلی استیج چهارم بال شرقی، ادامه نصب تیرهای فرعی استیج دوم بال غربی، اجرای سقف ۱۰+ بال شرقی، تکمیل قالب بندی سقف ۱۱+ بال شرقی

# تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)

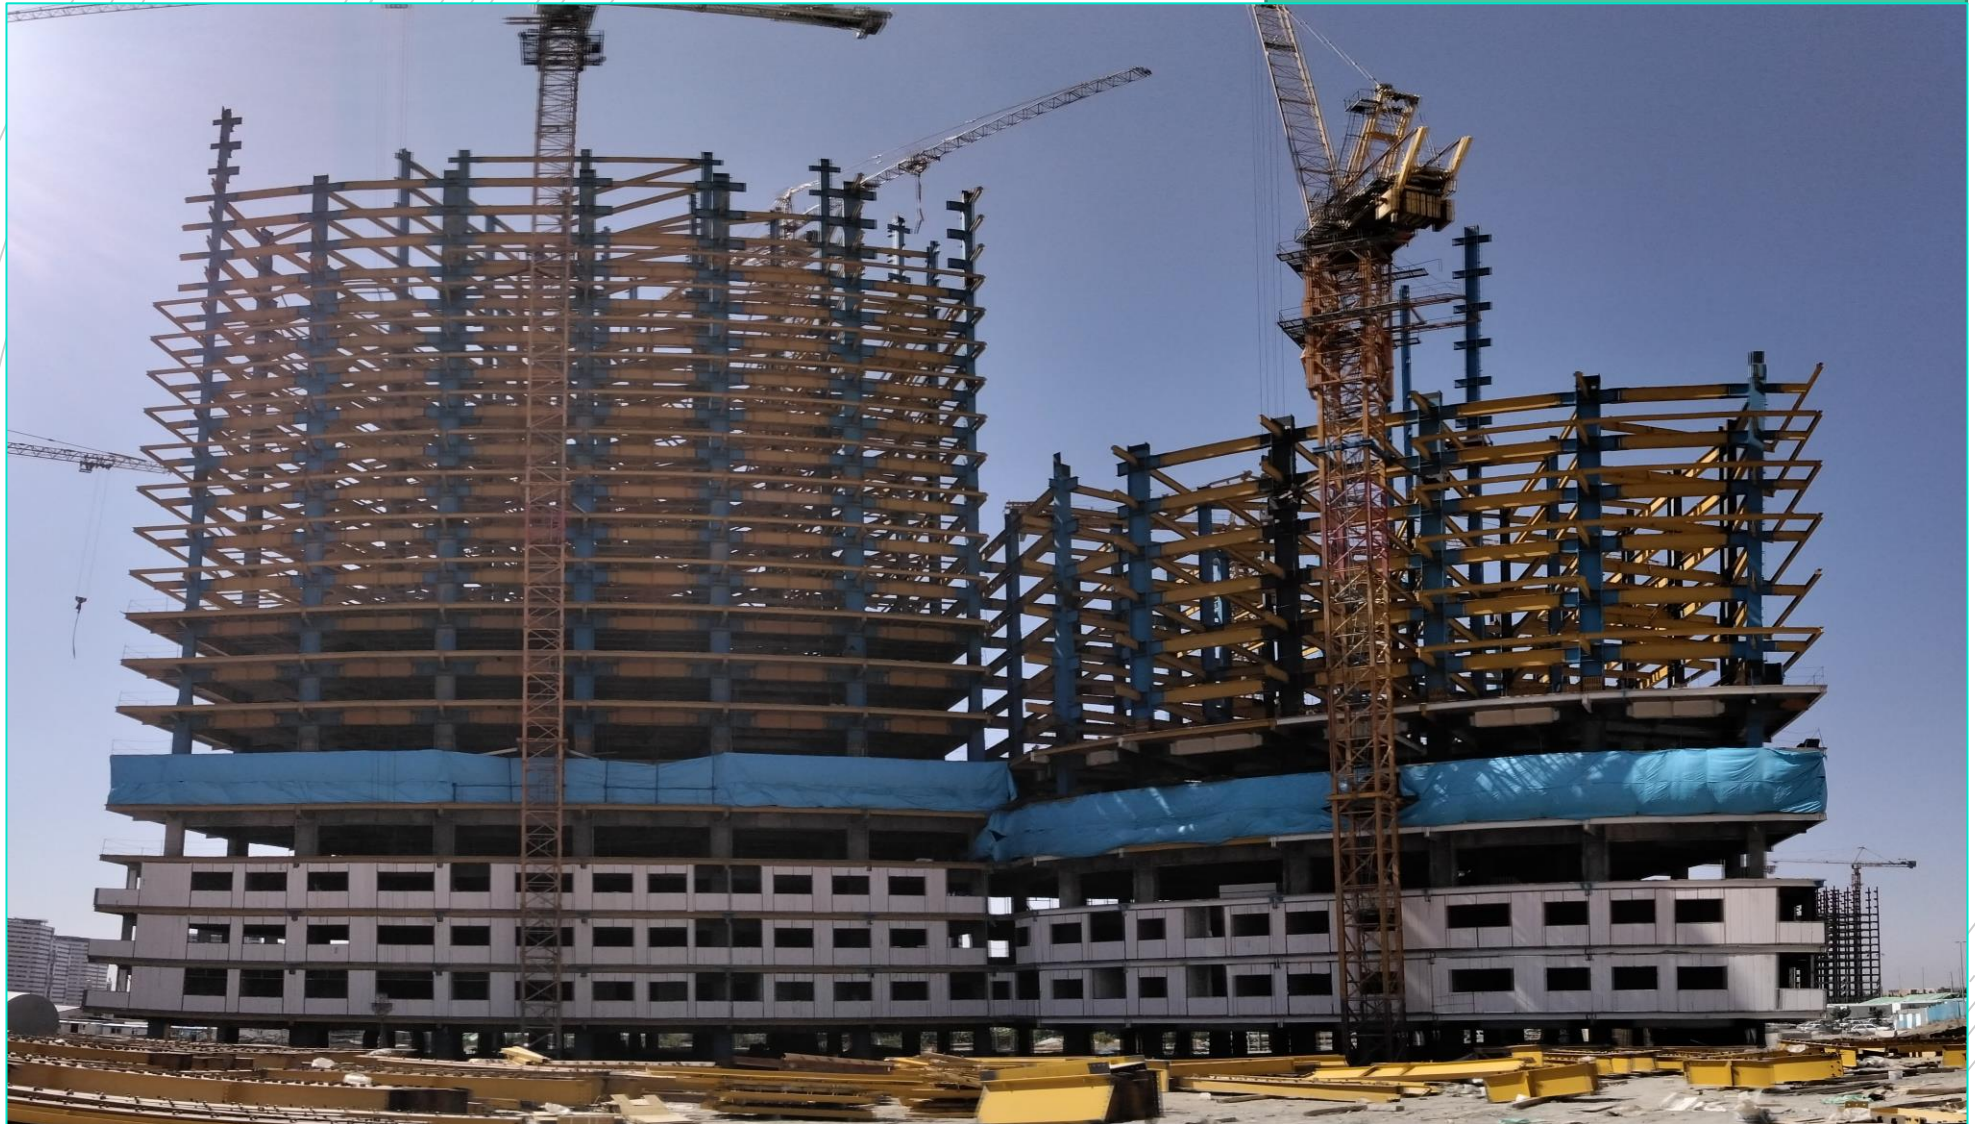


۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع  
شمال (۲)

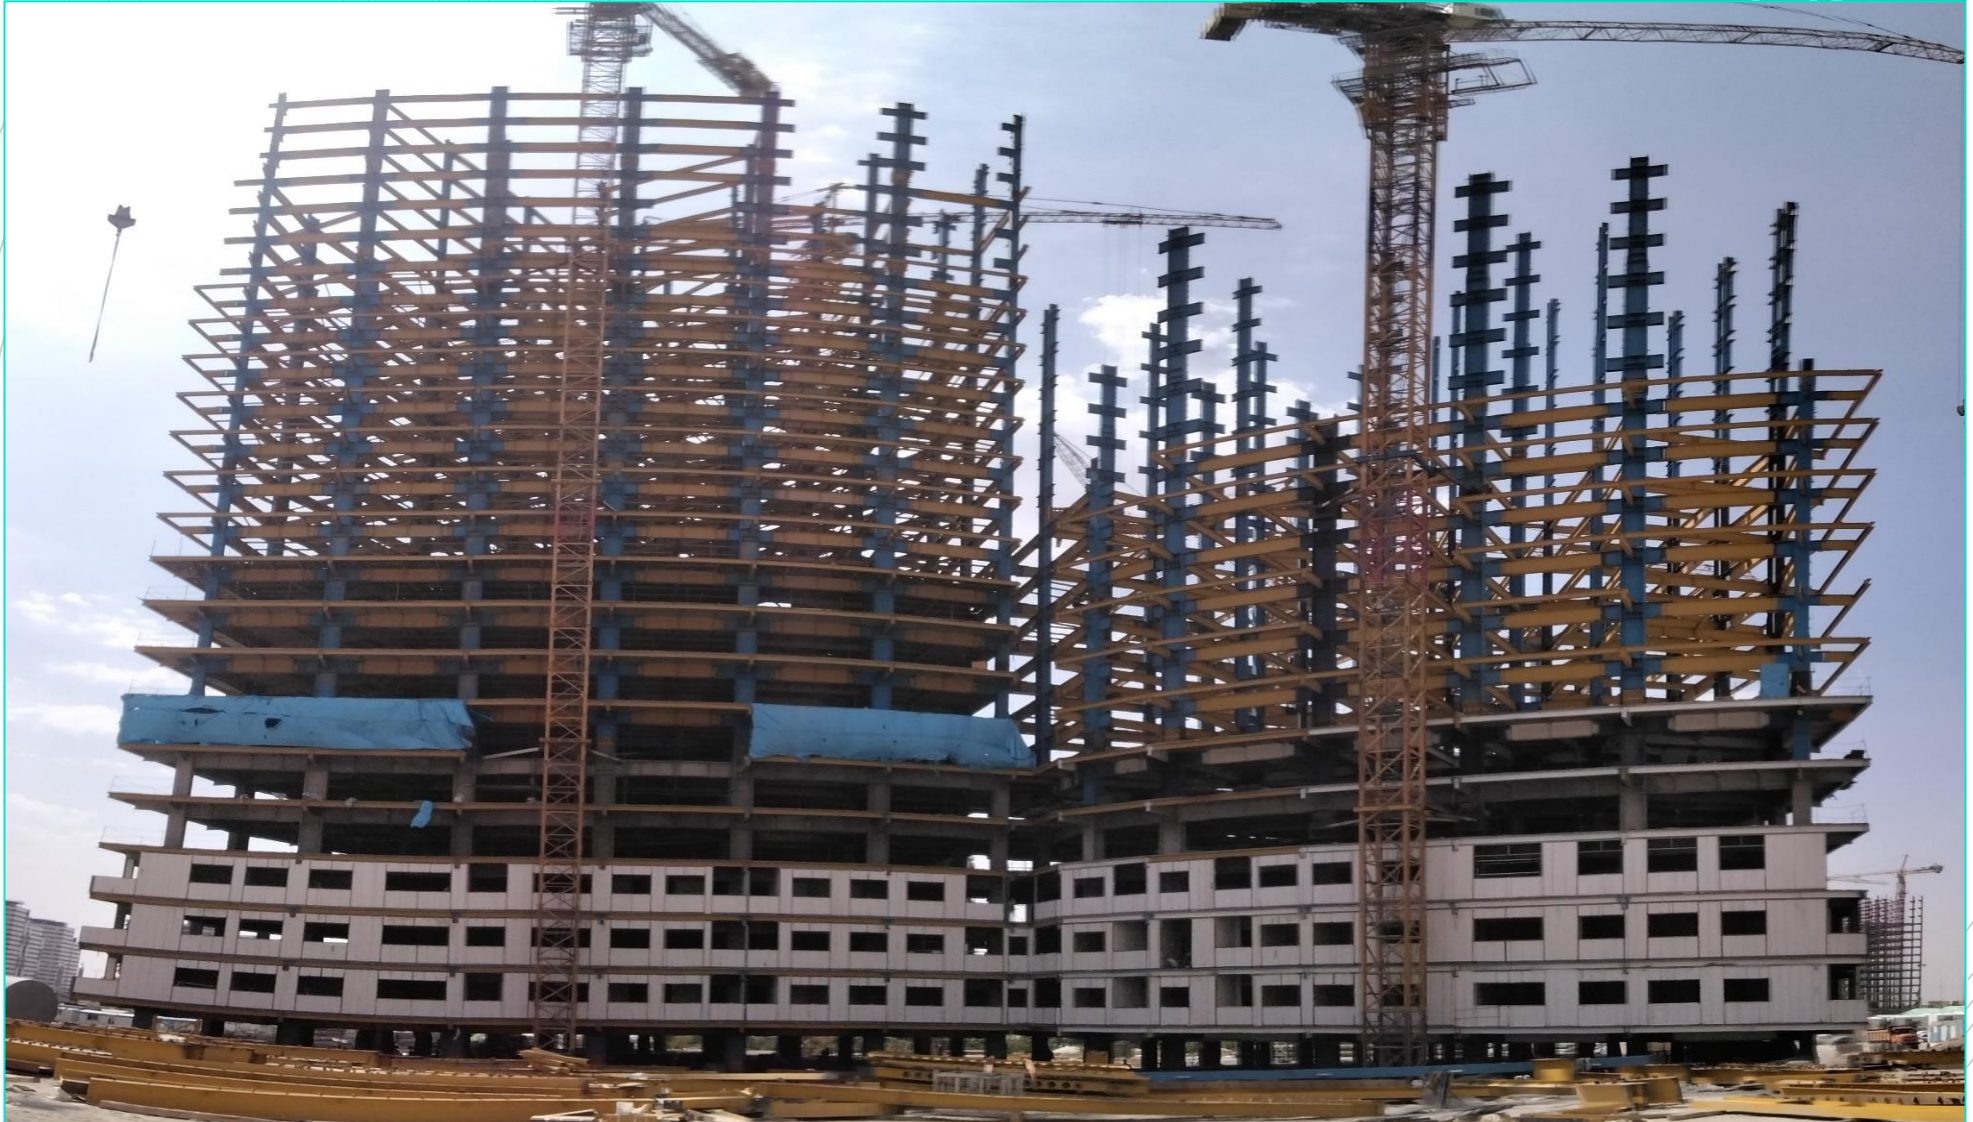

۱۴۰۱/۰۶/۱۷

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۳)

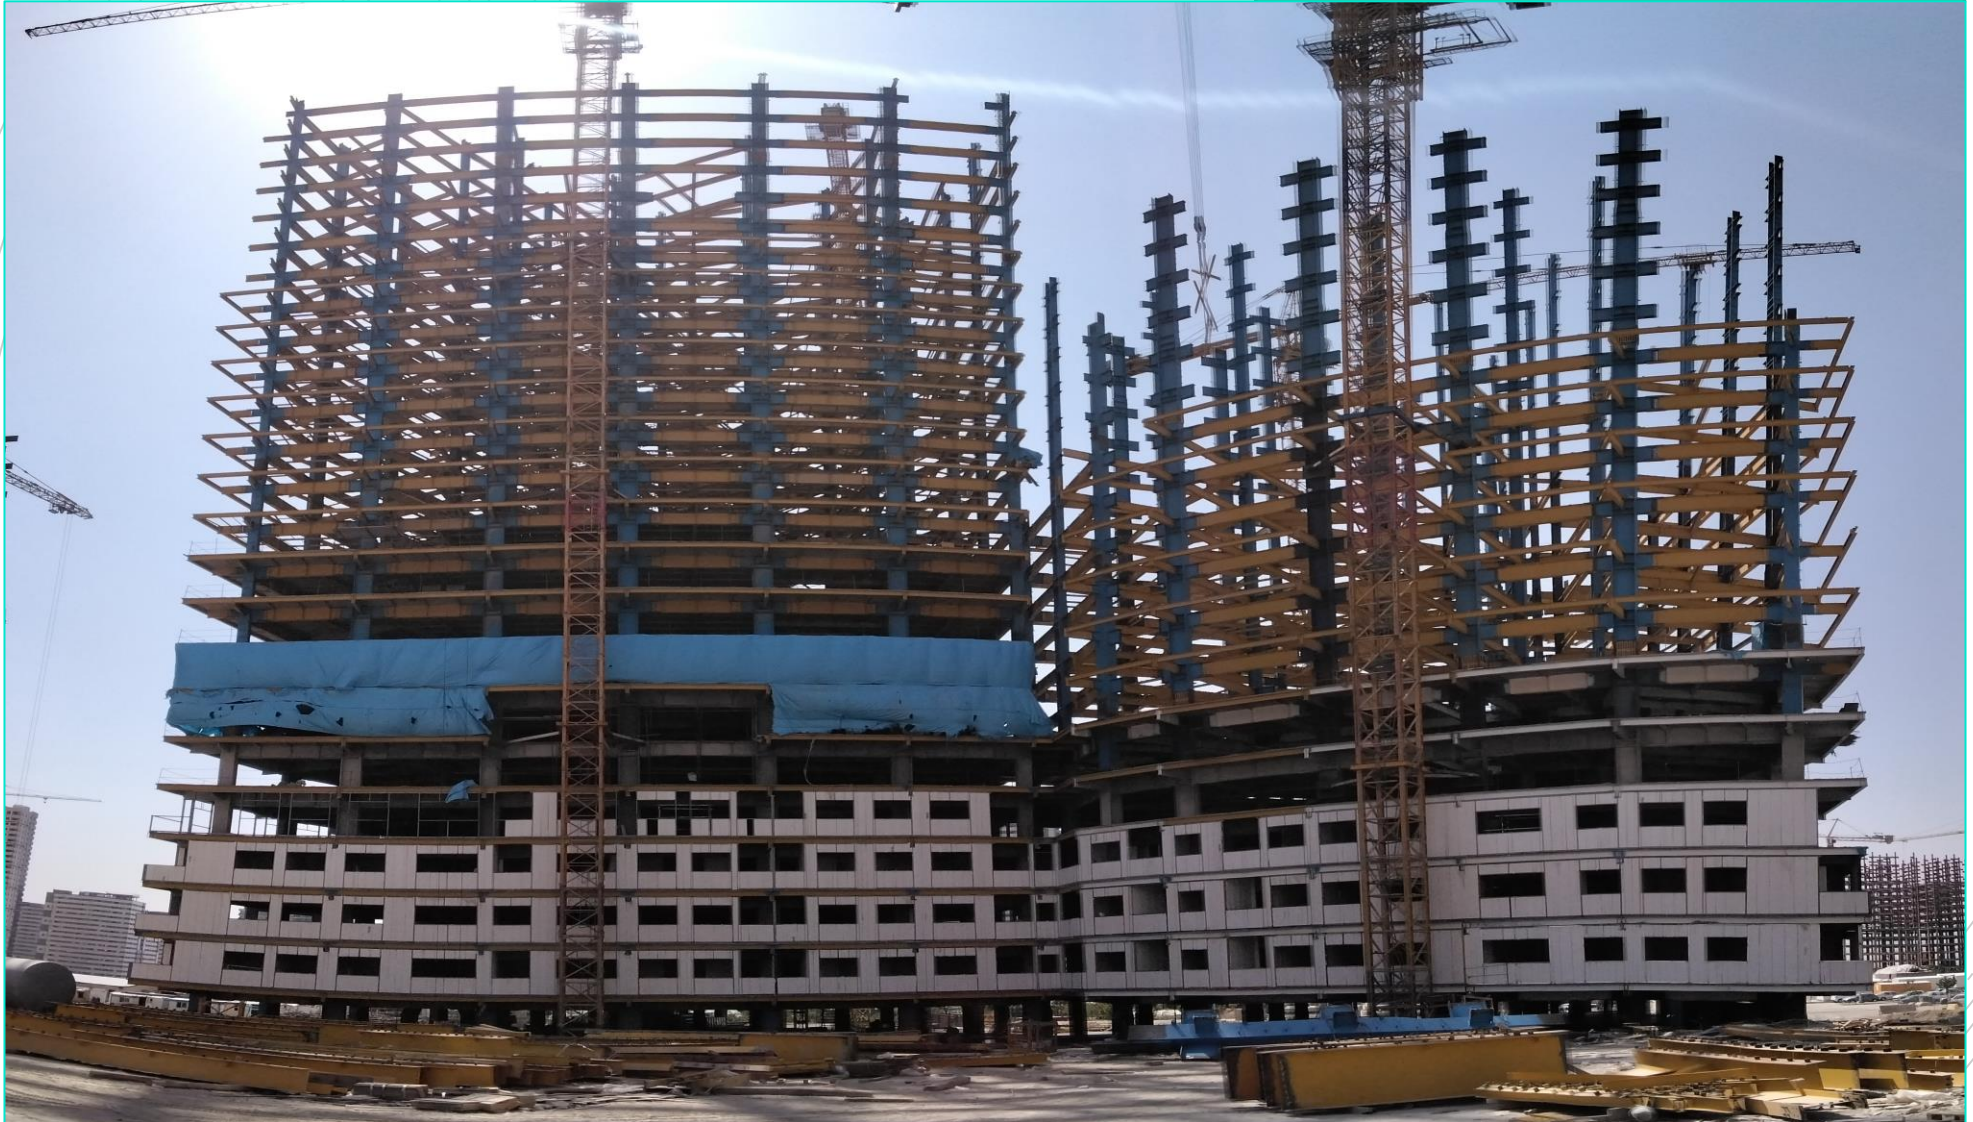

۱۴۰۱/۰۶/۳۱

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۶/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع  
جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۶/۱۷



تصویر نقطه ای ضلع  
جنوب (۳)



۱۴۰۱/۰۶/۳۱
