


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۶ الی ۲۱ مهر ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

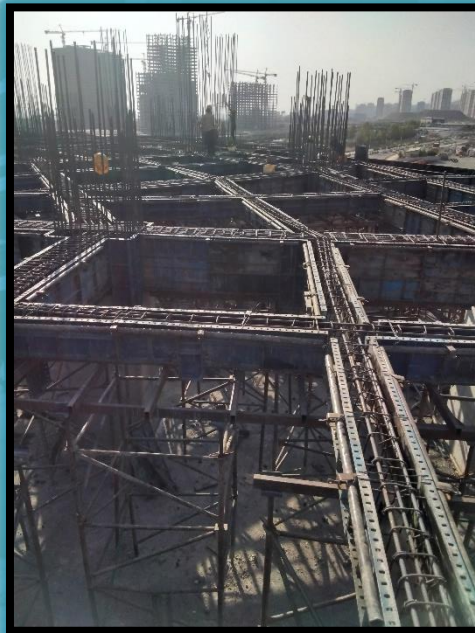

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۶
ضلع غربی

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف
طبقه +۷ ضلع شرقی (سطح طبقه +۸)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۵

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶ هسته
مرکزی

ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۷+ ضلع شرقی

□ قالب بندی ستون های طبقه
۷+ ضلع شرقی

□ بتن ریزی ستون های طبقه ۷+
ضلع شرقی

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۷+ هسته مرکزی

□ قالب بندی ستون های طبقه
۷+ هسته مرکزی




موتور خانه

❑ بتن ریزی فونداسیون موتورخانه

❑ آرماتور بندی ستون های موتور خانه

❑ آرماتور بندی دیوار غربی موتور خانه

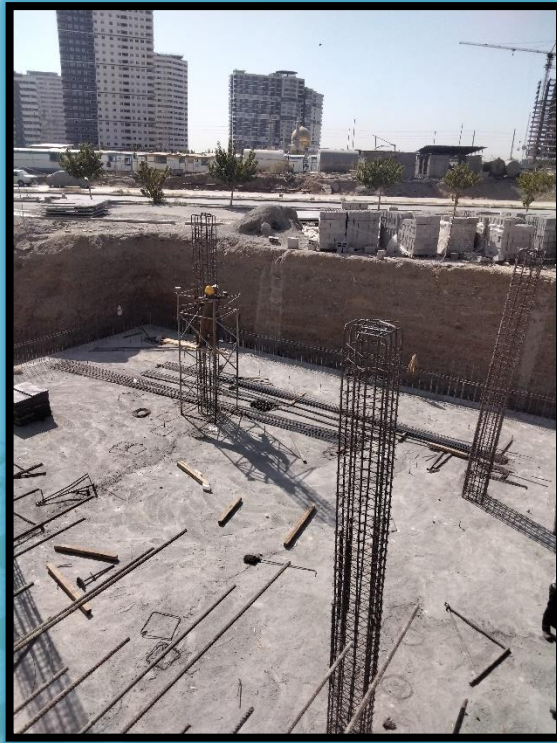

دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی
طبقه +۷ ضلع شرقی

□ قالب بندی دیوار برشی طبقه
+۷ ضلع شرقی

□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه
+۷

□ دکفراژ قالب دیوار بتن ریزی
شده



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۱۶

تصویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۰۷/۲۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۷/۱۹۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۰۷/۲۱
