



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(هفته سوم آبان ماه ۱۴۰۱)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر


## ستون ها

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۱+ زون ۳ (بال شرقی) برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۱+ (بال شرقی) زون ۳ برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+ زون ۱ (بال غربی) و زون ۲ (هسته مرکزی) برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۲+ زون ۱ (بال غربی) و زون ۲ (هسته مرکزی) برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی



## سقف و تیر سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۱ (بال غربی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۱ (بال غربی)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۳ (بال شرقی)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۲ (هسته مرکزی)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۲ (هسته مرکزی) و زون ۲ (بال شرقی)

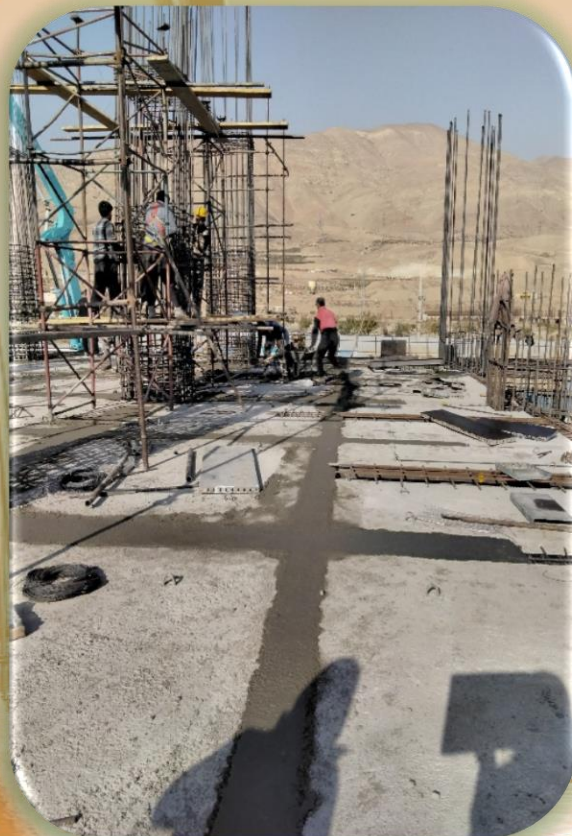


## پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۱+ (کف ۲+) زون ۲  
(هسته مرکزی) و زون ۳ (بال شرقی)



## دیوار برشی

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون
- ✓ کناری آن های طبقه ۱+ زون ۳ برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی و ستون کناری
- آن های طبقه ۱+ زون ۳ برج اصلی

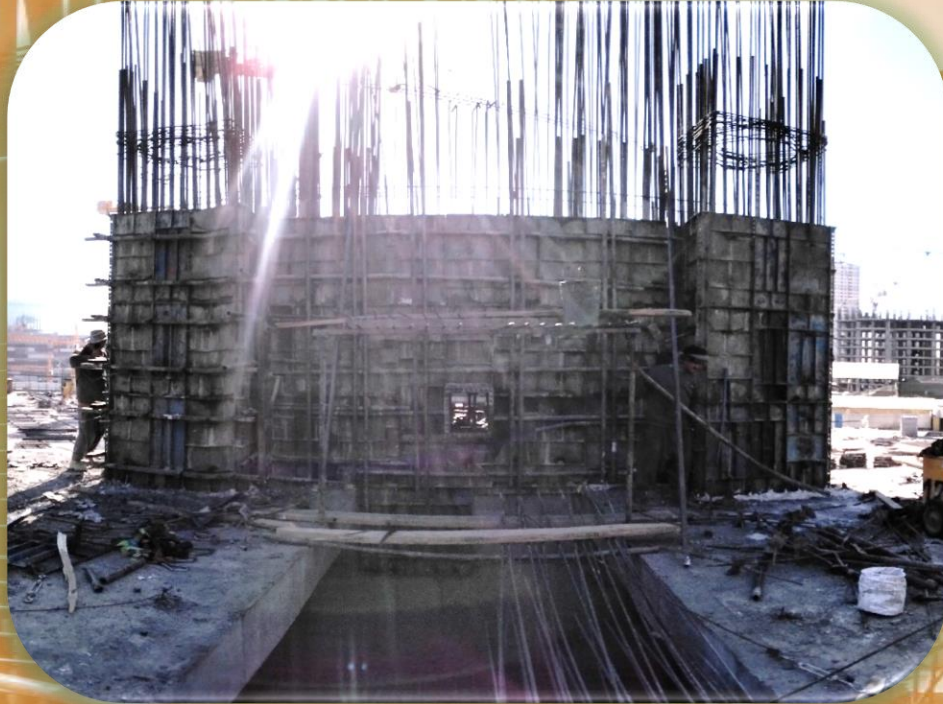


## راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۴ طبقه همکف به +۱
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۱ طبقه همکف به +۱



## انباری

- ❖ اجرای وال پست انباری های طبقه ۲-
- ❖ اجرای یک رگه چینی انباری های طبقه ۲-
- ❖ اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۲-

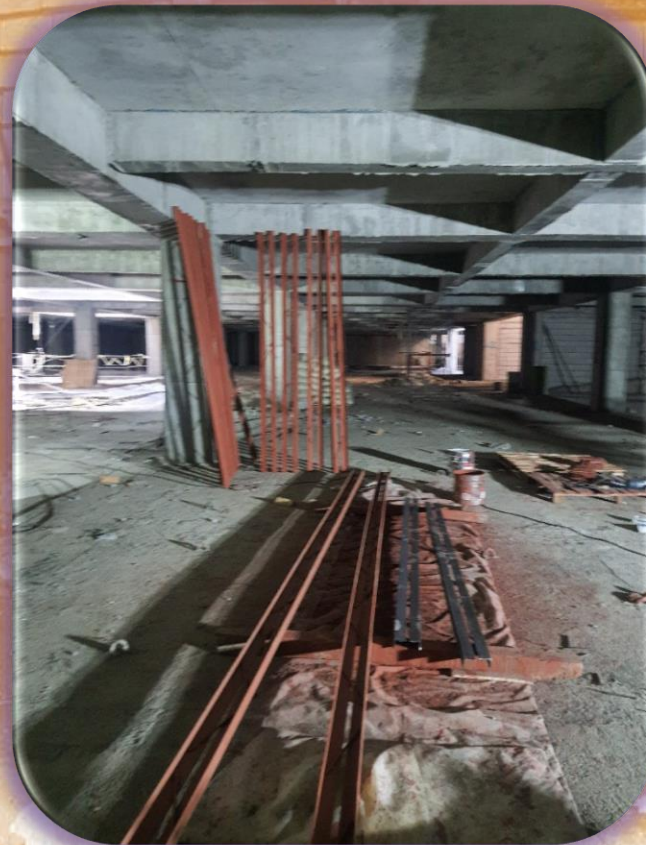

## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴



## تصویر نقطه ای ضلع شمال (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۱)



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

## تصویر نقطه ای ضلع جنوب (۲)



۱۴۰۱/۰۸/۱۹
