

گزارش ماهانه عملکرد بلوک N5
مهر ماه ۱۴۰۱

مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

دیوار برشی



❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ قالب بندی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع غربی

❖ قالب بندی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع غربی

❖ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۶ ضلع غربی

❖ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه +۷ ضلع شرقی



ستون ها



❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ ضلع غربی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۶ ضلع غربی

❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۶ ضلع غربی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ قالب بندی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی


❖ بتن ریزی ستون های طبقه +۶ ضلع شرقی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۷ ضلع شرقی

❖ آرماتور بندی ستون های طبقه +۷ ضلع غربی

❖ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده

سقف و تیر سقف

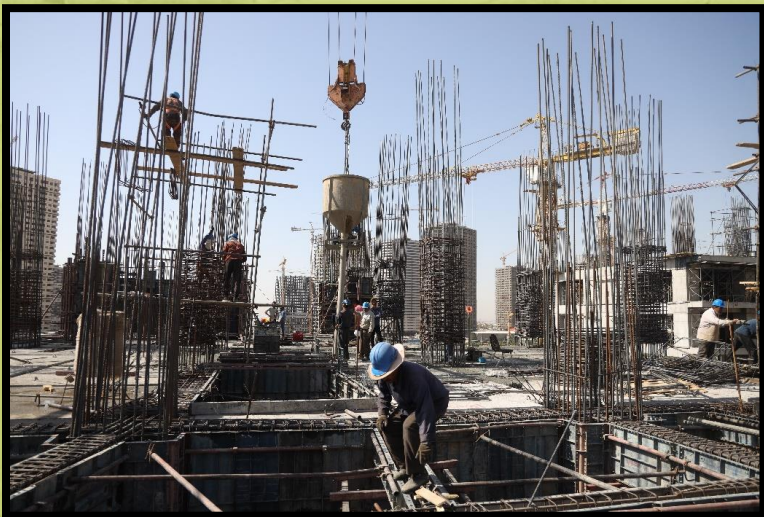

□ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۵ قسمت میانی برج

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۵ قسمت میانی برج

□ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۶ ضلع شرقی


□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶ ضلع شرقی (پارت اول)

□ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۶ ضلع غربی

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶ ضلع غربی (پارت اول)

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۴

□ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۵

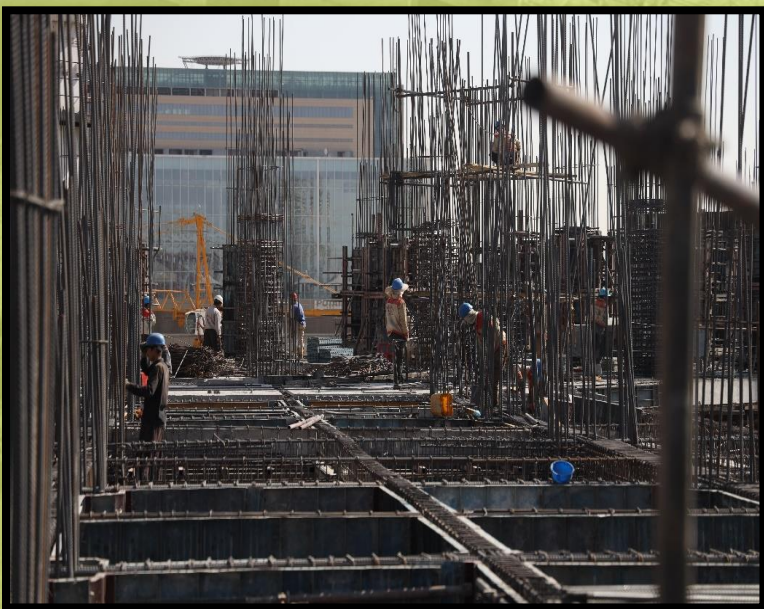

نصب پنل سقف

❖ نصب پنل سقف طبقه ۶ + ضلع شرقی

❖ نصب پنل سقف طبقه ۶ + ضلع غربی



راه پله

□ زیر سازی و آرماتور بندی راه
پله شماره ۱ طبقه ۵+ به ۶+

□ زیر سازی و آرماتور بندی راه
پله شماره ۴ طبقه ۵+ به ۶+

□ بتن ریزی راه پله شماره ۱
طبقه ۵+ به ۶+

□ بتن ریزی راه پله شماره ۳
طبقه ۵+ به ۶+



موتور خانه

❖ قالب بندی دیوار موتورخانه
ضلع غربی

❖ بتن ریزی دیوار موتورخانه ضلع
غربی

❖ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر
سقف موتور خانه

❖ بتن ریزی ستون های موتور خانه

❖ قالب بندی تیر سقف موتور خانه



انباری

❖ دیوار چینی انباری های طبقه
-۲


❖ جوشکاری و نصب والپست انباری
های -۱

❖ دیوار چینی انباری های -۱



چاه ارت

❖ اجرای چاه ارت طبقه ۶-

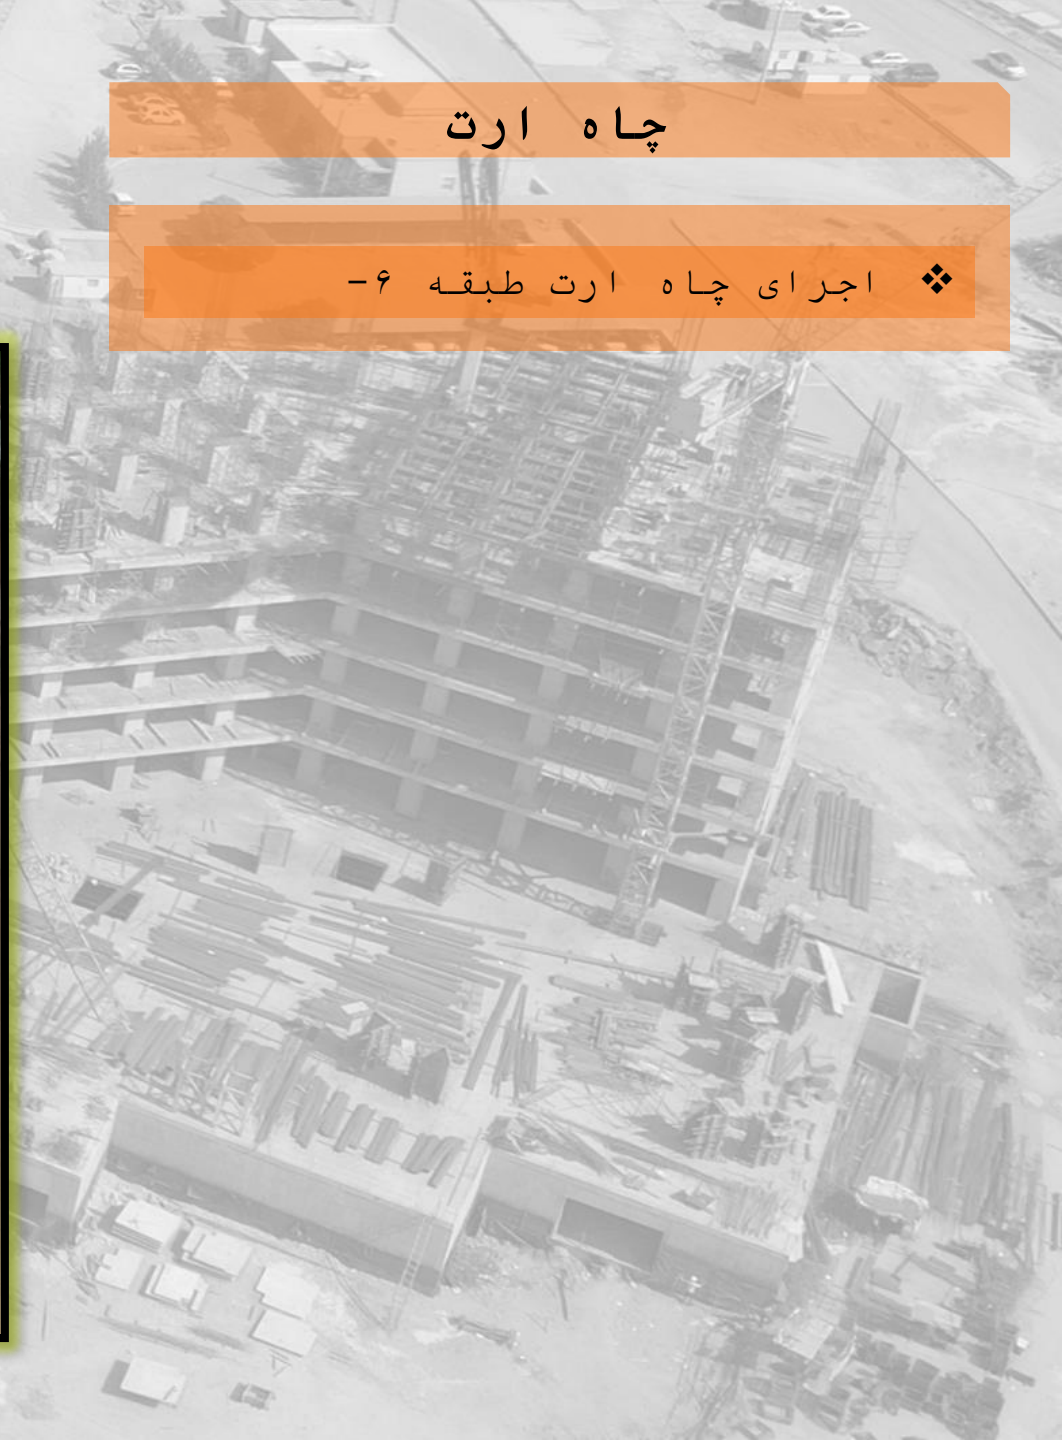

رمپ

❖ اجرای زیر سازی و پلت فرم رمپ جنوبی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تساویر مقایسه ای ضلع شمالی

آرما تور بندی ستون های طبقه ۶+ قسمت میانی برج

آرما تور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه ۶+ ضلع شرقی

۱۴۰۱/۰۷/۲۸

زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۶+ قسمت میانی برج


نصب پنل سقف طبقه ۶+ ضلع شرقی
آرما تور بندی ستون های طبقه ۷+ ضلع شرقی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تساویر مقایسه ای ضلع شمال غربی

زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۵
ضلع غربی (سطح طبقه +۶)

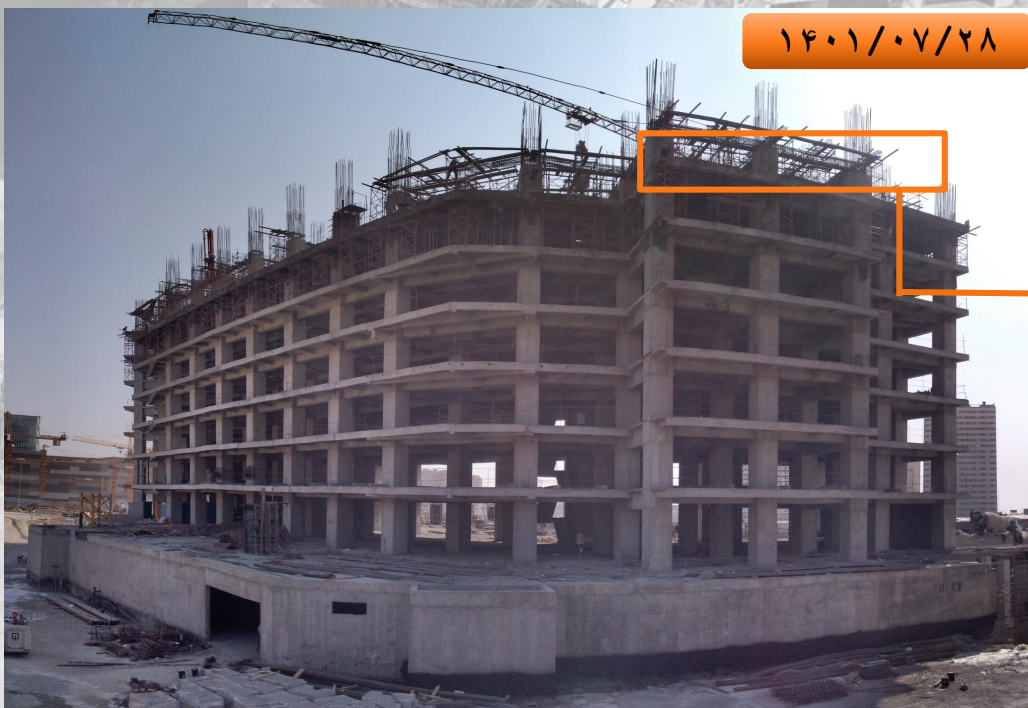

۱۴۰۱/۰۷/۲۸

زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۶
ضلع غربی (سطح طبقه +۷)
نصب پنل سقف طبقه +۶ ضلع غربی

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تساویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸

تساویر نقطه ای ضلع شمال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۰۲

تساویر نقطه ای ضلع شمال غربی



۱۴۰۱/۰۷/۲۸
