



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5 (۱۴ الی ۱۹ آبان ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف



□ آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۶ قسمت میانی برج

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۶ قسمت میانی برج

□ آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه +۷ ضلع شرقی

□ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷ ضلع شرقی (پارت اول)

□ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۷ ضلع غربی

□ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه +۷ قسمت میانی برج (پارت اول)

□ دکفراژ اسکافلد سقف +۶

نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۶ + قسمت
میانی برج

□ نصب پنل سقف طبقه ۷ + ضلع
شرقی (پارت دوم)



ستون


□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ ضلع شرقی

□ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ ضلع شرقی

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۷+ قسمت میانی برج

□ قالب بندی ستون های طبقه
۷+ قسمت میانی برج

□ بتن ریزی ستون های طبقه ۷+
قسمت میانی برج

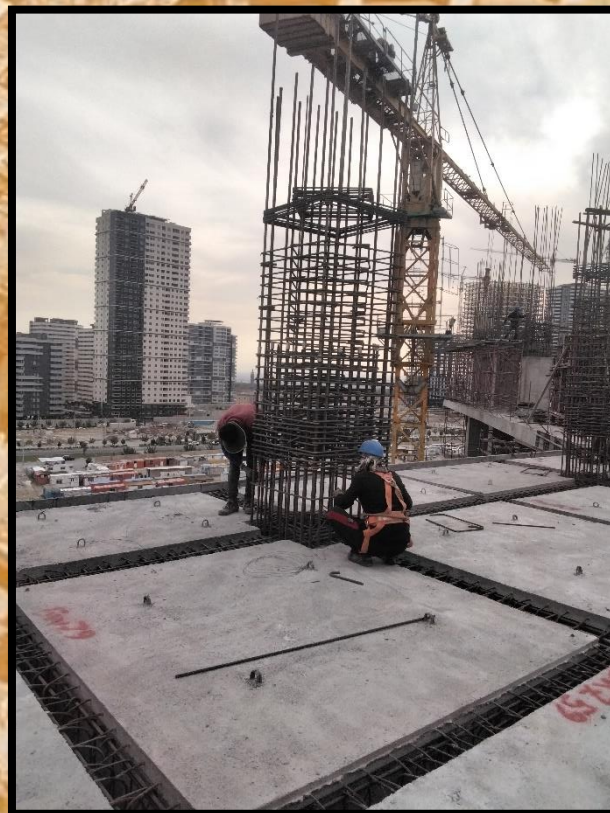

انباری

❑ دیوار چینی انباری های ۱-

❑ جوشکاری و نصب والپست انباری
های ۱-



راه پله

□ زیر سازی راه پله شماره ۱
طبقه +۷ به +۸

□ بتن ریزی راه پله شماره ۱
طبقه +۷ به +۸

□ بتن ریزی راه پله شماره ۴
طبقه +۶ به +۷



دیوار برشی

□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه +۷ ضلع غربی

□ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه +۸ ضلع شرقی



موتور خانه

□ زیر سازی و اسکافلد گذاری
تیر سقف موتور خانه (پارت
دوم)



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۸/۱۹

تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی



۱۴۰۱/۰۸/۱۴

تصویر نقطه ای ضلع شمالی غربی



۱۴۰۱/۰۸/۱۹
