



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D2

(آذرماه ۱۴۰۱)

مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

اجرای سقف

□ آرماتوربندی، بتن ریزی سقف ۱۱+ بال

شرقی

□ آرماتوربندی، بتن ریزی سقف ۱۴+ بال

غربی

□ قالب بندی، آرماتوربندی، بتن ریزی بازشوی

طبقه همکف بال شرقی



نصب تیر و ستون

- نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی
- نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی




اجرای واحدهای مسکونی

- تیغه چینی واحدهای طبقه ۳، ۴ + بال شرقی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۴ + بال شرقی
- اجرای تیغه چینی واحدهای طبقه ۱، ۲ + بال غربی




تاسیسات

- ساخت کلاف بازشوهای تاسیساتی و اجرای آن در طبقه ۲، ۳+بال شرقی
- ساخت ساپورت لوله های سقفی و اجرای آن در طبقه ۱، ۲+بال شرقی
- اجرای لوله های تاسیساتی واحدهای طبقه ۱، ۲+بال شرقی
- اجرای لوله های تاسیساتی سرویس بهداشتی های طبقه ۲+بال شرقی

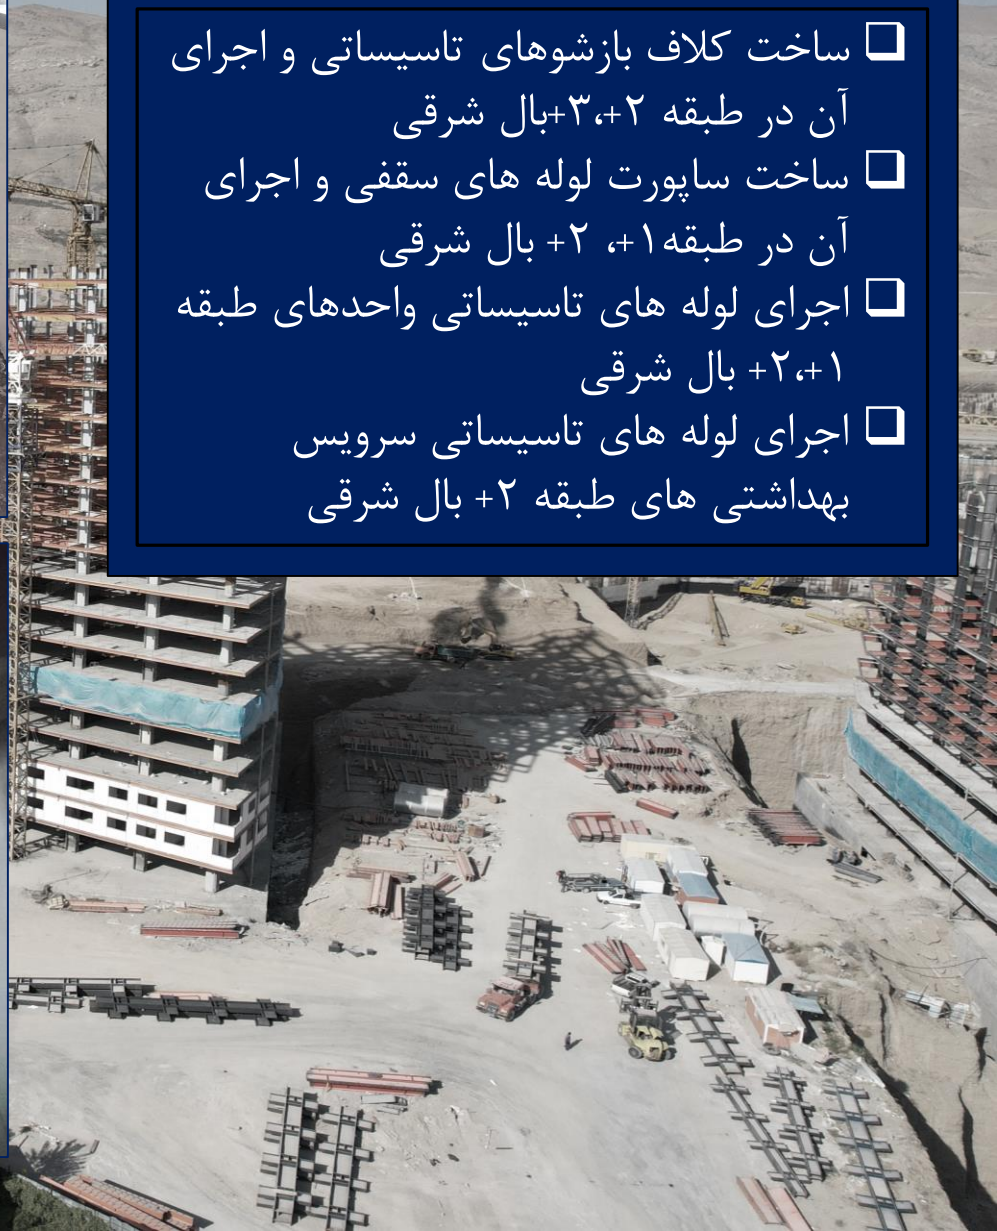

پارکینگ الحاقی

- ❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه ۵، ۶- بال شرقی
- ❑ کروم بندی جهت شروع بتن مگر پارکینگ الحاقی
- ❑ برشکاری محل بازشوی دیوار حایل شمالی طبقه ۵، ۶- بال غربی
- ❑ بتن ریزی مگر پارکینگ الحاقی
- ❑ کیورینگ بتن مگر پارکینگ الحاقی
- ❑ اجرای آرماتوربندی فونداسیون پارکینگ الحاقی

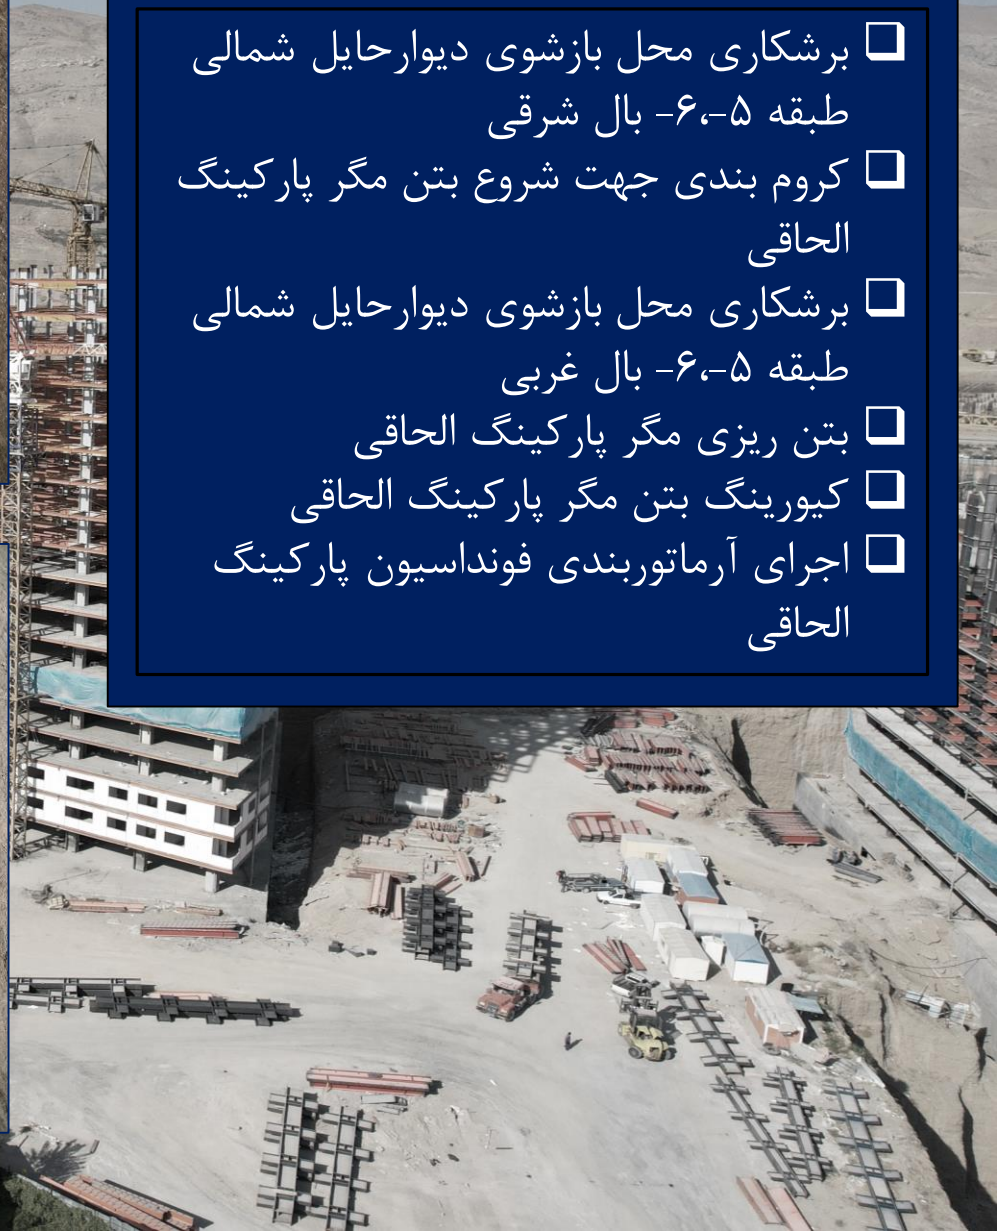

انباری ها

- اجرای قرنیز انباری های طبقه ۲، ۴، ۵-۴-
- اجرای پلاستر انباری ها طبقه ۲، ۴، ۵-
- نصب رابیتس انباری های طبقه ۲-
- اجرای سرامیک دیوارهای خارجی انباری های طبقه ۵-
- اجرای تیغه چینی انباری های طبقه ۶-



تخلیه بار

ورود و تخلیه آجر در محل پروژه



تصاویر مقایسه ای ضلع شرق بال شرقی

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰


شروع نصب ستون های استیج چهارم بال شرقی



تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال
غربی، نصب ستون های استیج چهارم بال
غربی

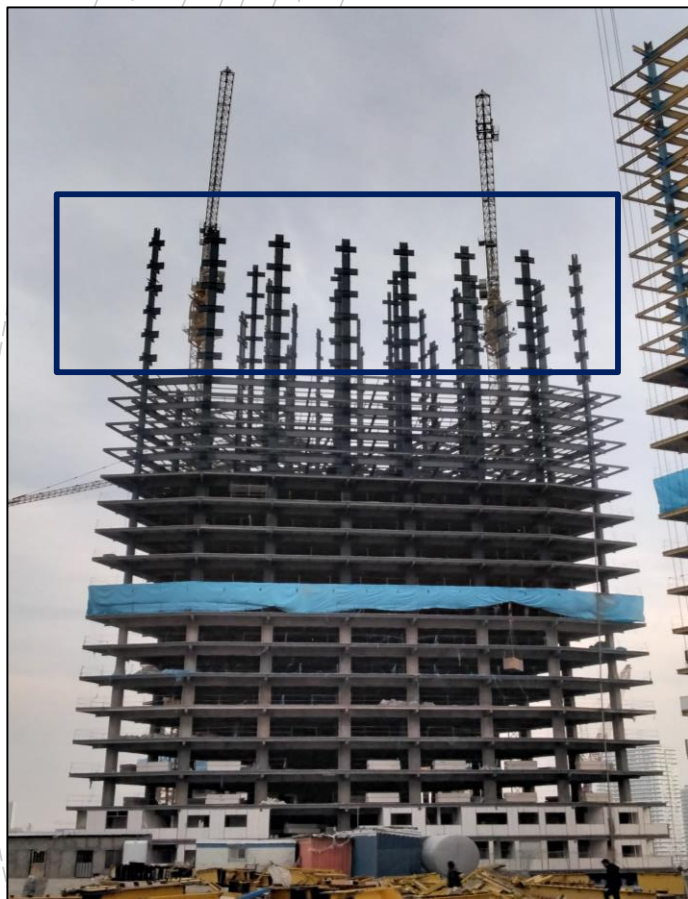

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اتمام نصب ستون های استیج چهارم بال
غربی



تصاویر مقایسه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

نصب ستون های استیج چهارم بال غربی، ادامه
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال
شرقی، آرماتوربندی سقف ۱۴+ بال غربی، اجرای
آرماتوربندی سقف ۱۱+ بال شرقی، ادامه نصب پنل
های پیش ساخته طبقه ۳+ بال شرقی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰


اتمام ستون های استیج چهارم بال غربی، نصب
ستون های استیج چهارم بال شرقی، اجرای سقف
۱۴+ بال غربی، اجرای سقف ۱۱+ بال شرقی، نصب
پنل های پیش ساخته طبقه ۴+ بال شرقی

تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

نصب ستون های استیج چهارم بال غربی، ادامه
نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال
شرقی، ارماتوربندی سقف ۱۴+ بال غربی، اجرای
آرماتوربندی سقف ۱۱+ بال شرقی، ادامه نصب پنل
های پیش ساخته طبقه ۳+ بال شرقی

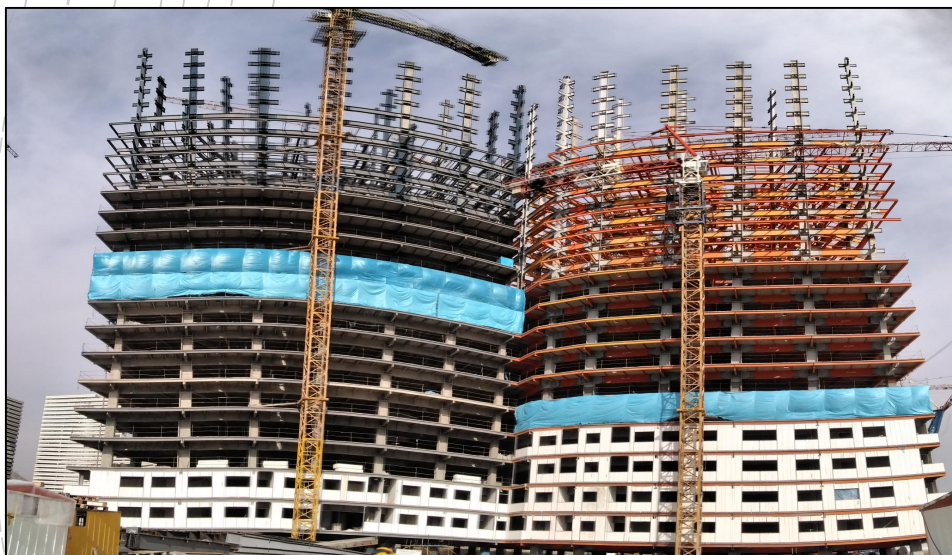

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

اتمام ستون های استیج چهارم بال غربی، نصب
ستون های استیج چهارم بال شرقی، اجرای سقف
۱۴+ بال غربی، اجرای سقف ۱۱+ بال شرقی، نصب
پنل های پیش ساخته طبقه ۴+ بال شرقی

ضلع شمال
تصویر (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

ضلع شمال
تصویر (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

ضلع شمال
تصویر (۳)



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

ضلع جنوب
تصویر (۱)



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

ضلع جنوب
تصویر (۲)



۱۴۰۱/۰۹/۱۹

ضلع جنوب
تصویر (۳)



۱۴۰۱/۰۹/۳۰
