


گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N3

(پنجم الی دهم آذر ماه)

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف

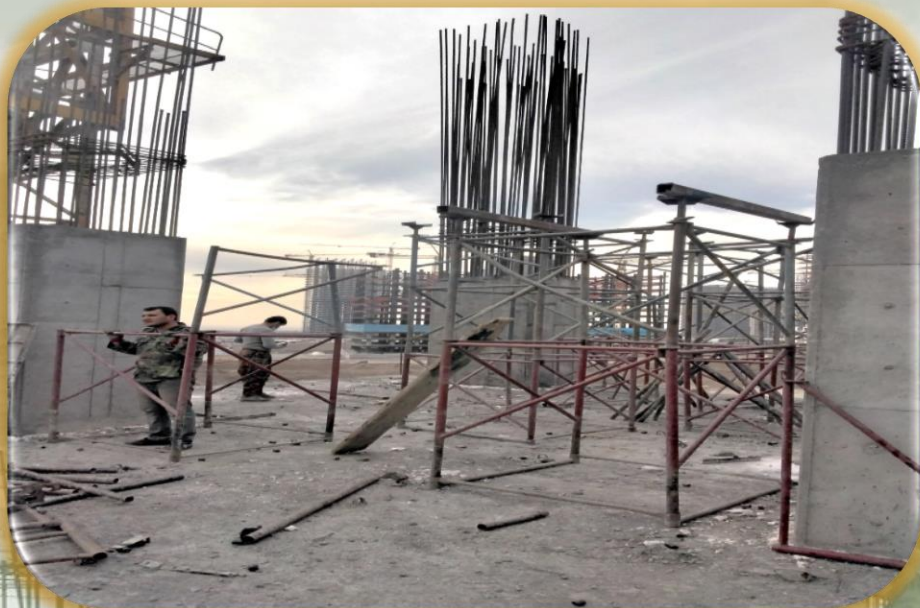


اجرای اسکافلد سقف طبقه ۳ (+ کف ۴)

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳ (+ کف ۴) زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۲ (+ کف ۳) زون ۲ هسته مرکزی و زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲ (+ کف ۳) زون ۲ هسته مرکزی و زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۲ (+ کف ۳) زون ۲ هسته مرکزی برج اصلی



دیوار های برشی



- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های طبقه ۳+ ضلع غربی (زون ۱) برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی و ستون های طبقه ۳+ ضلع غربی (زون ۱) برج اصلی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های کنار آن طبقه ۲+ ضلع شرقی زون ۳ برج اصلی
- ✓ بتن ریزی دیوار برشی و ستون های کنار آن طبقه ۲+ ضلع شرقی زون ۳ برج اصلی

نصب پنل

✓ نصب پنل سقف طبقه ۲+ (کف ۳+) زون ۲ (هسته مرکزی) برج اصلی



ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۳+ زون ۱ بال غربی برج اصلی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۲+ زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ ستون های طبقه ۲+ زون ۳ بال شرقی برج اصلی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های برج اصلی



انباری

- ❖ اجرای وال پست انباری های طبقه ۲- و ۳-
- ❖ اجرای دیوار چینی انباری های طبقه ۲- و ۳-
- ❖ ساخت وال پست انباری ها



راه پله

- ✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۳ طبقه +۱ به +۲
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۳ طبقه +۱ به +۲



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹
