

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N4

(۱۲ الی ۱۷ آذر ماه)



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# سقف



- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) بال غربی
- ✓ بتن ریزی پارت پایانی سقف طبقه ۲+ (سطح ۳+)





# ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه ۴+ بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۳+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۳+ بال غربی
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه ۳+ بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های





# انباری

❖ اجرای وال پست انباری های طبقه ۱-





# راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال شرقی  
طبقه ۳ به ۴+

✓ قالب بندی و آرماتوربندی راه پله هسته مرکزی طبقه  
۴ به ۵+

✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال غربی  
طبقه ۲ به ۳+

✓ بتن ریزی راه پله بال غربی طبقه ۲ به ۳+





# موتورخانه


- ✓ اجرای آرماتوربندی دیوار ضلع غربی موتورخانه
- ✓ دکفراژ قالب ضلع جنوبی دیوار موتورخانه





# کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه آرماتوربندی تیر طبقه ۴+

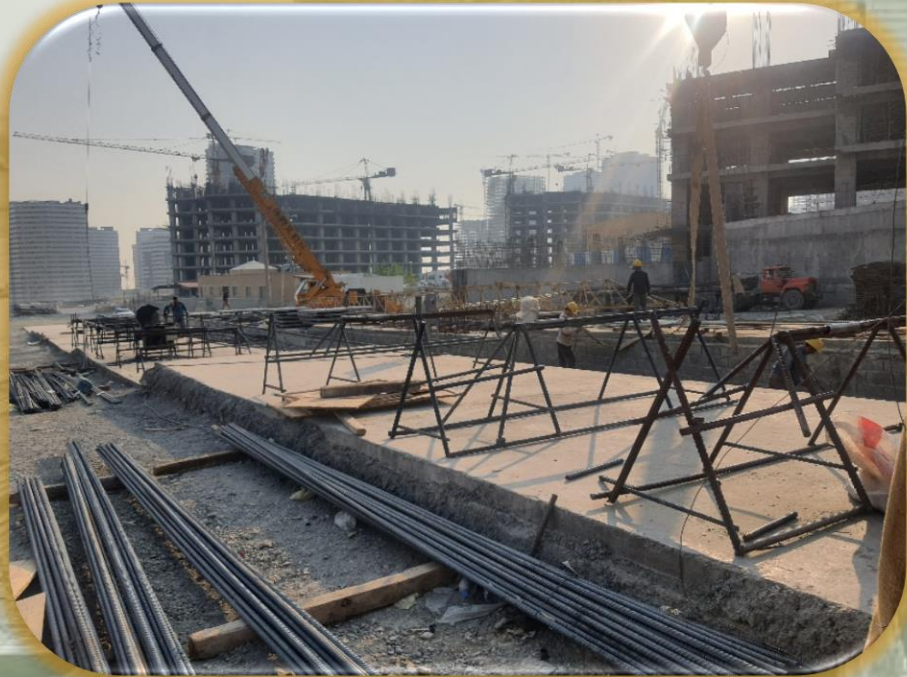



# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲



# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲



# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۲



# تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۷
