

گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(پنجم الی دهم آذر ماه)



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

سقف


❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر
سقف طبقه +۸ قسمت میانی برج

❑ آرماتور بندی و قالب بندی
تیر سقف طبقه +۸ بال شرقی

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۷
بال غربی (پارت اول)

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه +۸
بال شرقی (پارت اول)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷

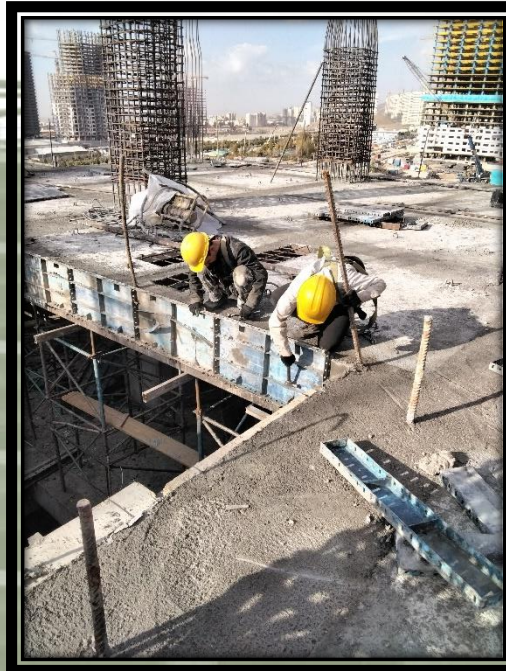

نصب پنل

□ نصب پنل سقف طبقه ۸+ بال شرقی



ستون

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ قسمت میانی برج

□ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ قسمت میانی برج




□ بتن ریزی ستون های طبقه ۸+
قسمت میانی برج

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۸+ بال غربی (پارت
اول)

□ قالب بندی ستون های طبقه
۸+ بال غربی (پارت اول)

□ آرماتور بندی ستون های
طبقه ۹+ بال شرقی (پارت
اول)


□ دکفراژ قالب ستون های بتن
ریزی شده

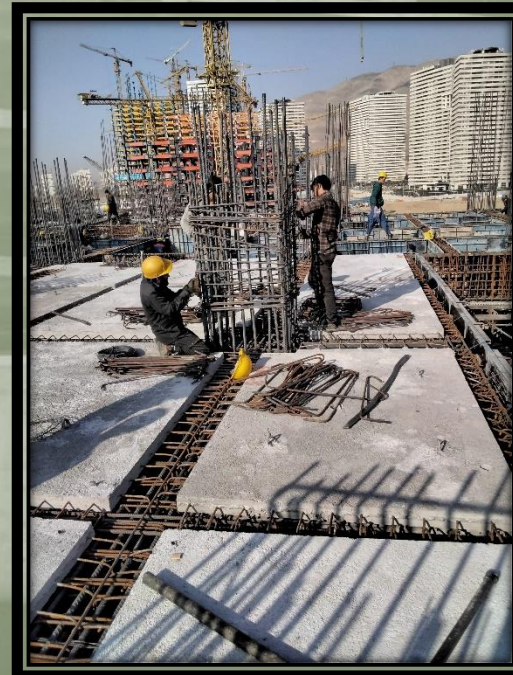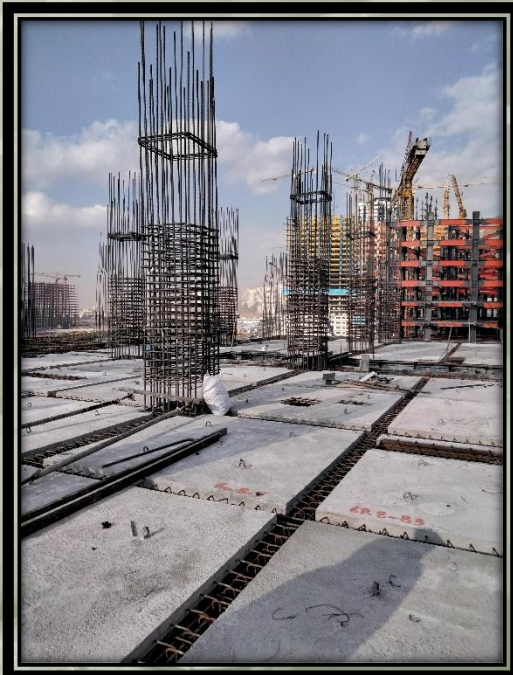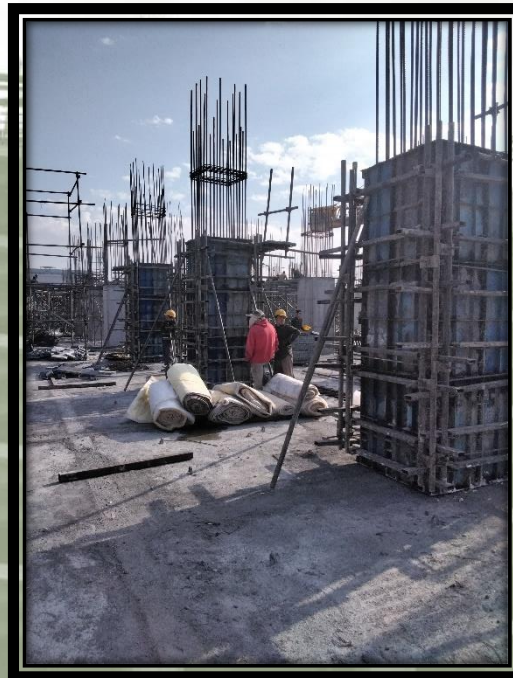

انباری

□ جوشکاری و نصب والپست انباری
های طبقه ۳-

□ دیوار چینی انباری های طبقه
۳-

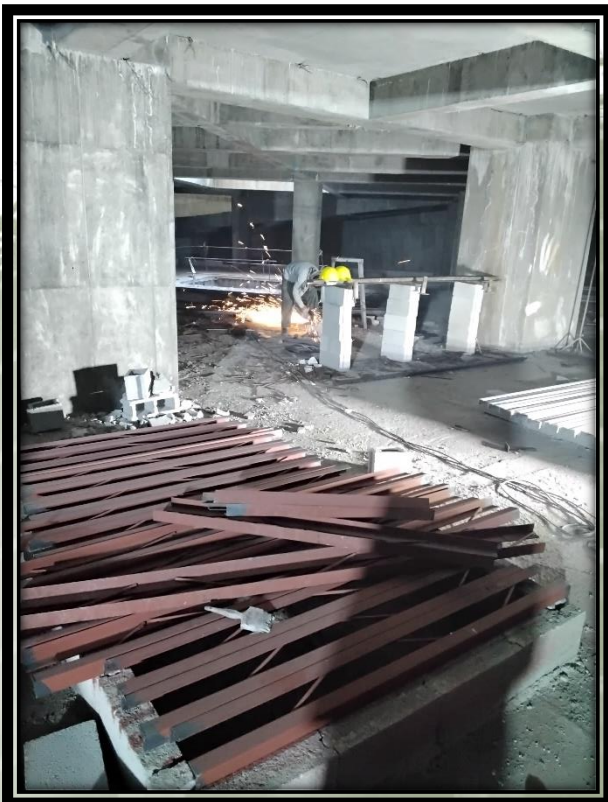

راه پله

□ آرماتور بندی راه پله شماره ۴
طبقه +۶ به +۷

□ آرماتور بندی راه پله شماره ۱
طبقه +۷ به +۸

□ دکفراژ قالب راه پله های بتن
ریزی شده



تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۹
