



گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5 (دهم الی پانزدهم دی ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

- آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۸ بال شرقی

- قالب بندی تیر سقف طبقه +۸ بال شرقی

- بتن ریزی تیر سقف طبقه +۸ بال شرقی (پارت اول)

- آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۸ قسمت میانی برج


- قالب بندی تیر سقف طبقه +۸ قسمت میانی برج (پارت اول)

- دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷



اجرای نصب پنل

- نصب پنل سقف طبقه +۸ بال شرقی (سطح طبقه +۹)

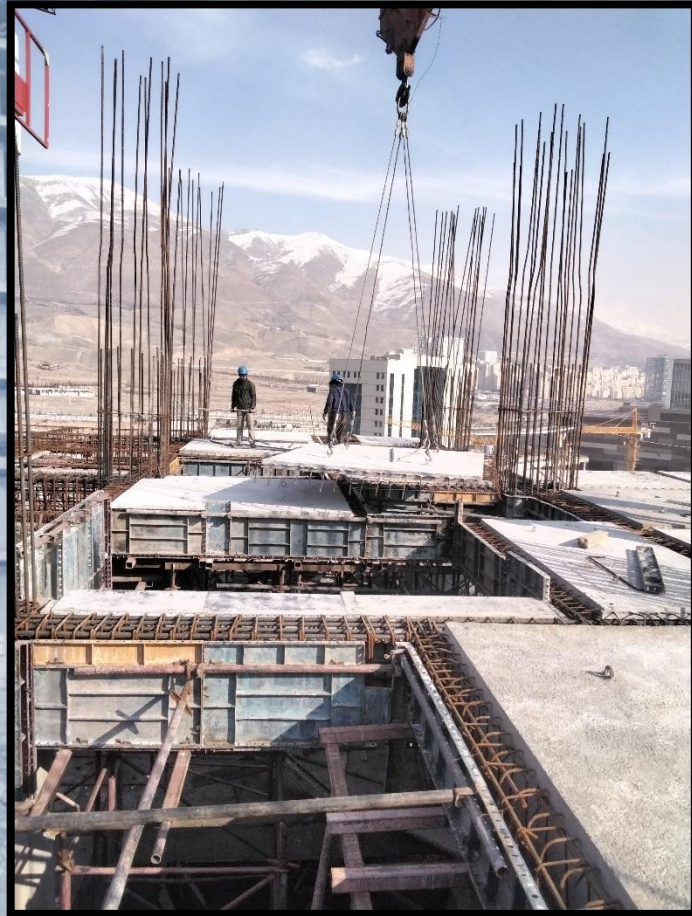

اجرای ستون

- آرماتور بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- قالب بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- بتن ریزی ستون های طبقه ۸+ بال غربی
- آرماتور بندی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج
- قالب بندی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج
- بتن ریزی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج
- آرماتور بندی ستون ها طبقه ۹+ بال شرقی
- دکفراژ ستون های بتن ریزی شده



انباری

▪ دیوار چینی انباری های ۱-



راه پله

- آرماتور بندی راه پله شماره یک طبقه ۸ به ۹ +

- بتن ریزی راه پله شماره یک طبقه ۸ به ۹ +

- آرماتور بندی راه پله شماره دو طبقه ۷ به ۸ +



تصاویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۱۰/۱۵

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۱۰/۱۵
