



گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6 (دهم الی پانزدهم دی ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

آرماتور بندی و قالب بندی تیر
سقف طبقه +۹ بال شرقی

زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر
سقف طبقه +۹ قسمت میانی برج

آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۸
بال غربی (پارت آخر)


بتن ریزی تیر سقف طبقه +۸
قسمت میانی برج

دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۸



نصب پنل

- نصب پنل سقف طبقه +۹
(سطح طبقه +۱۰)

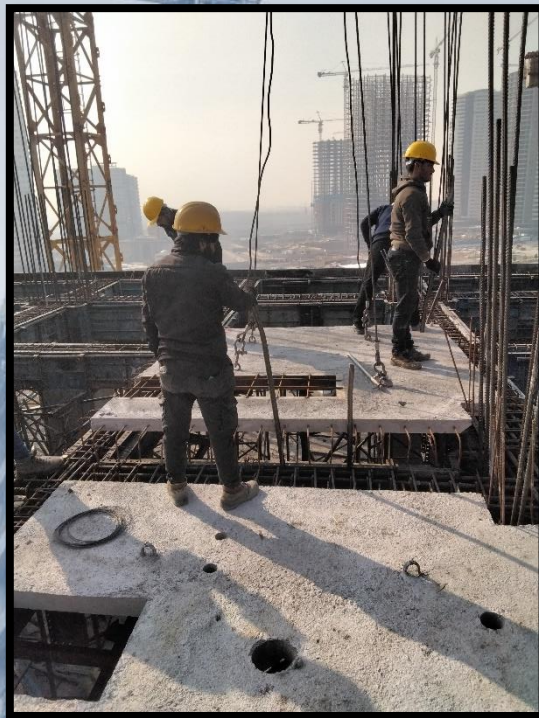

اجرای ستون



- آرماتور بندی ستون های طبقه +۹ قسمت میانی برج
- قالب بندی ستون های طبقه +۹ قسمت میانی برج
- بتن ریزی ستون های طبقه +۹ قسمت میانی برج
- آرماتور بندی ستون های طبقه +۸ بال غربی
- قالب بندی ستون های +۸ بال غربی
- بتن ریزی ستون های طبقه +۸ بال غربی (اتمام ستون های طبقه هشتم)
- دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده

راه پله

- آرماتور بندی راه پله شماره دو طبقه +۵ به +۶



خم و برش

■ خم و برش میلگرد



تساویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

تساویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۱۵

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۱۰/۱۰

تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۱۰/۱۵
