



شرکت  
عمران  
آبخار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N6

(۱۷ الی ۲۲ دی ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



# اجرای تیر سقف

- آرماتور بندی و قالب بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی (پارت آخر)

- آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال شرقی (پارت دوم)

- قالب بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال شرقی (پارت اول)

- زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ قسمت میانی برج (پارت اول)

- بتن ریزی تیر سقف طبقه ۹+ بال شرقی (پارت اول)

- دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۸+






# نصب پنل

■ نصب پنل سقف طبقه ۹+ بال  
شرقی (پارت دوم)





# اجرای ستون

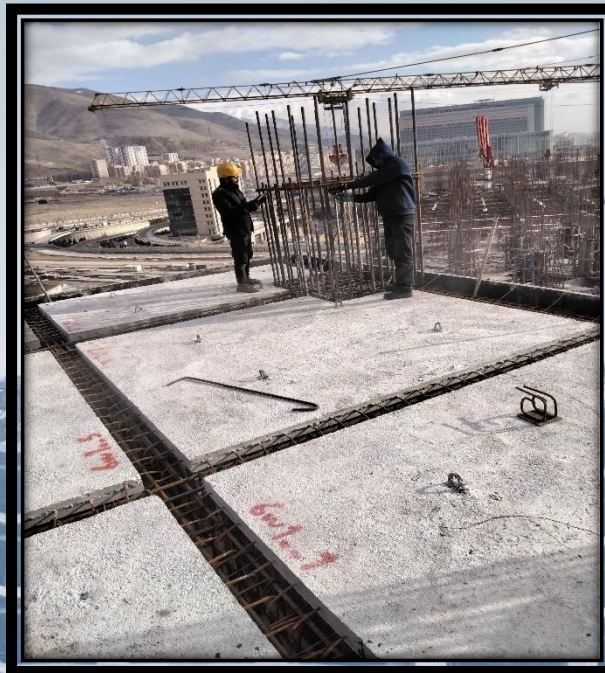

- آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ قسمت میانی برج
- قالب بندی ستون های طبقه ۹+ قسمت میانی برج
- بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ قسمت میانی برج
- آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ بال شرقی
- دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده



# راه پله

- آرماتور بندی راه پله شماره دو طبقه +۵ به +۶





# ختم و برش

• ختم و برش میلگرد





# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۱۷



# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۲۲



# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۰/۱۷



# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۰/۲۲
