




گزارش هفتگی از عملکرد بلوک N5 (سوم الی هشتم دی ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

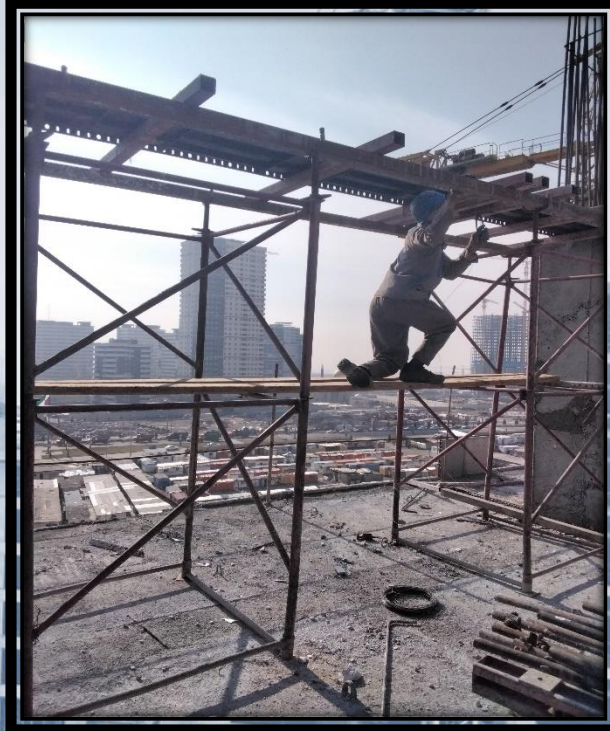

- زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه +۸ قسمت میانی برج


- آرماتور بندی تیر سقف طبقه +۸ قسمت میانی برج

- دکفراژ اسکافلد سقف طبقه +۷





اجرای نصب پنل

- نصب پنل سقف طبقه +۸ بال شرقی (سطح طبقه +۹)

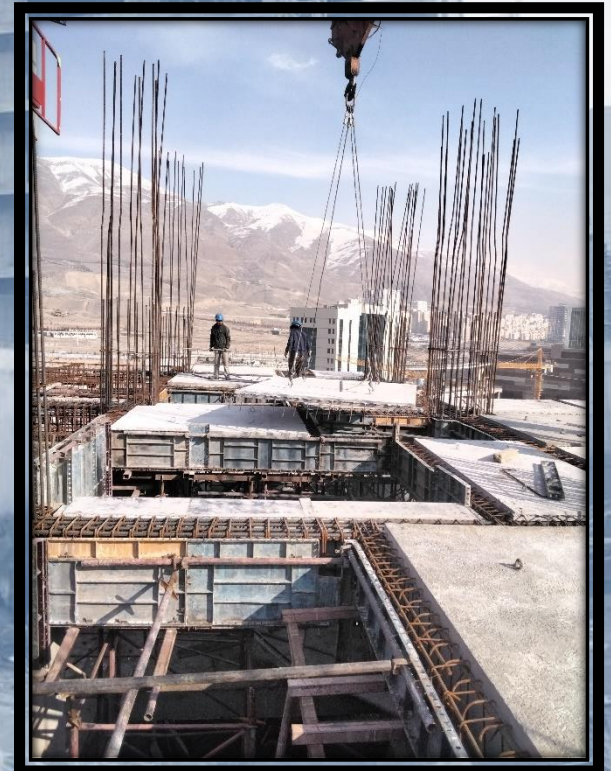

اجرای ستون

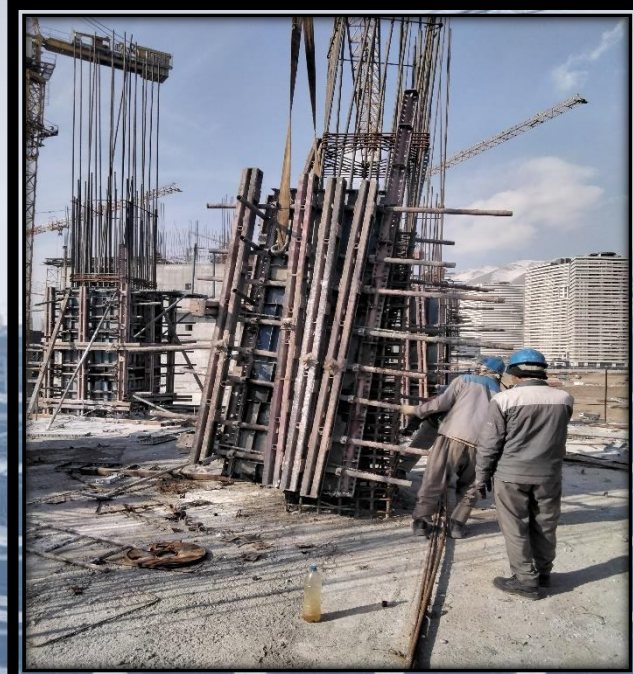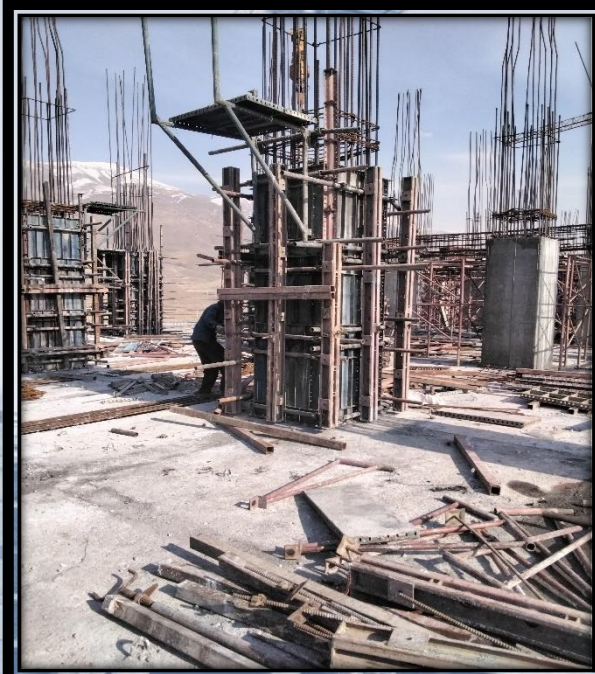

- آرماتور بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی

- قالب بندی ستون های طبقه ۸+ بال غربی

- آرماتور بندی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج

- قالب بندی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج

- بتن ریزی ستون های طبقه ۸+ قسمت میانی برج

- دکفراژ ستون های بتن ریزی شده

انباری

▪ دیوار چینی انباری های ۱-



انباری

- تکمیل قالب بندی دیوار برشی طبقه +۸ بال غربی



تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تصاویر نقطه ای ضلع شمالی

۱۴۰۱/۱۰/۰۸

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی

۱۴۰۱/۱۰/۰۳

تساویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۰/۰۸
