



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا


گزارش هفتگی عملکرد بلوک N4

(۱ الی ۶ بهمن ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۵+۶ (کف مرکزی و بال شرقی)
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۵+۶ (کف مرکزی و بال شرقی)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف بال غربی)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+۵ (کف بال غربی)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۴+۵ (کف بال غربی) و ۵+۶ (کف بال غربی)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع

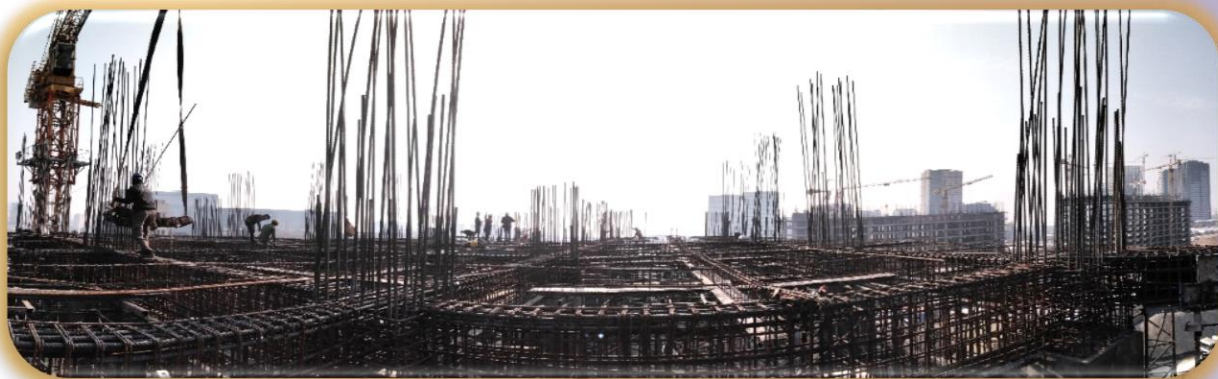

اجرای ستون

✓ شروع آرماتوربندی ستون های طبقه ۶+ هسته مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال شرقی

✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال شرقی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال غربی

✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال غربی

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



دیوار برشی

✓ دکفراژ قالب دیوار برشی طبقه ۴+ بال شرقی



پنل سقف

- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۵+(سطح ۶) هسته مرکزی
- ✓ اجرای نصب پنل سقف طبقه ۴+(سطح ۵) بال غربی



راه پله

✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه ۵ به ۶ +
بال شرقی



انباری

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۱-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۱-



کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه ستون های پنجم تا هشتم بال غربی



تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۰۶
