



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی عملکرد بلوک N5 (هفته اول اسفند ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## اجرای تیر سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۸+ بال غربی

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال شرقی

❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه ۹+ قسمت میانی برج (پارت اول)

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۸+ قسمت میانی برج

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۸+






## اجرای ستون

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۹+ قسمت میانی برج

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ قسمت میانی برج

❑ دکفراژ ستون های بتن ریزی شده

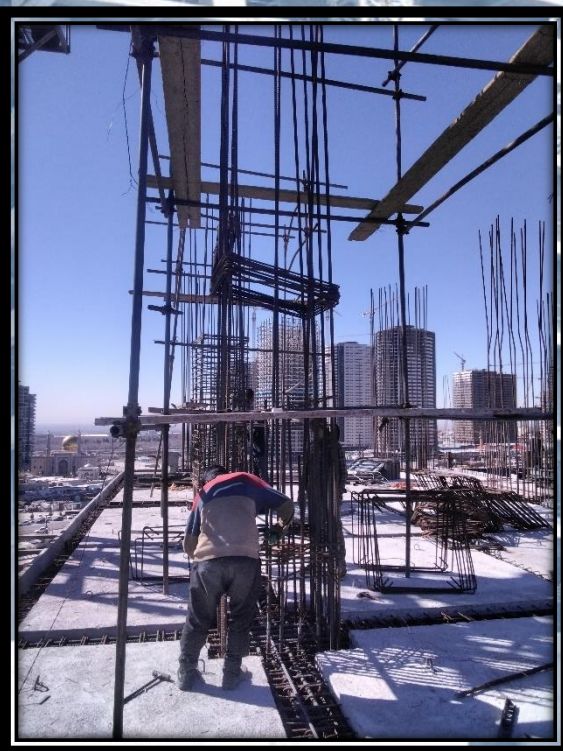




## راه پله

❑ بتن ریزی راه پله شماره ۳ طبقه ۸ به ۹+

❑ آرماتور بندی راه پله شماره ۴ طبقه ۸ به ۹+

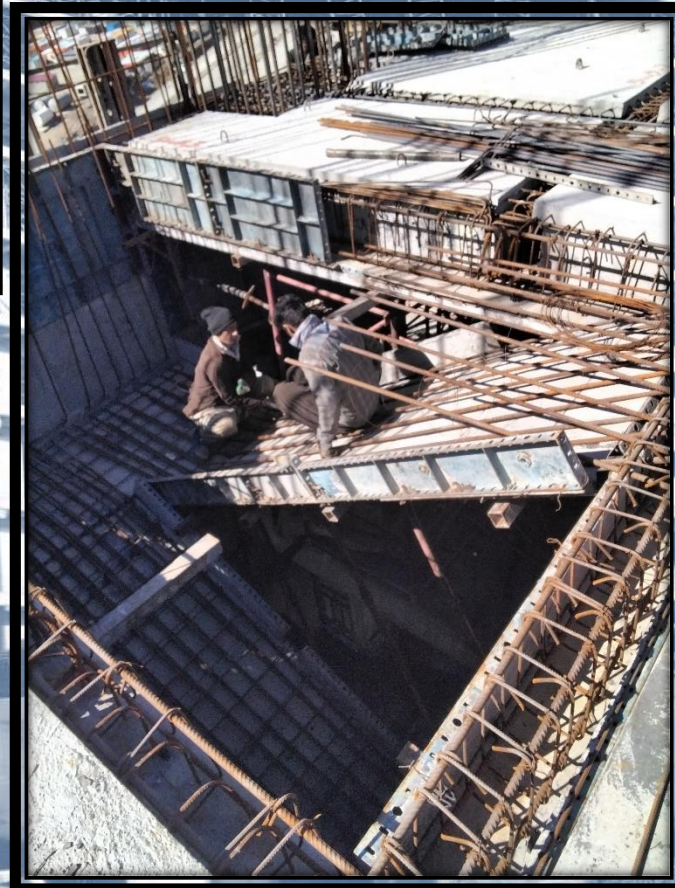



## واحد های مسکونی

□ نصب ایزی وال واحد های مسکونی طبقه ۳+





## بار های ارسال

□ ورود و تخلیه سرامیک های  $۱۲۰*۶۰$  جهت سرامیک کاری دیوار انباری های طبقات منفی

□ ورود و تخلیه نبشی های گالوانیزه  $۴*۵$  جهت استفاده در دیوار های داخلی واحد های مسکونی





تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۲۹



تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۲/۰۴



تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۹



تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۴
