

شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی عملکرد بلوک N6 (۸ الی ۱۳ بهمن ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## اجرای تیر سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ قسمت  
میانی برج

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۹+ قسمت میانی  
برج (پارت دوم)

❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه  
۹+ بال غربی (پارت اول)

❑ زیر سازی و اسکافلد گذاری تیر سقف طبقه  
۱۰+ بال شرقی (پارت اول) (سطح طبقه ۱۱+)

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۹+





## اجرای ستون

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ بال شرقی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ بال شرقی


❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۱۰+ بال شرقی

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده

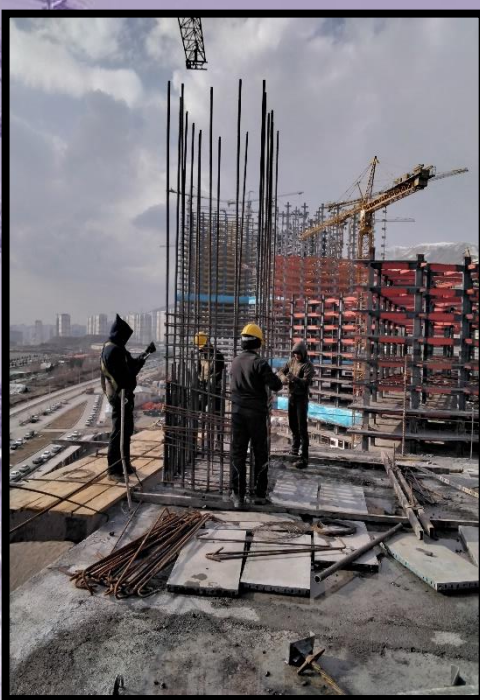



## نصب پنل سقف

□ نصب پنل سقف طبقه ۹+ قسمت میانی برج





## راه پله

□ آرماتور بندی راه پله شماره دو طبقه ۶+ به ۷+





# دیوار برشی

□ آرماتور بندی دیوار برشی طبقه ۹+ بال غربی





تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۰۸



تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۱۳



تصویر نقطه ای ضلع جنوب

۱۴۰۱/۱۱/۰۸



تصویر نقطه ای ضلع جنوب

۱۴۰۱/۱۱/۱۳
