

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N6 (۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه)



مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف

❑ آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال غربی

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال غربی

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۹+ بال غربی (پارت دوم)

❑ قالب بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ بال شرقی (پارت اول)

❑ زیر سازی و آرماتور بندی تیر سقف طبقه ۱۰+ بال شرقی (پارت دوم)

❑ بتن ریزی تیر سقف طبقه ۹+ قسمت میانی برج

❑ دکفراژ اسکافلد سقف طبقه ۹+



اجرای ستون

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج


❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۱۰+ قسمت میانی برج

❑ آرماتور بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ قالب بندی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ بتن ریزی ستون های طبقه ۹+ بال غربی

❑ دکفراژ قالب ستون های بتن ریزی شده

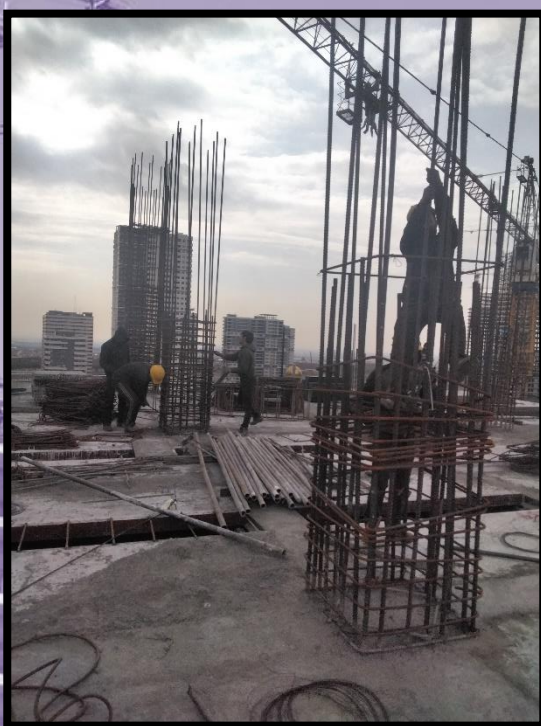

راه پله

□ آرماتور بندی راه پله شماره ۳ طبقه ۸+ به ۹+



دیوار برشی


□ قالب بندی دیوار برشی طبقه ۹+ بال غربی

□ بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۹+ بال غربی



واحد های مسکونی

□ ضد زنگ زنی والپست تیغه چینی (ایزی وال) واحد های مسکونی طبقه ۲+

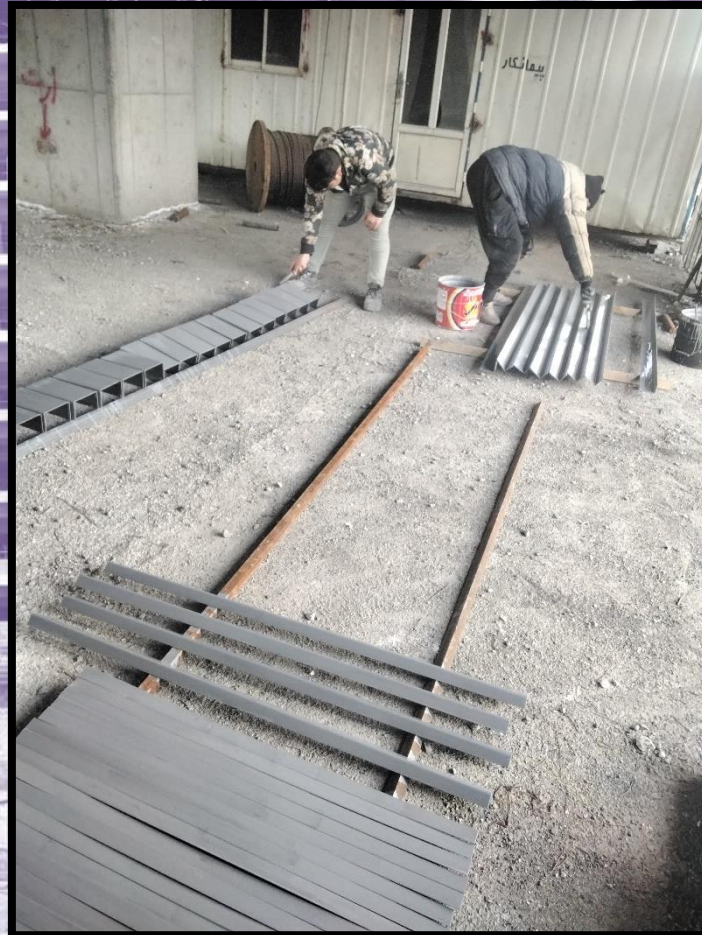

تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۲۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۰
