


# گزارش ماهانه عملکرد بلوک N4 بهمن ماه ۱۴۰۱

## مجمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

# اجرای تیر سقف

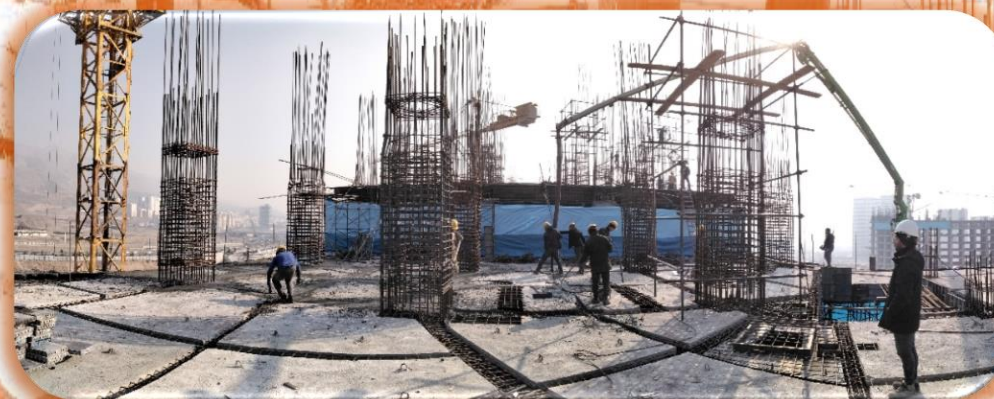

- ✓ شروع اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۶+ (کف ۷+) هسته مرکزی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال شرقی
- ✓ تکمیل بتن ریزی سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال شرقی
- ✓ اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) و ۵+ (کف ۶+)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع

# اجرای ستون



- ✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



# نصب پنل

- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۵ (+سطح ۶) هسته مرکزی
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۴ (+سطح ۵) بال غربی



# دیوار برشی

- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی




# انباری ها

- ✓ اجرای وال پست های انباری طبقه ۱-
- ✓ اجرای یه رگه چینی انباری های طبقه ۱-



# راه پله

- ✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه ۵ به ۶ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۵ به ۶ بال شرقی
- ✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله طبقه ۴ به ۵ بال غربی
- ✓ بتن ریزی راه پله طبقه ۴ به ۵ بال غربی

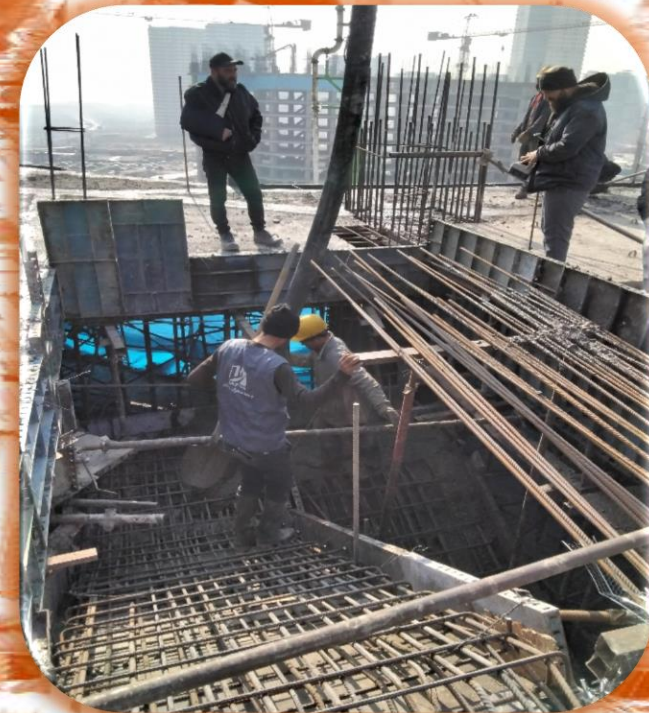

# موتورخانه

✓ اجرای بتن ریزی ستون های موتورخانه





# کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه ستون های پنجم تا هشتم بال غربی




## تصاویر مقایسه ای ضلع شمالی



آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی

آرما توربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

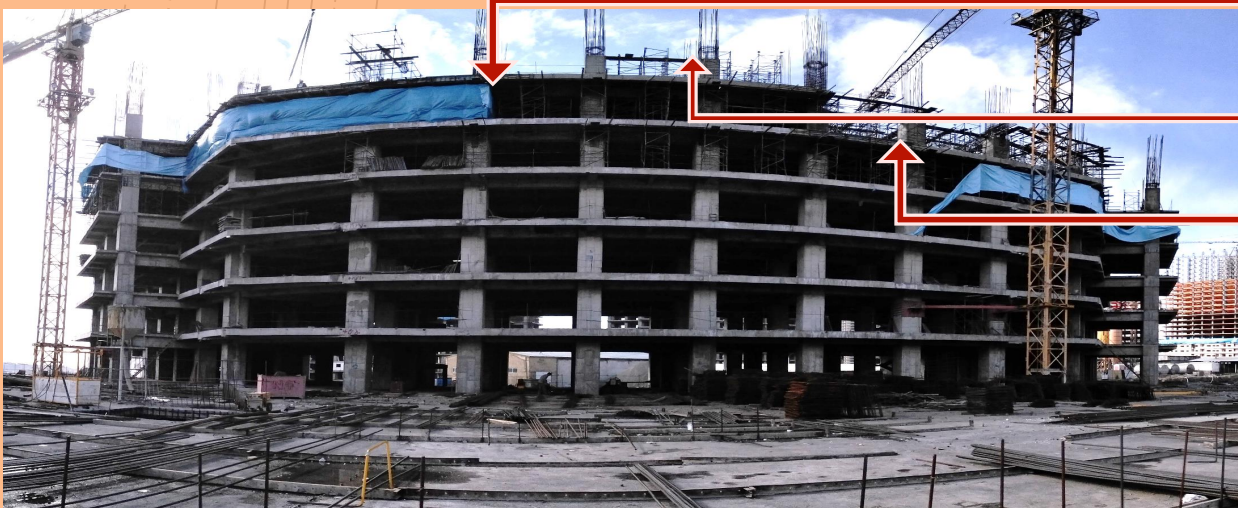

تکمیل آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی و بال شرقی

آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۶+ (کف ۷+) هسته مرکزی

آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی و بال غربی

۱۴۰۱/۱۰/۲۷

## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی

آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی

آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال غربی

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تکمیل آرما توربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) هسته مرکزی و بال غربی

آرما توربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۶+ هسته مرکزی و بال شرقی

آرما توربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ هسته مرکزی و بال غربی

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

# تصویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۱۰/۲۷



تصویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۱۱/۱۵



