

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3

(هفته اول اسفند ماه)

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف



- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای
- سقف طبقه ۵ (+ کف ۶) بال غربی (زون ۱)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف
- طبقه ۴ (+ کف ۵) بال شرقی (زون ۳)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه
- ۴ (+ کف ۵) هسته مرکزی و بال شرقی (زون ۲ و
- زون ۳)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴ (+ کف ۵) هسته
- مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه
- ۳ (+ کف ۴) و ۴ (+ کف ۵)
- ✓ اجرای ضد زنگ پلیت نما در تیرهای
- کناری (پیرامون) سقف طبقه ۳ (+ کف ۴)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱)
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون ها



پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی






دیوار برشی

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ آرماتوربندی دیوار برشی طبقه ۴+ بال شرقی



راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۳ طبقه ۳+۳ به ۴+
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۳ طبقه ۳+۳ به ۴+

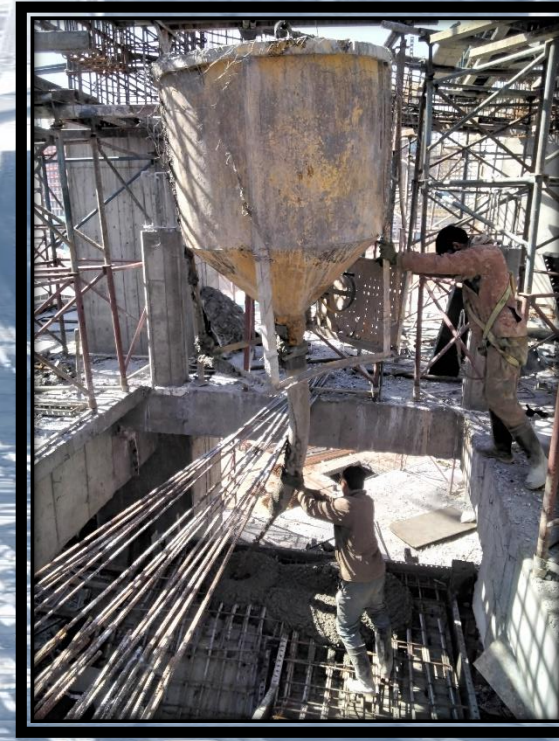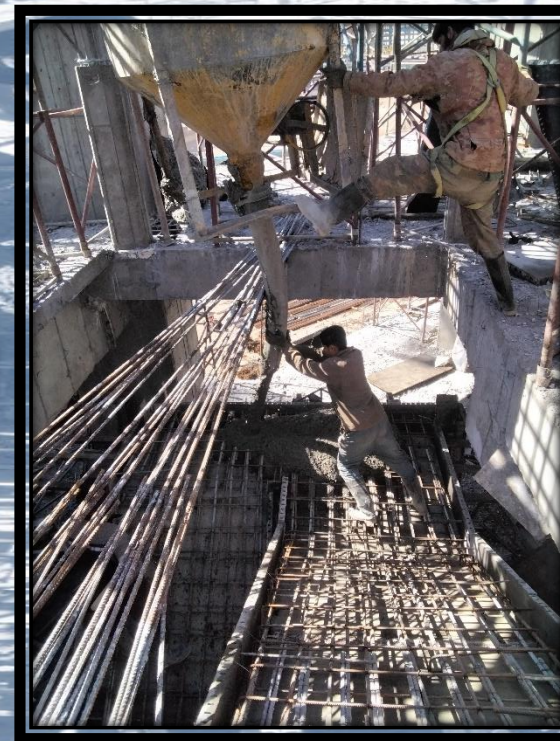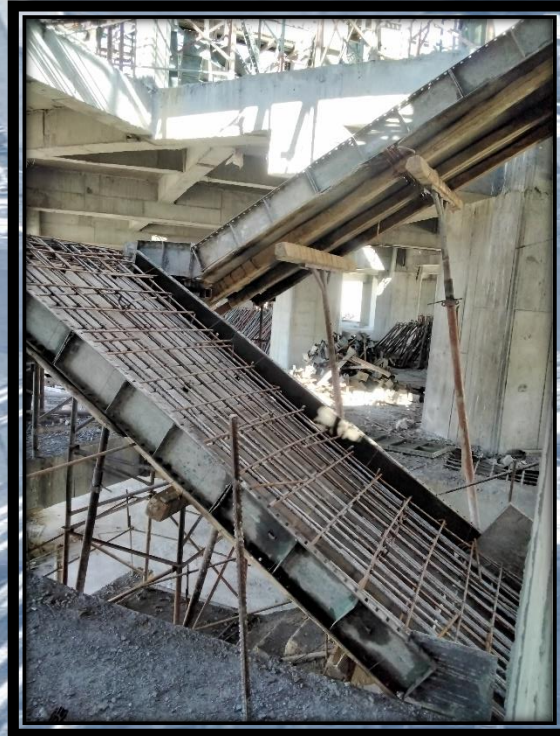

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۹

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۰۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۴
