



شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N4

(هفته اول اسفند ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

اجرای تیر سقف



✓ شروع اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه
+۶ (کف +۷) هسته مرکزی

✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی سقف طبقه
+۵ (کف +۶) بال شرقی


✓ تکمیل بتن ریزی سقف طبقه +۵ (کف +۶) بال
شرقی

✓ اجرای اسکافلد و زیرسازی سقف طبقه +۵ (کف
+۶) بال غربی

✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه
+۴ (کف +۵) و +۵ (کف +۶)

✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع



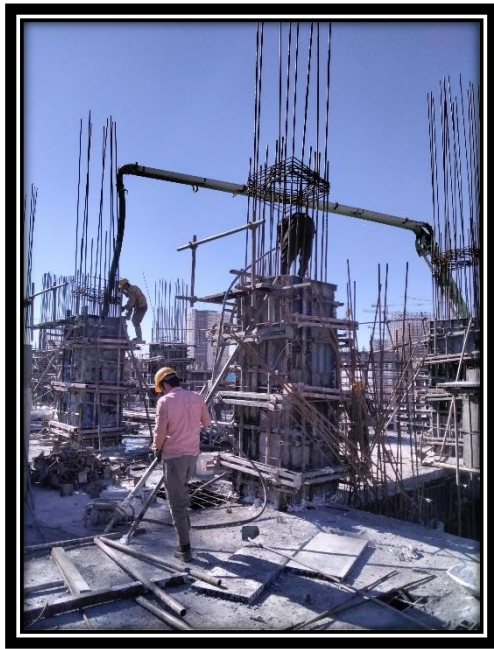

اجرای ستون

- ✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های



دیوار برشی

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۶+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی دیوار برشی طبقه ۶+ بال شرقی



موتورخانه

- ✓ تکمیل قالب بندی پارت دیگری از دیوار موتورخانه
- ✓ بتن ریزی دیوار موتورخانه








راه پله

✓ قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۲ طبقه ۵+ به ۶+

کارگاه رزوه

✓ آماده سازی رزوه ستون های پنجم تا هشتم بال غربی

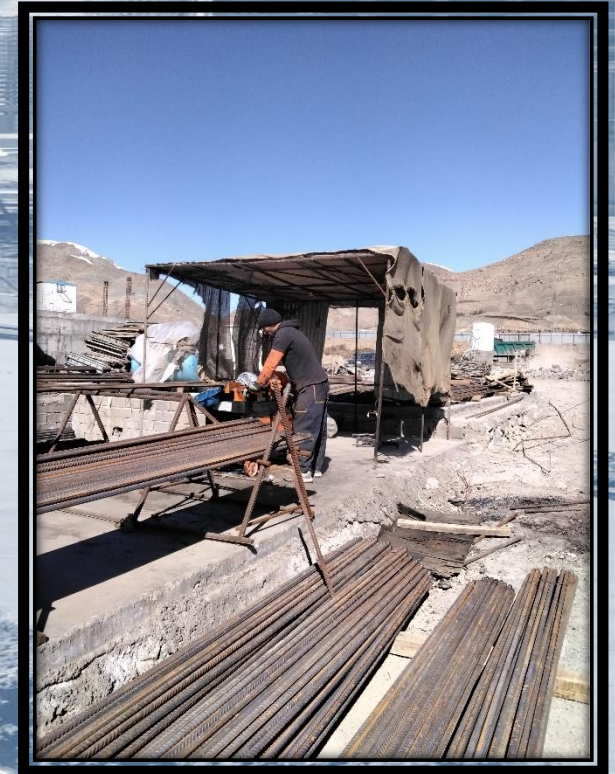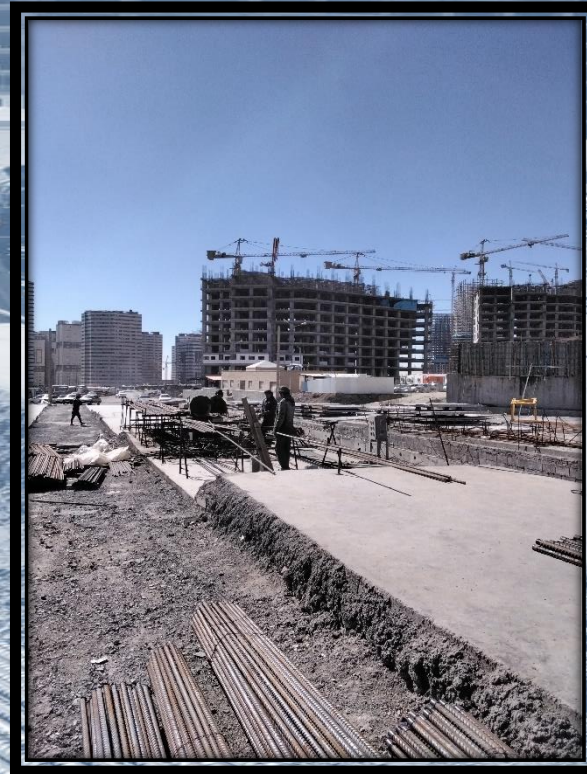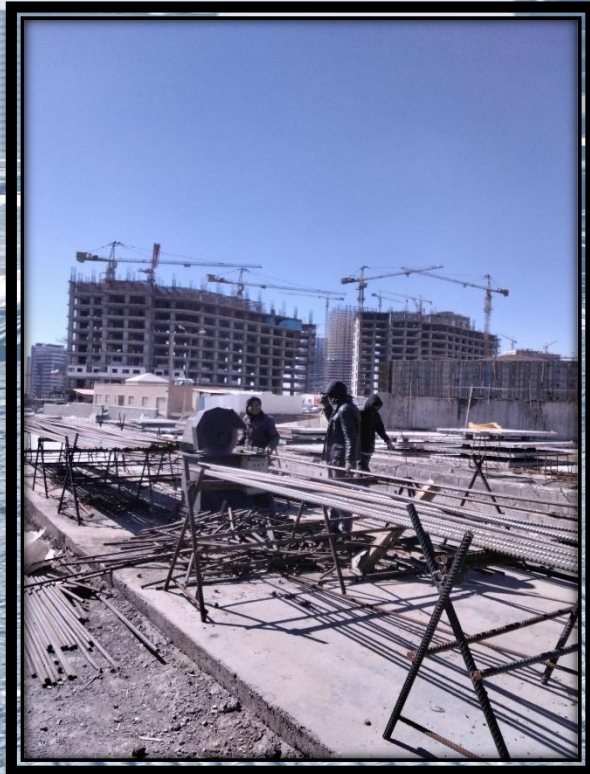

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۱/۲۹

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۰۴

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۱/۲۹

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۴
