

گزارش ماهانه عملکرد بلوک D1  
بهمن ماه ۱۴۰۱


# مجتمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)


## اجرای سقف

- اجرای بتن ریزی، قالب بندی و آرماتوربندی سقف ۸+ بال غربی
- اجرای قالب بندی، آرماتوربندی سقف ۱۶+ بال شرقی
- اجرای قالب بندی سقف ۹+ بال غربی

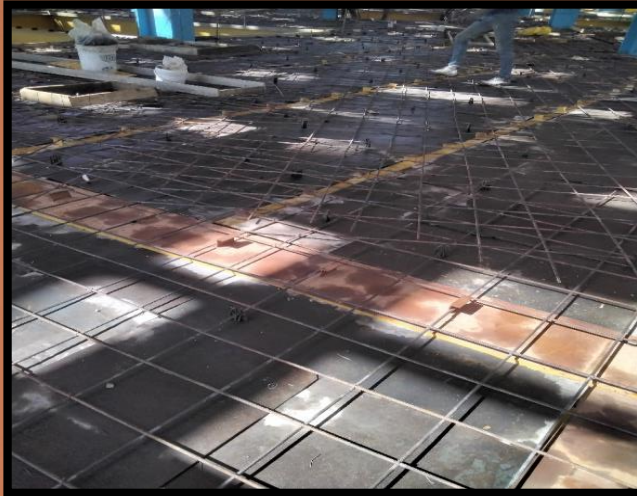

## نصب تیر و ستون

- نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی
- نصب ستون های استیج چهارم بال غربی

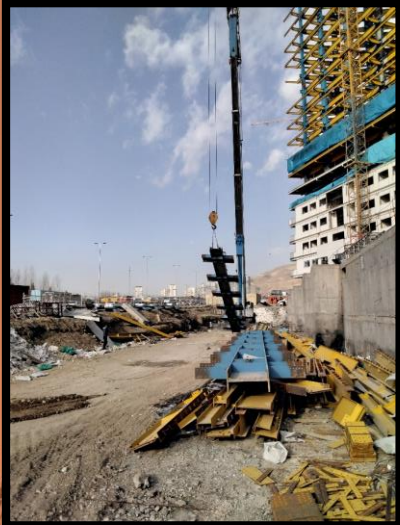

## اجرای واحدهای مسکونی

- نصب پنل های پیش ساخته طبقه ۲ و ۳ + بال شرقی
- نصب وال پست ضلع شمال طبقه ۶ + بال شرقی
- نصب چهارچوب درب واحدهای طبقه ۳، ۴ + بال شرقی
- نصب چهارچوب درب واحدهای طبقه ۲، ۴ + بال غربی
- اجرای وال پست و نصب پنل های پیش ساخته طبقه ۸ + بال شرقی
- اجرای پلاستر دیوار سرویس بهداشتی واحدهای طبقه ۲ + بال غربی
- اجرای پلاستر دیوار آشپزخانه واحدهای طبقه ۲ + بال غربی
- بندکشی دیوار واحدهای طبقه ۴ + بال شرقی





## تاسیسات



- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۱، ۲+ بال شرقی
- اجرای رایزرهای لوله های تاسیساتی طبقه ۲+ بال غربی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۳، ۴، ۲+ بال غربی
- نصب ساپورت لوله های سقفی واحدهای طبقه ۱، ۲+ بال شرقی
- اجرای لوله های آب واحدهای طبقه ۳، ۲+ بال شرقی
- ساخت کانال های هواساز واحدهای مسکونی
- اجرای کلاف بندی داکت های تاسیساتی طبقه ۲، ۴+ بال شرقی
- اجرای اگزاست های تاسیساتی طبقه ۲+ بال شرقی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقه ۱+ بال شرقی
- نصب ساپورت لوله های سقفی طبقه ۳+ بال غربی
- اجرای لوله های تاسیساتی طبقات منفی
- اجرای رایزرهای لوله های تاسیساتی طبقه ۳، ۴+ بال شرقی
- اجرای لوله های آب واحدهای طبقه ۳+ بال غربی
- اجرای تاسیسات برق واحدهای طبقه ۲+ بال غربی، ۲+ بال شرقی
- اجرای کلاف بندی داکت های تاسیساتی طبقه ۲، ۳+ بال غربی



## انباری ها

- اجرای موزاییک کف انباری های طبقه ۱، ۲، ۳-
- اجرای سیمان کاری آستر دیوار پارکینگ طبقه ۳، ۵، ۱-
- اجرای سیمان کاری آستر انباری های طبقه ۵، ۳-
- اجرای پلاستر دیوار رمپ طبقه ۱ به ۲-
- اجرای پلاستر دیوار پارکینگ طبقه ۱-
- اجرای تیغه چینی انباری های باقیمانده طبقه ۲-
- اجرای پلاستر انباری های طبقه ۳-
- اجرای سیمان پلاستر دیوار پارکینگ طبقه ۴-
- اجرای بندکشی سرامیک دیوار پارکینگ طبقه ۲-
- اجرای سیمان کاری آستر رمپ ۱ به ۲-







## تصاویر مقایسه ای ضلع شرقی بال شرقی

۱۴۰۱/۱۱/۰۱  
نصب تیرهای اصلی استیج پنجم بال شرقی



۱۴۰۱/۱۱/۲۷  
نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی



## تصاویر مقایسه ای ضلع غرب بال غربی


۱۴۰۱/۱۱/۰۱

نصب تیرهای فرعی استیج سوم بال غربی، شروع  
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی



۱۴۰۱/۱۱/۲۷

ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال غربی

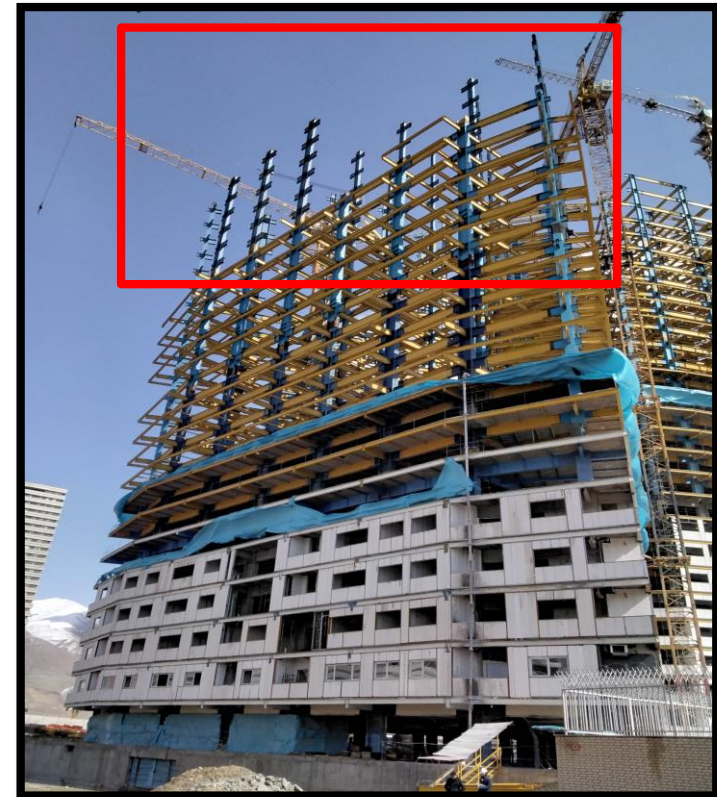

## تصاویر مقایسه ای ضلع شمال

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

نصب تیرهای اصلی استیج پنجم بال شرقی،  
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی،  
اجرای سقف ۱۵+ بال شرقی،  
قالب بندی سقف ۸+ بال غربی،  
اجرای واحدهای مسکونی طبقه ۶+ بال شرقی،



۱۴۰۱/۱۱/۲۷

نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی،  
ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال غربی  
اجرای سقف ۸+ بال غربی،  
اجرای آرماتوربندی سقف ۱۶+ بال شرقی،  
اجرای قالب بندی سقف ۹+ بال غربی،  
اجرای واحدهای مسکونی طبقه ۷+ بال شرقی،  
اجرای واحدهای مسکونی طبقه ۴+ بال غربی،



## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوب

۱۴۰۱/۱۱/۰۱

نصب تیرهای اصلی استیج پنجم بال شرقی،  
نصب ستون های استیج چهارم بال غربی،  
اجرای سقف ۱۵+ بال شرقی،  
قالب بندی سقف ۸+ بال غربی،  
اجرای واحدهای مسکونی طبقه ۷+ بال شرقی،

۱۴۰۱/۱۱/۲۷

نصب تیرهای اصلی و فرعی استیج پنجم بال شرقی،  
ادامه نصب ستون های استیج چهارم بال غربی  
اجرای سقف ۸+ بال غربی،  
اجرای آرماتوربندی سقف ۱۶+ بال شرقی،  
اجرای قالب بندی سقف ۹+ بال غربی،  
اجرای واحدهای مسکونی طبقه ۸+ بال شرقی،



تصاویر نقطه ای

ضلع شمال  
(تصویر ۱)



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

ضلع شمال  
(تصویر ۲)



۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصاویر نقطه ای

ضلع شمال  
(تصویر ۳)



۱۴۰۱/۱۱/۲۷



تصاویر نقطه ای


ضلع جنوب  
(تصویر ۱)



۱۴۰۱/۱۱/۰۱

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب  
(تصویر ۲)

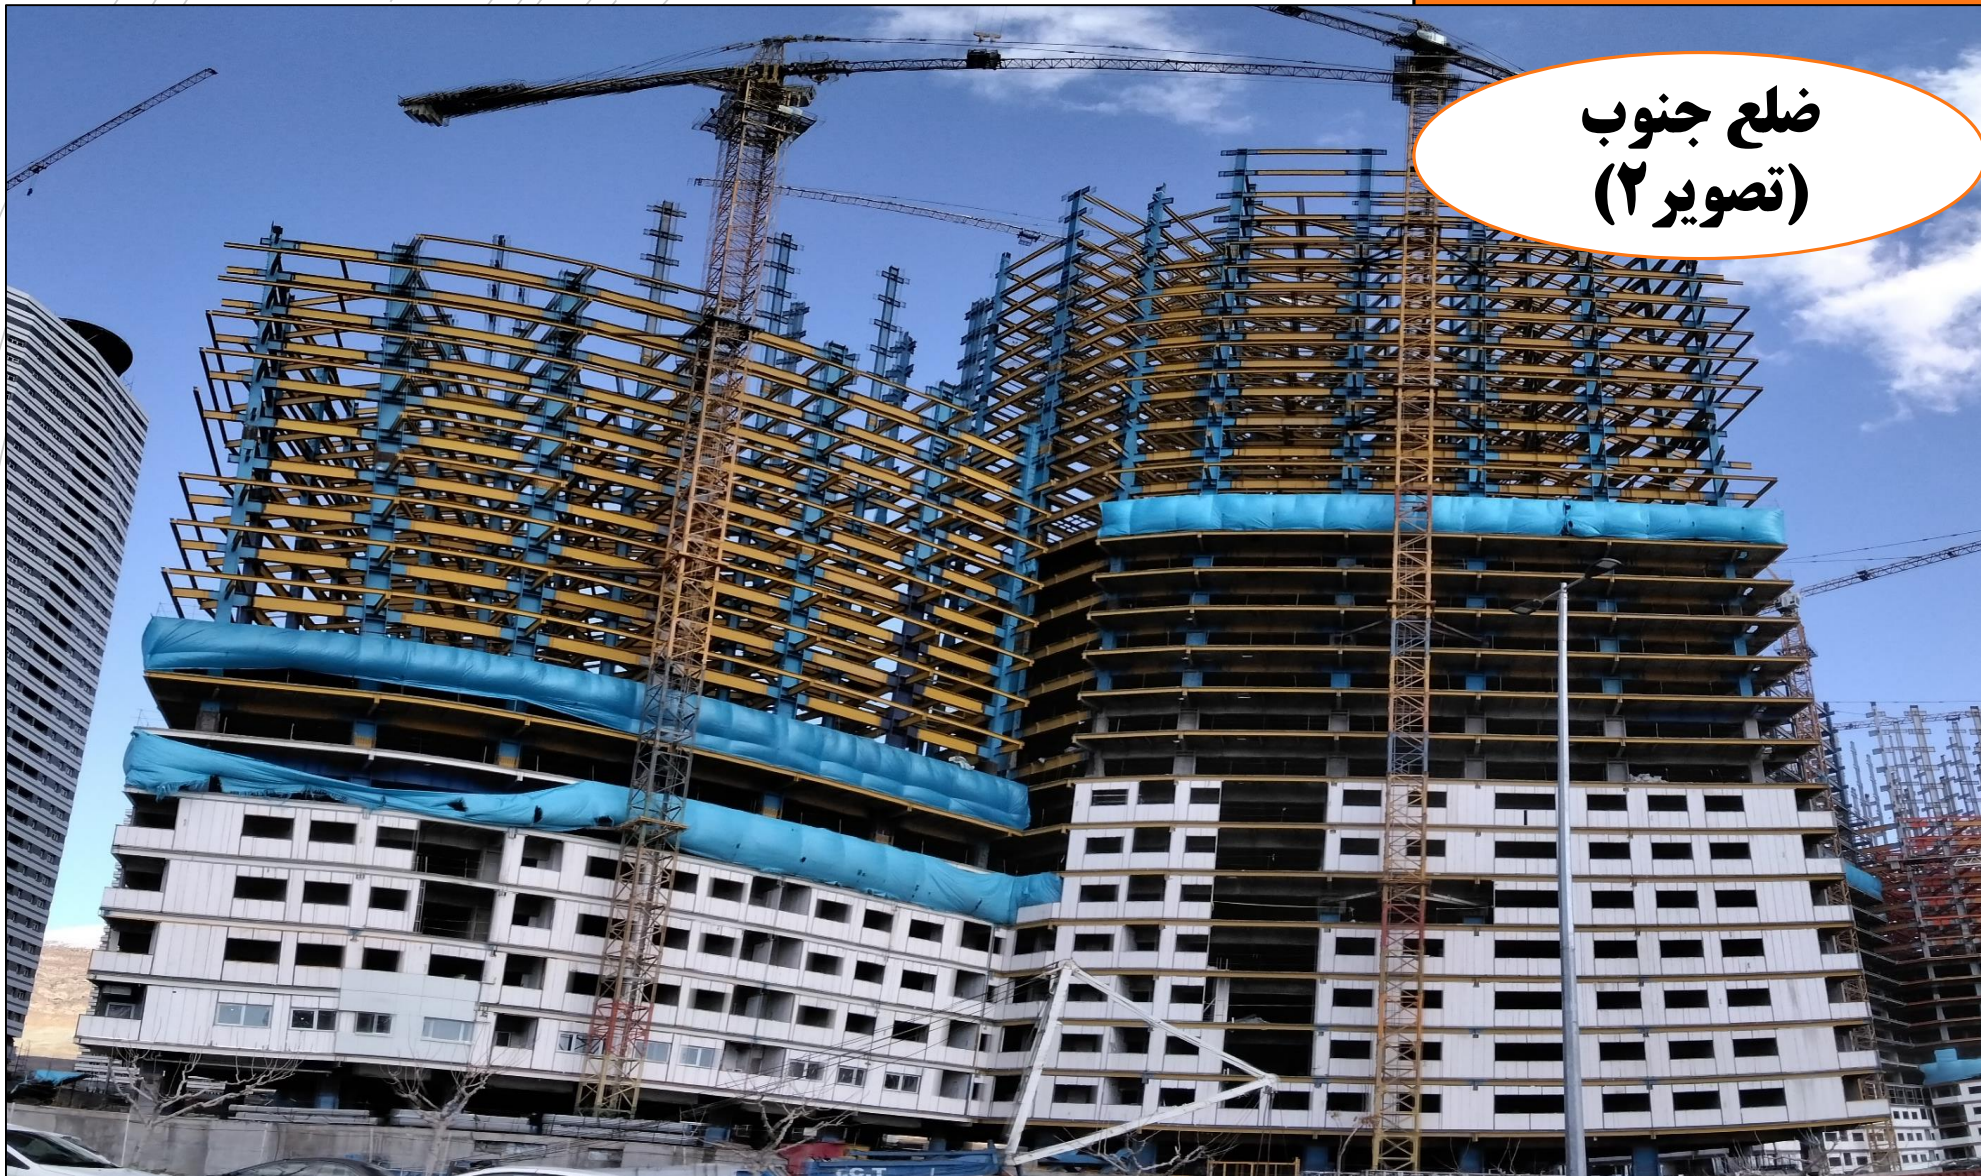

۱۴۰۱/۱۱/۱۵

تصاویر نقطه ای

ضلع جنوب  
(تصویر ۳)



۱۴۰۱/۱۱/۲۷
