



شرکت  
عمران  
آبشار  
اسپادانا

# گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3

(هفته سوم اسفند ماه)

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



## اجرای تیر سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی (زون ۱)
- ✓ ادامه اجرای اسکافلد و زیرسازی و اجرا قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال شرقی (زون ۳)
- ✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی (زون ۲ و زون ۳)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) و ۴+ (کف ۵+)
- ✓ اجرای ضد زنگ و نصب پلیت نما در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه ۳+ (کف ۴+)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع

## اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون ها



## پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی






# دیوار برشی

✓ آرماتوربندی دیوار برشی طبقه ۵+ بال غربی





# اجرای واحدهای مسکونی

✓ ورود وال پست به پروژه جهت اجرای دیوار واحد ها

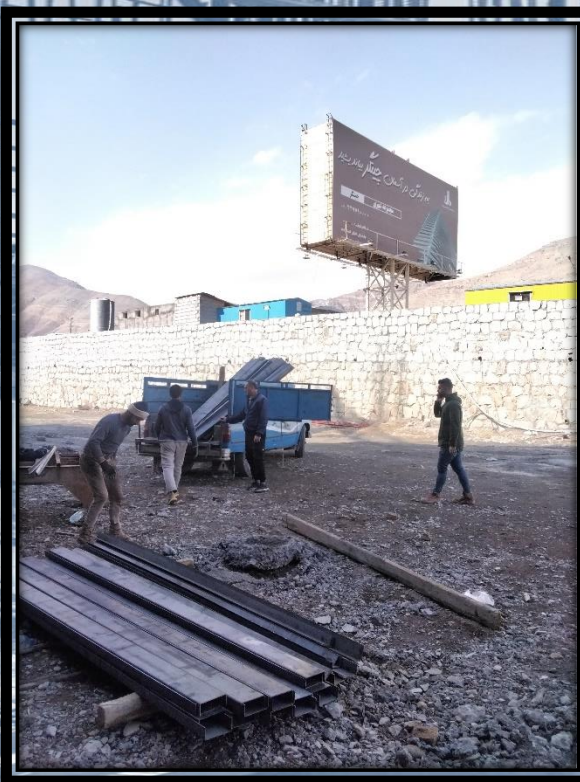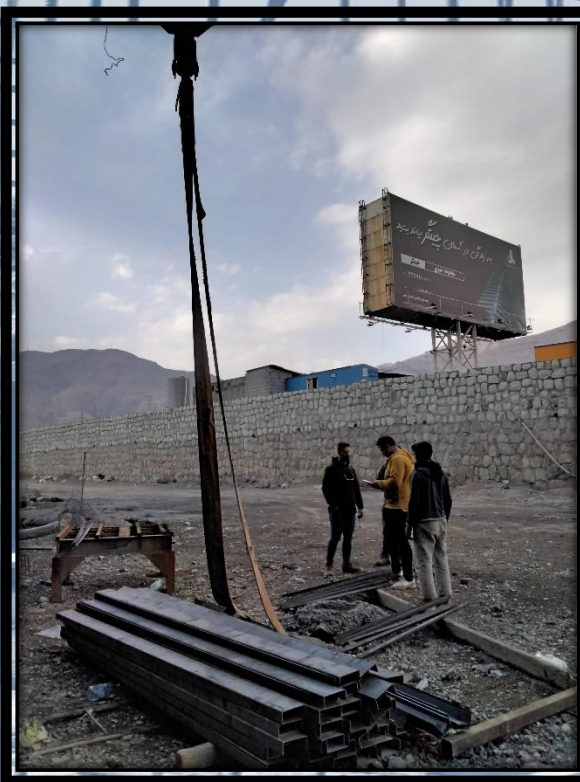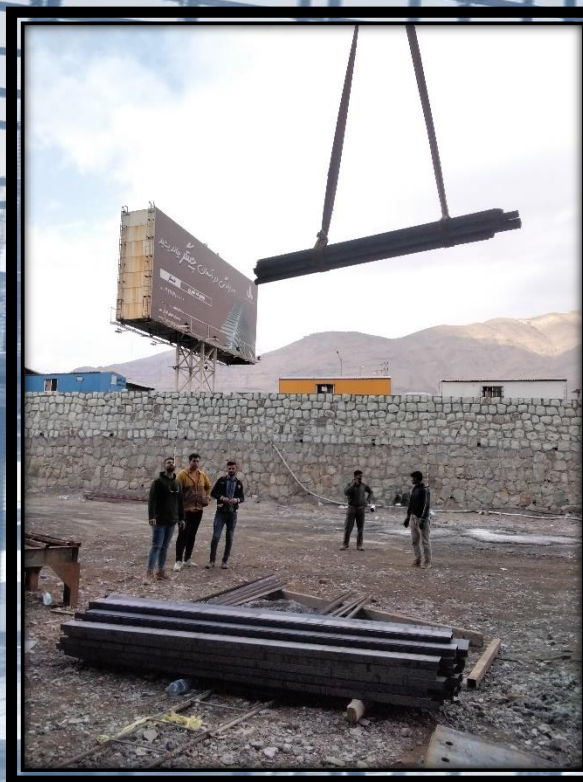

## راه پله

✓ قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۲ طبقه ۴ به ۵

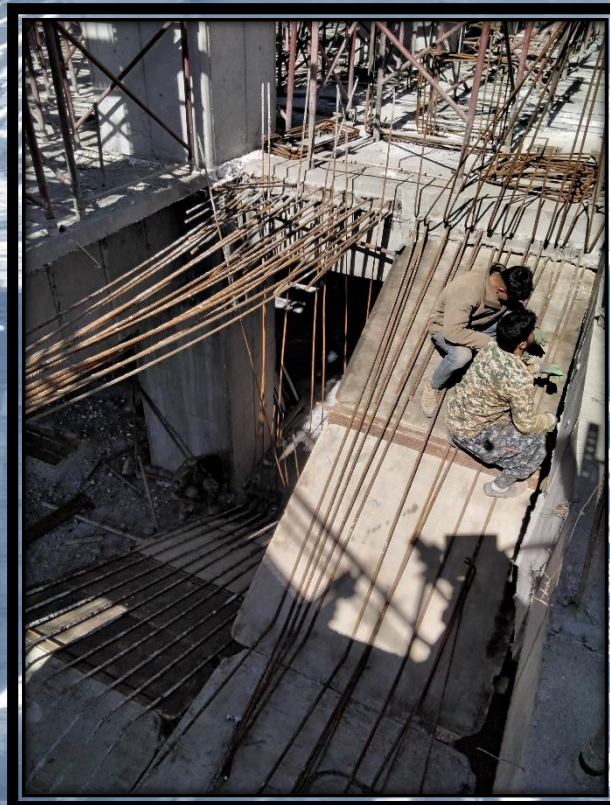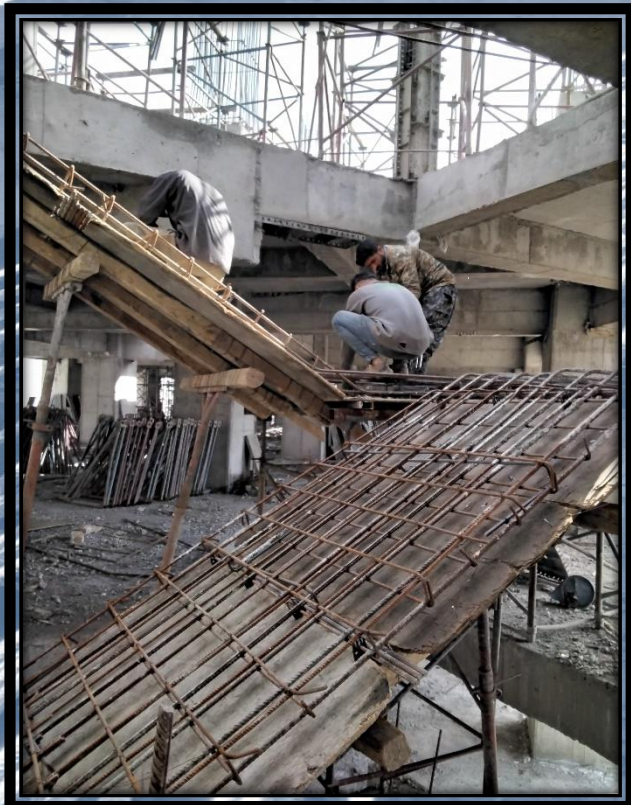

## انباری

- ✓ ساخت و نصب وال پست های انباری طبقه ۴-
- ✓ ادامه اجرای یه رگه چینی و تیغه چینی انباری های طبقه ۴-





# تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۱۳

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۱۸

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۱۳

# تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۱۸
