

گزارش هفتگی عملکرد بلوک N3


(هفته دوم اسفند ماه)

شرکت
عمران
آبشار
اسپادانا

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر



اجرای تیر سقف

- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۵+ (کف ۶+) بال غربی (زون ۱)
- ✓ ادامه اجرای اسکافلد و زیرسازی و اجرا قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) بال شرقی (زون ۳)
- ✓ ادامه آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی و بال شرقی (زون ۲ و زون ۳)
- ✓ بتن ریزی سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی سقف طبقه ۳+ (کف ۴+) و ۴+ (کف ۵+)
- ✓ اجرای ضد زنگ و نصب پلیت نما در تیرهای کناری (پیرامون) سقف طبقه ۳+ (کف ۴+)
- ✓ کیورینگ و عمل آوری بتن مقاطع

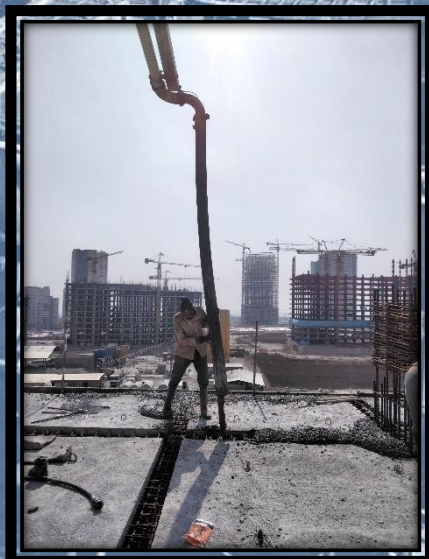


اجرای ستون

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۵+ بال غربی (زون ۱) و هسته مرکزی (زون ۲)
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه ۴+ بال شرقی (زون ۳)
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون ها

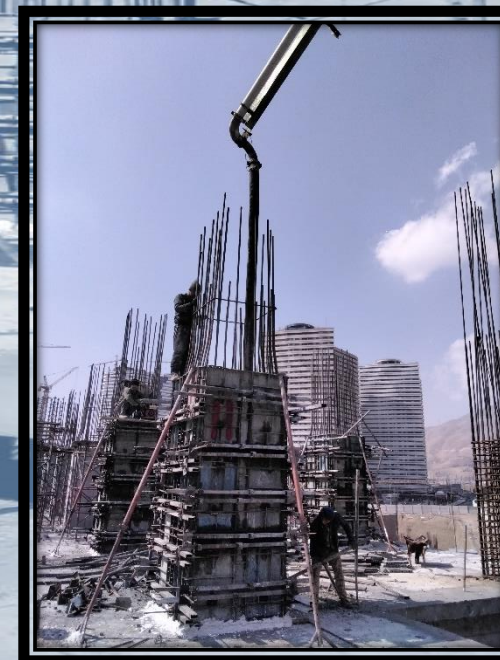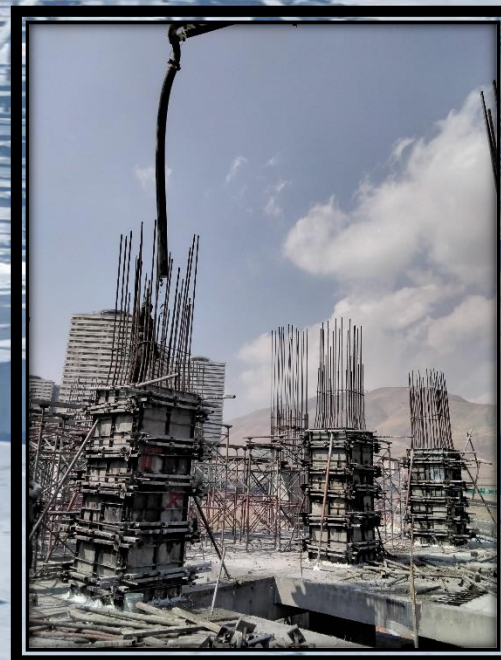


پنل سقف

✓ نصب پنل سقف طبقه ۴+ (کف ۵+) هسته مرکزی

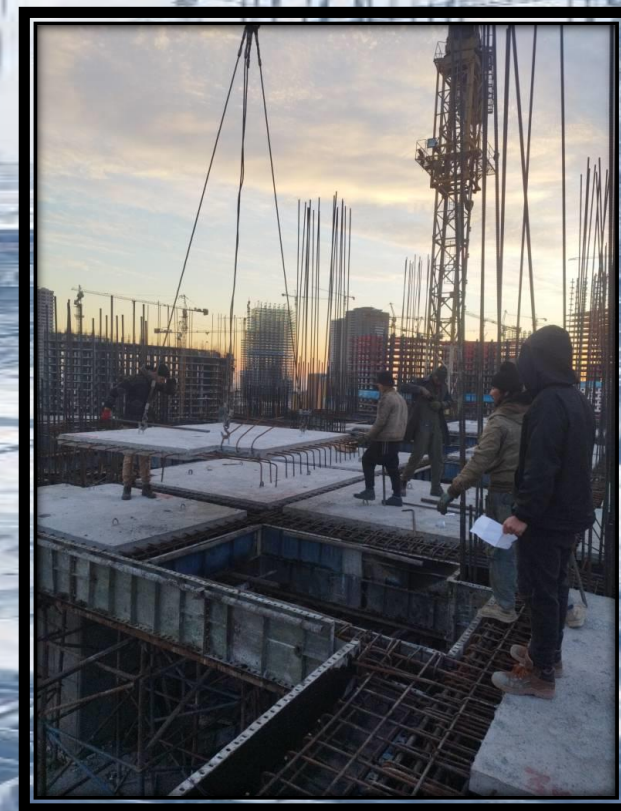



دیوار برشی

- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی طبقه ۴+ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی و دکفراژ دیوار برشی طبقه ۴+ بال شرقی



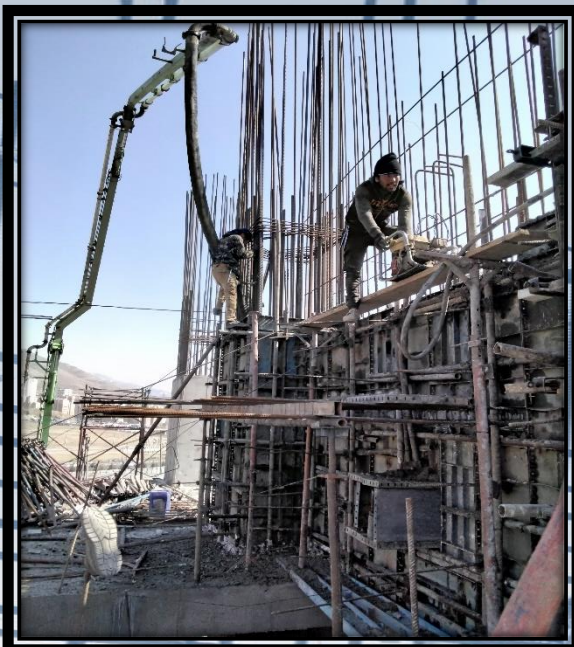


راه پله

- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله شماره ۴ طبقه ۳+
به ۴+
- ✓ بتن ریزی راه پله شماره ۴ طبقه ۳+ به ۴+

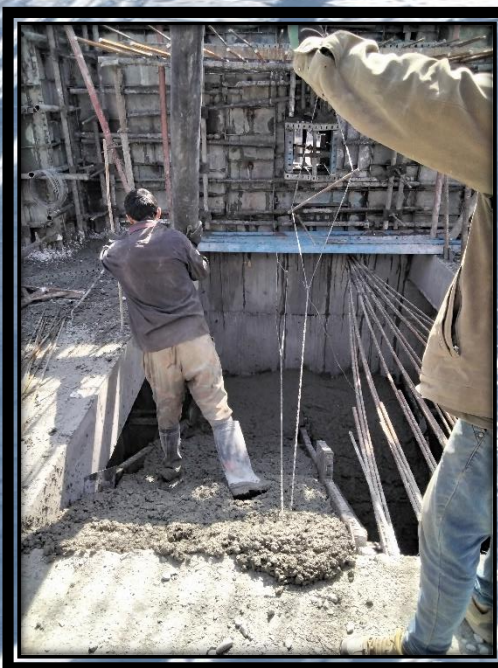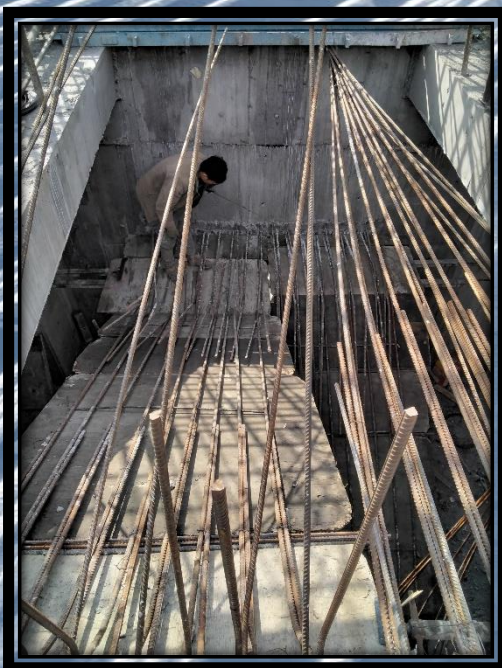

انباری

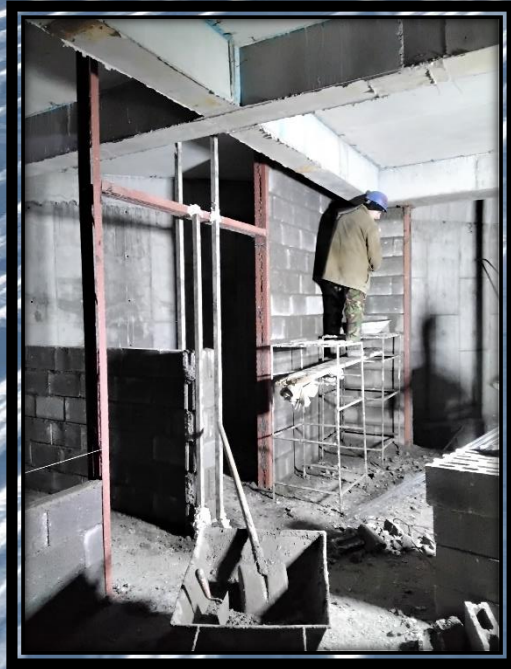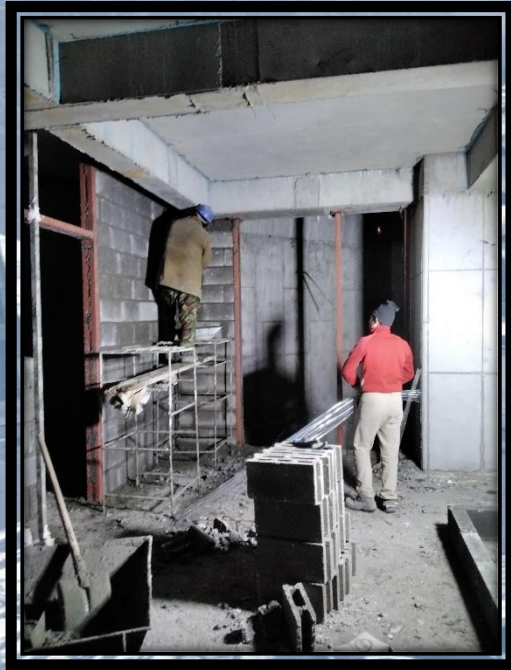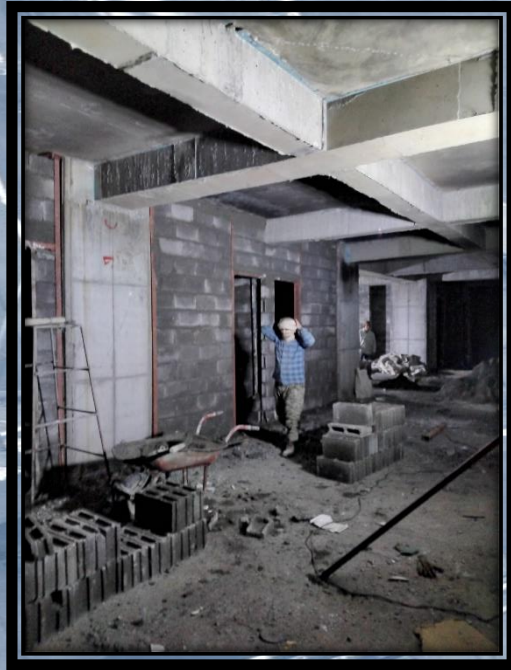

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع شمال



۱۴۰۱/۱۲/۱۱

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۰۶

تصویر نقطه ای ضلع جنوب



۱۴۰۱/۱۲/۱۱
