

بلوک D2

گزارش عملکرد ماهانه

مرداد ماه ۱۴۰۲

مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

www.omranabshar-chitgar.com

عمران
آبشار
اسیادانا






- تکمیل آرماتوربندی ،
قالب بندی و بتن ریزی
سقف طبقه ۲۲+ بال غربی
- تکمیل آرماتوربندی و
قالب بندی و بتن ریزی
سقف طبقه ۱۶+ بال
شرقی
- اجرای قالب بندی طبقه
۲۳+ بال غربی
- اجرای آرماتوربندی و قالب
بندی سقف طبقه ۱۷+ بال
شرقی



- تکمیل آرماتوربندی ،
قالب بندی و بتن
ریزی سقف طبقه
۲۱+ بال غربی
- تکمیل آرماتوربندی
و قالب بندی و بتن
ریزی سقف طبقه
۱۵+ بال شرقی

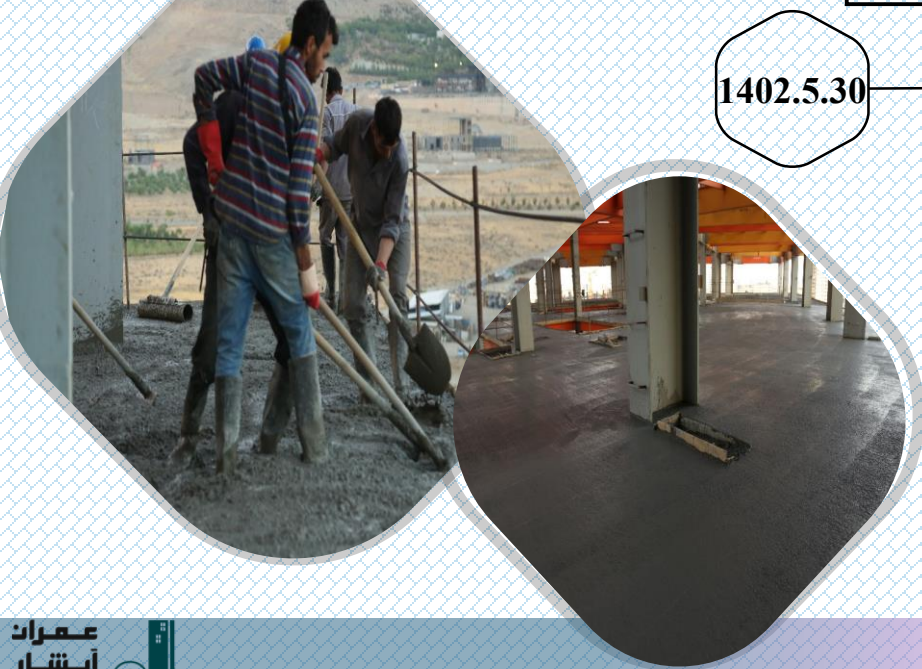

1402.5.30

شرح اجرا

اجرای سقف



1402.4.30

نصب تیر و ستون

شرح اجرا ✓

- **شروع** نصب ستون های استیج پنجم بال شرقی
- نصب تیرهای فرعی استیج سوم و چهارم بال شرقی
- **تکمیل** نصب تیرهای استیج سوم بال شرقی
- اجرای نصب تیرهای استیج چهارم بال غربی



- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی
- طبقات ۸+ بال غربی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی
- طبقات ۹+ و ۱۰+ بال شرقی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی
- طبقات ۱۷+ و ۱۸+ بال غربی
- اجرای رانر های واحد های داخلی طبقه ۶+ و ۷+ بال غربی

1402.5.30



- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقات ۶+ و ۷+ بال غربی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۸+ بال شرقی
- نصب وال پست دیوارهای پیرامونی طبقه ۱۶+ بال غربی
- اجرای رانر های واحد های داخلی طبقه ۶+ بال غربی
- اجرای کاشی کاری سرویس و حمام واحدهای طبقه ۲+ بال غربی
- اجرای کروم بندی گچ کاری واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی و غربی
- **اتمام** سرامیک کاری کف و نصب فریم پنجره های واحدهای طبقه ۲+ بال شرقی جهت تجهیز کارگاه
- آماده سازی نصب چهارچوب درب واحدهای طبقه ۳+
- اجرای قیرگونی سرویس و حمام واحد های طبقه ۲+ شرقی

1402.4.30



✓ شرح اجرا واحدهای مسکونی

تاسیسات

عمران
آبشار
اسیادانا



شرح اجرا ✓

- اجرای فریم داکت های تاسیساتی طبقات ۵+ الی ۸+ بال غربی
- اجرای رایزهای تاسیساتی طبقات ۸+، ۷+، ۶+ بال غربی
- اجرای لوله کشی تاسیساتی طبقه ۲+ بال غربی
- اجرای کانال های اگزاست طبقات ۴+ الی ۸+ بال شرقی
- نصب قوطی های برق طبقه ۲+ بال شرقی و غربی
- ادامه لوله کشی پوشیفیت طبقه ۳+ بال غربی
- **شروع** لوله کشی پوشیفیت طبقه ۴+ بال غربی



پاشش ضد حریق

شرح اجرا

- **اتمام** پاشش ضد حریق طبقات ۹+ الی ۱۱+ بال شرقی و غربی
- اجرای زیرسازی و پاشش ضد حریق طبقات ۱۲+ بال شرقی و غربی
- اجرای زیرسازی و کارواش طبقه ۱۳+ بال غربی جهت اجرای عملیات پاشش ضد حریق

انباری ها و پارکینگ



شرح اجرا

- **اتمام** رگلاژ و قلوه ریزی طبقه ۶-
- اجرای سرامیک دیوارهای خارجی طبقه ۱- و ۲-
- اجرای تیغه چینی قسمت های باقی مانده طبقه ۲-
- اجرای سفید کاری انباری های طبقه ۳- ۴-
- اجرای سیمان کاری دیوار برشی رمپ طبقه ۱- و ۲-
- اجرای موزائیک کاری داخلی انباری های طبقه ۱- و ۲-
- **بتن ریزی** کف طبقه ۵- بال غربی



پارکینگ الحاقی

شرح اجرا ✓

- اجرای بتن ریزی دیوار حایل ضلع شمال سازه الحاقی
- اجرای آرماتوربندی تیرها جهت نصب پنل پارت اول سازه الحاقی

تخلیه بار



شرح اجرا



- ورود و تخلیه پنل های ایزی وال در محل پروژه
- ورود و تخلیه کاشی ، سرامیک و موزائیک در محل پروژه
- ورود و تخلیه ماسه و سیمان در محل پروژه
- ورود و تخلیه بخشی از ستون های بال غربی پارت آخر (سبلان سوله)





1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
جنوب (تصویر شماره دو)





1402.4.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره یک)





1402.5.30

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره دو)



