

بلوک D3

گزارش عملکرد ماهانه
شهریور ماه ۱۴۰۲

عمران
آبشار
اسیادانا




مجتمع مسکونی بزرگ چیتگر



۱۴۰۲.۰۶.۳۰


اجرای سقف

۱۴۰۲.۰۵.۳۰

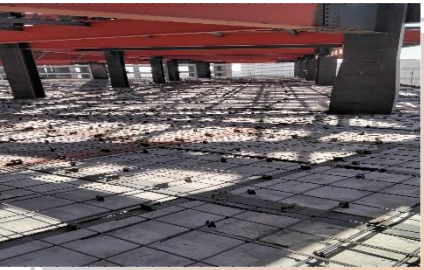

شرح اجرا




- **اتمام** قالب بندی، آرماتور بندی و بتن ریزی طبقه **+۹** بال شرقی
- دکفراژ سقف **+۹** شرقی

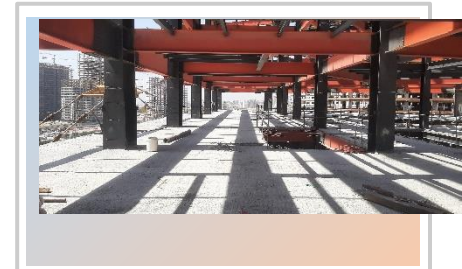

شرح اجرا

- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی سقف طبقه **+۹** بال شرقی



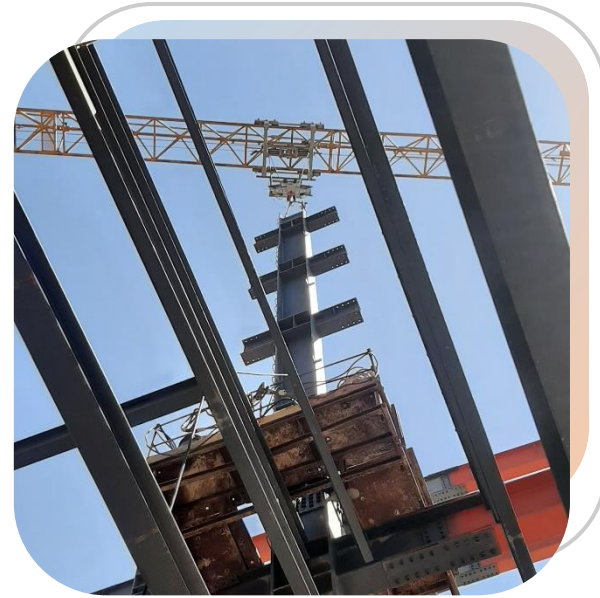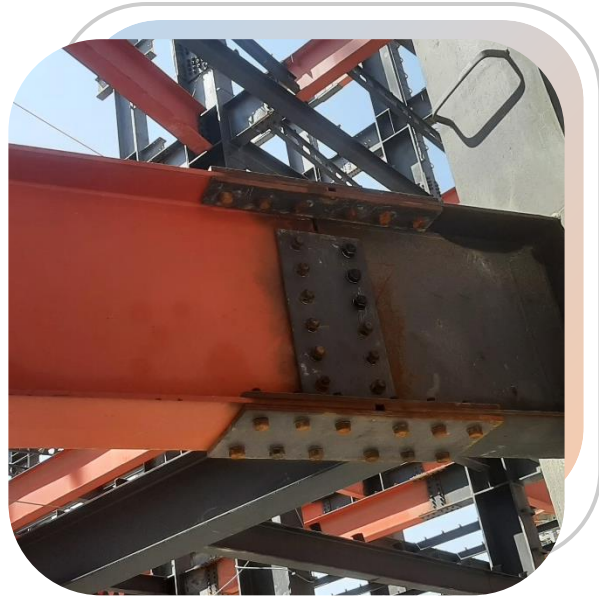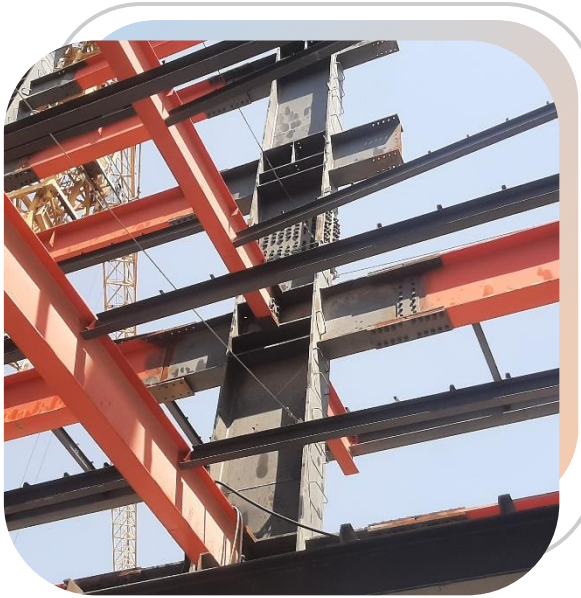

نصب تیر و ستون

- نصب ستون های پارت ۶ بال شرقی
- نصب تیر های اصلی پارت ۶ بال شرقی
- پیچ ریزی تیرهای اصلی پارت ۶ بال غربی
- تکمیل کاری اتصالات سقف طبقه ۱۰+ شرقی و غربی

شرح اجرا



۱۴۰۲.۰۶.۳۰

واحد‌های مسکونی

۱۴۰۲.۰۵.۳۰



- ادامه نصب پنل های ایزی وال داخلی واحد های مسکونی طبقه +۱ بال شرقی و غربی
- **آغاز** نصب پنل های ایزی وال داخلی واحد های مسکونی طبقه +۲ بال شرقی و غربی

شرح اجرا




- ادامه نصب و اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه +۳ بال غربی و شرقی
- **آغاز** نصب و اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه +۴ بال شرقی و غربی



- اجرای وال پست های پیرامونی طبقه +۶ و +۷ بال شرقی
- **آغاز** نصب پنل های ایزی وال داخلی واحد های مسکونی طبقه +۱ بال شرقی و غربی
- اجرای تیغه چینی دیوارهای پیرامونی طبقه +۳ بال غربی و شرقی

شرح اجرا

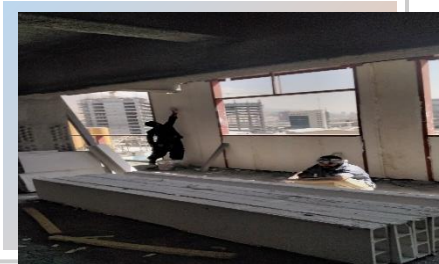



تاسیسات

- ادامه ساخت و نصب کانال های تهویه در طبقات
- اجرای کرگیری طبقات منفی


شرح اجرا 



پاشش ضد حریق

- آغاز زیر سازی سقف طبقه ۶+ بال شرقی جهت پاشش ضد حریق
- اجرای پاشش ضد حریق طبقه ۵+ شرقی

شرح اجرا

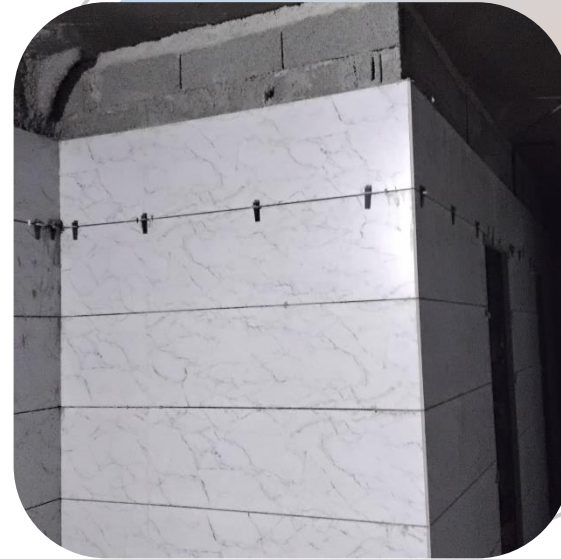

انباری ها و پارکینگ

- آغاز موزائیک کاری کف انباری های طبقه ۱-
- آغاز سرامیک کاری دیوار های بیرونی انباریهای طبقه ۴-
- اجرای رابیتس و پلاستر دیوارهای رمپ ۱- به ۲-
- اجرای سقید کاری انباریهای طبقه ۲- و ۳-
- ادامه اجرای قلوه ریزی کف طبقه ۶-


شرح اجرا



پارکینگ الحاقی

- تکمیل قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی سقف طبقه ۲- پارت ۲ پارکینگ الحاقی
- تکمیل قالب بندی ، آرماتور بندی و بتن ریزی دیوار حائل غربی و شمالی طبقه ۱- پارکینگ الحاقی
- برشکاری بازشوهای ضلع شمالی پارکینگ الحاقی
- اجرای قالب بندی و آرماتور بندی ستون های طبقه ۲- پارکینگ الحاقی
- قالب بندی دیوار حائل شمالی و ستون های طبقه ۱- پارکینگ الحاقی
- سوراخ کاری و کاشت آرماتور دوخت ستون و سقف طبقه ۱- پارکینگ الحاقی

شرح اجرا

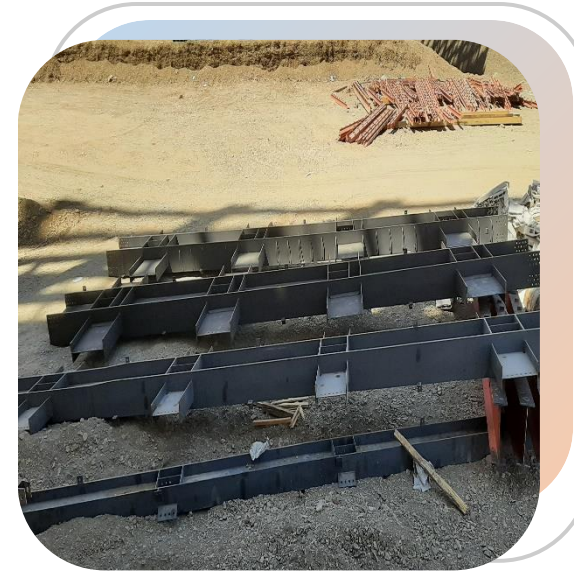

تخلیه بار

- ورود و تخلیه ستونهای پارت ۶
- ورود و تخلیه ایزی وال در محل پروژه
- ورود و تخلیه ماسه و سیمان در محل پروژه
- ورود و تخلیه موزائیک در محل پروژه

شرح اجرا

۱۴۰۲.۵.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۰۶.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع جنوب (تصویر شماره دو)



۱۴۰۲.۵.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع
شمال (تصویر شماره یک)



۱۴۰۲.۶.۳۰

تصویر نقطه ای ضلع شمال (تصویر شماره دو)



