



گزارشی ماهانه عملکرد بلوک N4

آذر ماه ۱۴۰۱

# مجمع بزرگ مسکونی چیتگر

مدیریت روابط عمومی پروژه مسکونی چیتگر

[www.omranabshar-chitgar.com](http://www.omranabshar-chitgar.com)

# تیر سقف



- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۲+(کف ۳)
- ✓ بتن ریزی پارت پایانی سقف طبقه ۲+(سطح ۳)
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ آرماتوربندی تیرهای سقف طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی و بال شرقی
- ✓ اجرای اسکافلد و نصب قالب کف تیرهای سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال غربی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال غربی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال شرقی
- ✓ بتن ریزی تیرهای سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال شرقی

## نصب پنل سقف

- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال شرقی
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۳+(کف ۴) بال غربی
- ✓ نصب پنل سقف طبقه ۴+(کف ۵) هسته مرکزی و بال شرقی



## ستون ها



- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۵ هسته مرکزی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه +۴ هسته مرکزی
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه +۴ هسته مرکزی
- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۴ بال شرقی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه +۴ بال شرقی
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه +۴ بال شرقی
- ✓ تکمیل آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه +۳ بال غربی
- ✓ بتن ریزی ستون های طبقه +۳ بال غربی
- ✓ دکفراژ ستون های طبقه +۳ بال غربی
- ✓ اجرای سیستم ارت و همبندی ستون های

## دیوار برشی

- ✓ آرماتوربندی و قالب بندی دیوار برشی و ستون های کناری آن طبقه ۴+ بال غربی
- ✓ بتن ریزی دیوار برشی و ستون های کناری آن طبقه ۴+ بال غربی



## راه پله

- ✓ اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال شرقی طبقه ۳ به ۴
- ✓ بتن ریزی راه پله بال شرقی طبقه ۳ به ۴
- ✓ قالب بندی و آرماتوربندی راه پله هسته مرکزی طبقه ۴ به ۵
- ✓ بتن ریزی راه پله هسته مرکزی طبقه ۴ به ۵
- ✓ تکمیل قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال غربی طبقه ۲ به ۳
- ✓ بتن ریزی راه پله بال غربی طبقه ۲ به ۳
- ✓ تکمیل اجرای قالب بندی و آرماتوربندی راه پله بال شرقی طبقه ۳ به ۴



## انباری

- ✓ اجرای وال پست انباری های طبقه ۱-
- ✓ اجرای دیوار چینی انباری های طبقه ۱-



## موتورخانه


- ✓ اجرای آرماتوربندی و قالب بندی دیوار ضلع غربی موتورخانه
- ✓ بتن ریزی دیوار ضلع غربی موتورخانه
- ✓ دکفراژ قالب ضلع جنوبی دیوار موتورخانه






## کارگاه رزوه

✓ تحویل آرماتور رزوه تیر طبقه ۵+ الی ۱۰+

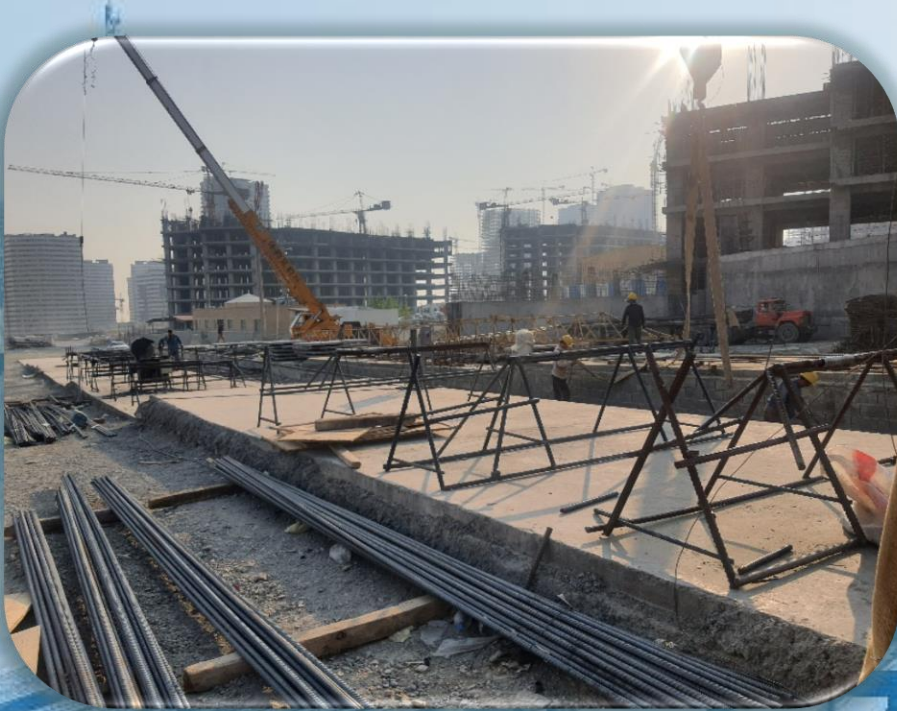


## تساویر مقایسه ای ضلع شمالی

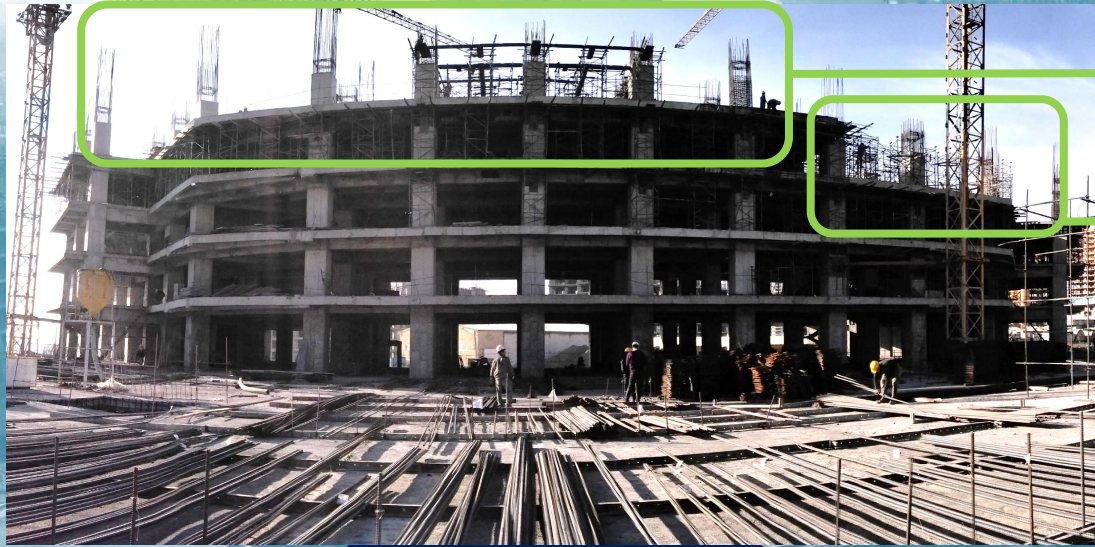

۱۴۰۱/۰۹/۰۱

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۴ هسته مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۳ بال غربی

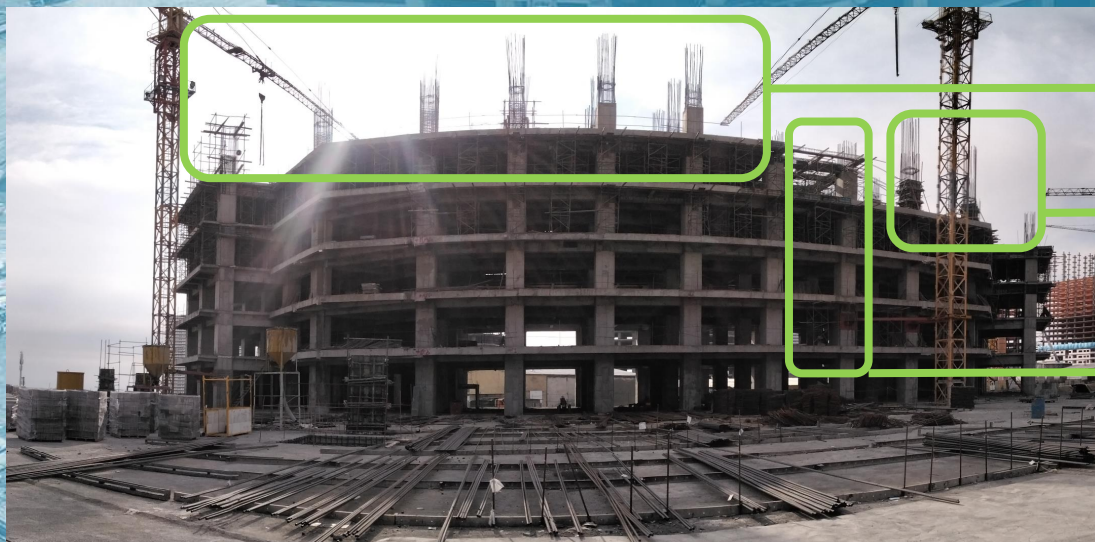

۱۴۰۱/۰۹/۳۰

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۵ هسته مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۴ بال غربی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  
طبقه +۴ (کف +۵) بال غربی

## تصاویر مقایسه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۴ هسته مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  
طبقه ۳+ (کف +۴) بال شرقی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  
طبقه ۲+ (کف +۳) بال غربی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

✓ آرماتوربندی و قالب بندی ستون های طبقه  
+۵ هسته مرکزی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  
طبقه ۴+ (کف +۵) بال شرقی

✓ آرماتوربندی و قالب بندی تیرهای سقف  
طبقه ۳+ (کف +۴) بال غربی

# تساویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۱۵

# تصاویر نقطه ای ضلع شمالی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰

# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۰۱

# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۱۵



# تصاویر نقطه ای ضلع جنوبی



۱۴۰۱/۰۹/۳۰
